

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 486																		
		Data e Hora de Emissão 14/12/2023 13:36:08																		
		Código de Verificação * BHBC-5BQM																		
		Série NE																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000 Município: MONTEIRO LOBATO UF: SP E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 14/12/2023, EM MONTEIRO LOBATO - SP Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 1ª Medição Período: 10/11/2023 a 12/12/2023 Valor: R\$45.400,76 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1																				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Valor do Serviço R\$ 45.400,76</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 45.400,76</td> <td>Alíquota (%) 5,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 2.270,04</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>								Valor do Serviço R\$ 45.400,76	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 45.400,76	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 2.270,04	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
	Valor do Serviço R\$ 45.400,76	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 45.400,76	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 2.270,04														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.400,76 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 43.130,72																				
OUTRAS INFORMAÇÕES - Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO																				

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LUIZ RODOLFO MEIRELES GOMES
CREA-SP 507119/31
SEC. MUNIC. DE OBRAS
14.12.23



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DE OBRAS



MEMORANDO 23173/2023

**A/C: Secretaria de Finanças
De: Secretaria de Obras**

Ref.: Pagamento da 1ª Medição – UPA

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio deste o pagamento referente a nota fiscal em ANEXO, no valor de R\$45.400,76, referente a TOMADA DE PREÇO N° 008/2023.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 14 de dezembro de 2023.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 507149131
SEC. MUNIC. DE OBRAS

**Luiz Rodolfo Meirelles Gomes
Secretário de Obras**



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 12/12/2023

RELATÓRIO Nº:
01/2023

CONTRATO: 097/2023

CONFERIDO:

Fiscal do contrato

AUTOR:

Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

DATA: 12/12/2023	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO	FOLHA: 2 / 4
----------------------------	--	---------------------

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães,20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato - SP

2. FOTOS



Foto 1: Correção da placa de obra.

Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	--

DATA:
12/12/2023

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 3 / 4

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

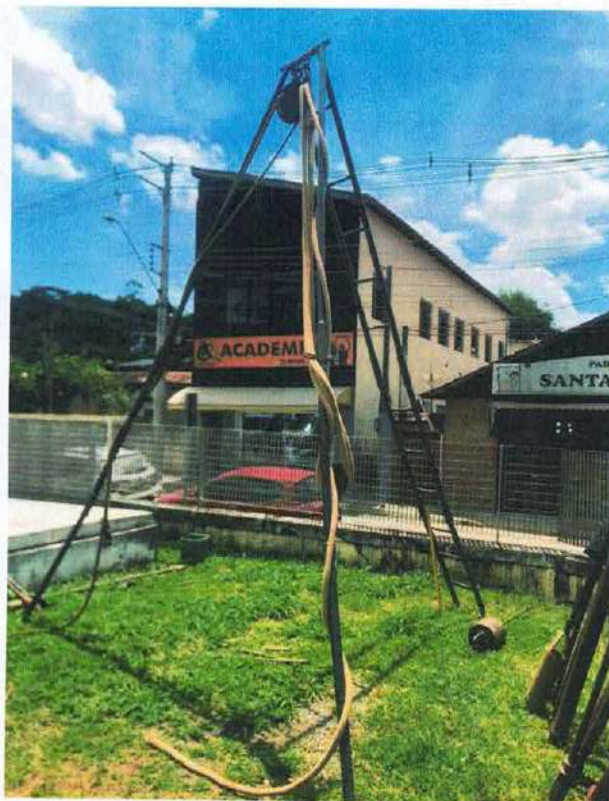


Foto 2.: Sondagem



Foto 3.: Perfuração da sondagem

Autor:

Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA: 12/12/2023	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO	FOLHA: 4 / 4
-----------------------------	---	---------------------



Foto 4.: Instalação de banheiro químico no canteiro de obra



Foto 5. :Instalação de container no canteiro de obra.

Autor: Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
---	--



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI
CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 - I.E. nº 332.225.640.110
Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO									
DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA									
BDI = 25%									
OBJETO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
ITEM									
1	01	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO							
1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAMENTOS, CONDIÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUIDA ATÉ 1.000 M²	un	1,00	5.254,15	5.254,15			
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	un	1,00	6.710,72	6.710,72			
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	un	6,00	2.643,56	15.861,36			
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	un	10,00	1.938,77	19.387,70			
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	un	12,00	832,32	9.987,84			
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	un	6,00	924,23	5.545,38			
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDADE	tx	1,00	1.177,68	1.177,68			
1.8	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	m	90,00	93,93	8.453,70			
2	02	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				72.378,53			
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	un.mês	9,00	627,19	783,98			
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	923,12	1.153,90			
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	575,88	719,85			
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	m²	80,00	77,05	96,31			
2.5	02.05.202	ANDARIM TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	m.mês	40,50	19,29	24,11			
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6,00	847,50	5.085,00			
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	m²	260,00	5,34	6,67			

1ª MEDIÇÃO - 28/11/2023					
QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	SALDO REMANESCENTE		
	-	0,00%	5.254,15		
0,50	3.355,36	50,00%	3.355,36		
3,00	7.930,68	50,00%	7.930,68		
5,00	9.693,85	50,00%	9.693,85		
6,00	4.993,92	50,00%	4.993,92		
3,00	2.772,69	50,00%	2.772,69		
1,00	1.177,68	100,00%	-		
90,00	8.453,70	100,00%	-		
	38.377,88		34.000,65		
1,00	783,98	11,11%	6.271,84		
1,00	1.153,90	11,11%	9.231,20		
-	-	0,00%	6.478,65		
-	-	0,00%	7.704,80		
-	-	0,00%	976,46		
5,00	5.085,00	100,00%	-		
	-	0,00%	1.734,20		

2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,96
						45.889,99	
3	06	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL					
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	m³	10,00	39,47	49,33	493,30
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	10,00	12,27	15,33	153,30
						646,60	
4	08	ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM					
4.1	08.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m².mês	1.566,00	5,86	7,32	11.463,12
4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m²	783,00	10,01	12,51	9.795,33
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	m²	16,20	102,53	128,16	2.076,19
4.4	08.05.180	MANTA GEOTÊXIL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 8KN/M	m²	81,00	12,93	16,16	1.308,96
4.5	08.06.040	BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	m	10,00	21,02	26,27	262,70
						24.906,30	
5	09	FORMA					
5.1	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	m²	480,74	141,41	176,76	84.975,60
						84.975,60	
6	10	ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL					
6.1	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPa	kg	13.824,00	9,34	11,67	161.326,08
6.2	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPa	kg	2.073,60	11,02	13,77	28.553,47
6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	kg	5.016,00	12,07	15,08	75.641,28
						265.520,83	
7	11	CONCRETO, MASSA E LASTRO					
7.1	11.01.260	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPa - PARA BOMBAMENTO	m³	62,70	374,13	467,66	29.322,28
7.2	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPa - PARA BOMBAMENTO	m³	138,24	388,49	485,61	67.130,73
7.3	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB.	m³	200,94	80,77	100,96	20.286,90
7.4	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	39,19	125,27	156,58	6.136,37
						122.876,28	
8	12	FUNDAÇÃO PROFUNDA					
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	tx	1,00	1.515,51	1.894,38	1.894,38
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	m	450,00	54,03	67,53	30.388,50
						32.282,88	
9	13	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS					
9.1	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	m²	355,52	152,65	190,81	67.836,77
9.2	13.01.190	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	m²	476,21	167,30	209,12	99.585,04
						167.421,81	
10	14	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR					

10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B	m²	800,50	66,27	82,83	66.305,41	-	0,00%	66.305,41
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B	m³	812,00	80,93	101,16	82.141,92	-	0,00%	82.141,92
10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	m²	21,42	485,87	607,33	13.009,00	-	0,00%	13.009,00
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,63	-	0,00%	10.034,63
11	15	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO						171.490,96		
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M	m²	355,52	103,81	129,76	46.132,27	-	0,00%	46.132,27
12	16	TELHAMENTO						46.132,27		
12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRF-S - PERFIL ONDULADO DE 8 MM	m²	480,00	48,88	58,57	26.942,20	-	0,00%	26.942,20
12.2	16.30.020	DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	m²	17,50	587,08	733,85	12.842,37	-	0,00%	12.842,37
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	m²	38,90	243,57	304,46	11.234,57	-	0,00%	11.234,57
12.4	16.33.052	GALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09	-	0,00%	15.392,09
13	17	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL						66.411,23		
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	m³	2,50	943,04	1.178,80	2.947,00	-	0,00%	2.947,00
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m³	18,40	508,35	635,43	11.691,91	-	0,00%	11.691,91
13.3	17.02.020	CHAPISCO	m²	3.225,00	4,90	6,12	19.737,00	-	0,00%	19.737,00
13.4	17.02.120	EMBOÇO COMUM	m³	3.225,00	15,52	19,40	62.565,00	-	0,00%	62.565,00
13.5	17.02.220	REBOCO	m²	2.288,62	8,76	10,95	25.060,38	-	0,00%	25.060,38
14	18	REVESTIMENTO CERÂMICO						122.001,28		
14.1	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B1LA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m²	537,86	117,77	147,21	79.178,37	-	0,00%	79.178,37
14.2	18.06.162	RODAPE EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B1LB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34	-	0,00%	1.734,34
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	m²	74,20	143,31	179,13	13.291,44	-	0,00%	13.291,44

14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADA E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	936,38	55,06	68,82	64.441,67	-	0,00%	64.441,67
15	19	REVESTIMENTO EM PEDRA				158.645,82				
15.1	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	m	146,10	118,12	147,95	21.571,66	-	0,00%	21.571,66
16	21	REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO				21.571,66				
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINILICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	m²	153,03	178,62	223,27	34.167,00	-	0,00%	34.167,00
16.2	21.10.061	RODAPÉ PARA PISO VINILICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	m	143,15	27,58	34,47	4.934,38	-	0,00%	4.934,38
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM	m	34,50	19,15	23,93	825,58	-	0,00%	825,58
17	22	FORRO, BRISE E FACHADA				39.926,96				
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	m²	718,00	68,94	86,17	61.870,06	-	0,00%	61.870,06
18	23	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA				61.870,06				
18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METALICO - 60 X 160 CM	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38	-	0,00%	9.271,38
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METALICO - 80 X 210 CM	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46	-	0,00%	10.400,46
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METALICO - 90 X 210 CM	un	17,00	1.399,77	1.749,71	29.745,07	-	0,00%	29.745,07
18.4	23.08.030	FAIXABATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90	-	0,00%	5.016,90
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	m²	0,90	133,79	167,23	150,50	-	0,00%	150,50
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	m²	3,78	390,60	488,25	1.845,58	-	0,00%	1.845,58
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METALICO - 80 X 210 CM	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00	-	0,00%	3.714,00
18.8	23.09.560	PORTA LISA COM BATENTE METALICO - 90 X 210 CM	un	6,00	773,84	967,30	5.803,80	-	0,00%	5.803,80
18.9	23.09.590	PORTA LISA COM BATENTE METALICO -160 X 210 CM	un	12,00	1.019,96	1.274,95	15.299,40	-	0,00%	15.299,40
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	un	16,90	44,29	55,36	935,58	-	0,00%	935,58
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	m	16,90	6,82	8,52	143,98	-	0,00%	143,98
19	24	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO				82.326,65				
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47	-	0,00%	26.314,47

19.2	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	m²	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95	-	0,00%	1.343,95
20 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO										
20.1	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	41,10	666,45	833,06	34.238,76	-	0,00%	34.238,76
20.2	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	m²	29,55	706,32	882,90	26.089,69	-	0,00%	26.089,69
20.3	25.01.090	CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	4,10	549,15	686,43	2.814,36	-	0,00%	2.814,36
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	19,11	870,40	1.088,00	20.791,68	-	0,00%	20.791,68
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	m²	16,80	596,96	746,20	12.536,16	-	0,00%	12.536,16
21 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO										
21.	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM	m²	1,50	420,84	526,05	789,07	-	0,00%	789,07
21.2	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	m²	3,00	529,47	661,83	1.985,49	-	0,00%	1.985,49
22 ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL										
22.1	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	m	126,00	124,82	156,02	19.658,52	-	0,00%	19.658,52
23 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS										
23.1	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG	un	4,00	246,27	307,83	1.231,32	-	0,00%	1.231,32
24 ACESSIBILIDADE										
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	m	7,00	149,33	186,66	1.306,62	-	0,00%	1.306,62
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	un	7,00	95,90	119,87	839,09	-	0,00%	839,09
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	un	14,00	125,90	157,37	2.203,18	-	0,00%	2.203,18
24.4	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91	-	0,00%	2.471,91
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	m²	11,50	150,96	188,70	2.170,05	-	0,00%	2.170,05
24.6	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	m	14,00	389,47	486,83	6.815,62	-	0,00%	6.815,62
24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	un	2,00	170,78	213,47	426,94	-	0,00%	426,94
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	un	5,00	786,33	957,91	4.789,55	-	0,00%	4.789,55
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	un	5,00	1.192,55	1.490,68	7.453,40	-	0,00%	7.453,40

24.10	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	un	5,00	848,78	1.080,97	5.304,85
25	32	IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA				33.781,21	
25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	m²	113,30	63,64	79,55	9.013,01
25.2	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,46
26	33	PINTURA				11.025,47	
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	m²	1.462,97	11,66	14,57	21.315,47
26.2	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63
26.3	33.10.060	EPOXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	279,20	80,21	100,26	27.992,09
26.4	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	m²	64,62	32,49	40,61	2.624,21
27	34	PAISAGISMO E FECHAMENTOS				106.390,40	
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	m³	4,55	149,63	187,03	850,98
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	m²	42,26	1,31	1,63	68,88
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	68,70	10,88	13,60	934,32
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32
27.5	34.03.120	ARBUSTO MOREÍRA - H= 0,50 M	un	15,00	29,53	36,91	553,65
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	un	2,00	29,95	37,43	74,86
27.7	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	un	2,00	89,11	111,38	222,76
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M	un	13,00	41,88	52,35	680,55
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60
28	37	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA				31.353,92	
28.1	37.01.160	QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	un	1,00	500,24	625,30	625,30
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.055,68
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	un	8,00	129,47	161,83	1.294,64
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	24,00	129,52	161,90	3.885,60
28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	un	8,00	148,28	185,35	1.112,10

28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSIVEL ATÉ NH-2, 400 A - SEM FUSÍVEIS	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	un	20,00	181,87	227,08	4.541,60
28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20
29	38	TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA					
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40
30	38	CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA					
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	660,00	5,05	6,31	4.164,60
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	m	10,00	28,39	35,48	354,80
30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FL-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	120,00	29,68	37,10	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40
31	40	DISTRIBUICAO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA					
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARA F., 400X400X150 MM	un	6,00	135,72	169,65	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	cj	6,00	22,60	28,25	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	cj	90,00	18,30	22,87	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	cj	20,00	21,59	26,98	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	cj	6,00	28,12	35,15	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	cj	4,00	25,45	31,81	127,24
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	un	2,00	646,33	807,91	1.615,82
32	41	ILUMINACAO					
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69

32.2	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	un	8,00	1.092,71	1.365,88	10.927,04
32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	un	68,00	128,42	160,52	10.915,36
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL.O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	un	60,00	214,05	267,56	16.053,60
33	43	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GAS.				52.126,72	
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	un	5,00	362,50	453,12	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	un	2,00	182,07	227,58	455,16
33.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190MPH	un	1,00	359,17	448,96	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIJO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	cj	3,00	6.159,05	7.688,81	23.096,43
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIJO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	cj	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIJO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	cj	12,00	2.718,73	3.398,41	40.780,92
34	44	APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS				80.125,17	
34.1	44.01.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	un	6,00	99,71	124,63	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	un	3,00	606,20	757,75	2.273,25
34.5	44.02.062	TAMPOBANCADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m²	13,92	590,74	738,42	10.278,80
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	un	10,00	89,91	87,38	873,80
34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	un	16,00	56,21	70,26	1.124,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	un	4,00	34,59	43,23	172,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	6,00	159,82	199,77	1.198,62
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2 OU 3/4"	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21

34.11	44.06.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	un	6,00	201,68	252,10	1.512,60
35	46	TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.					23.594,07
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	180,00	22,26	27,82	5.007,80
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50
35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	12,00	26,52	33,15	397,80
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20
35.6	46.08.006	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,00	88,85	111,06	666,36
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	m	36,00	99,27	124,08	4.466,88
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	56,56	70,70	8.484,00
36	47	VALVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES					37.030,14
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	un	4,00	106,87	133,58	534,32
36.2	47.01.210	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	un	4,00	190,80	238,50	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	un	6,00	76,81	95,76	574,56
37	48	RESERVATÓRIO E TANQUE PARA LÍQUIDOS E GASES					3.685,44
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	un	3,00	95,12	118,90	356,70
38	49	CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO					9.706,26
38.1	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	un	26,00	82,53	103,16	2.682,16
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	un	20,00	229,17	286,46	5.729,20
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	un	2,00	354,29	442,86	885,72

38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	un	10,00	12,94	16,17	161,70
						9.458,78	
39	54	PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO					
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	m³	76,65	174,79	218,48	16.746,49
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m²	511,00	19,35	24,18	12.355,98
39.4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPa, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJ.E EM AREIA	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07
						84.402,89	
		TOTAL				2.326.081,38	
							TOTAL GERAL 1ª MEDIÇÃO
							45.400,76
						% MEDIDO	1,95%
						ACUMULADO	45.400,76
						SALDO REMANESCENTE	2.280.680,62

Monteiro Lobato, 12 de dezembro de 2023

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATOPÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4442 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 327

DATA: 14/12/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA

230852/23

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 18/12/2023

NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

14.563.488/0001-70

CÓDIGO: 10786

ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

GUARATINGUETA

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido 43.130,72 Desconto 2.270,04
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
00	Recursos Ordinários		
800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND		
000	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL IND-Convên		
GL		SOMA	45.400,76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
283.577,96	45.400,76	45.400,76	238.177,20

VALOR A SER PAGO R\$


45.400,76

quarenta e cinco mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos *****

DESCONTOS

8	1114.51.1.1.00.00 ISSQN-PRINCIPAL	2.270,04	
TOTAL DE DESCONTOS			2.270,04

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/12/2023



A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora

DATA

Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 06791

DATA: 19/12/2023 VENCI 18/12/2023 PAGTO: 19/12/2023

Credor...: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST. CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 1078

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade...: GUARATINGUETA

CEP:

Discriminação...:

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor 45.400,76

(quarenta e cinco mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 45.400,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4442	/ 1	GL 010401	10.301.0012.1009.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 45.400,76	RR\$ 0,00	RR\$ 2.270,04	RR\$ 43.130,72
TOTAL					RR\$ 45.400,76	RR\$ 0,00	RR\$ 2.270,04	RR\$ 43.130,72

Despesa Líquida: RR\$ 43.130,72

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40681		RR\$ 43.130,72
TOTAL. . .			RR\$ 43.130,72

Despesa paga em 19/12/2023 Com os recursos acima discriminados

AMAURY DONIZETE DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

//_ Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.22
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA

CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT

CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70

VALOR: R\$ 43.130,72

DEBITO EM: 19/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: 5.EDC.0F5.BDA.185.101

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 EDMAR JOSÉ DE ARAUJO.
