

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 598				
		Data e Hora de Emissão 30/04/2025 11:25:50				
		Código de Verificação * TJ3P-L1CJ				
		Série NE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000 Município: MONTEIRO LOBATO UF: SP E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/04/2025, EM MONTEIRO LOBATO - SP						
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 15ª Medição Período: 08/03/2025 a 10/04/2025 Valor: R\$ 33.277,76 Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022. 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1						
Valor do Serviço R\$ 33.277,76		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 33.277,76	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 1.663,89
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.277,76						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 31.613,87						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.


RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Engenheiro Civil - CREA: 5070225090
Secretário de Obras



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE OBRAS

MEMORANDO SEC.OBRAS 25076/2025

A/C: Secretaria de Finanças

De: Secretaria de Obras

Ref.: 15º Medição - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.


Prezada;

A Secretaria Obras do município de Monteiro Lobato -SP, vem através deste, solicitar o pagamento da 15º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido Processo Nº 230852/2023, Tomada de Preço Nº008/2023. No valor de **R\$90.102,32** referente a Nota Fiscal **nº597-E** e no valor de **R\$33.277,76** referente a Nota Fiscal **nº598-E**. Com o valor total da 15º Medição de **R\$123.380,08**.


Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 5 de maio de 2025.



RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Eng. Civil - CREA SP 5070225050
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
						S/ BDI	C/ BDI	
1	01	SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO						
1.1	01.02.071	PARECER TECNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	100%	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	100%	un	1,00	5.308,58	6.710,72	6.710,72
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	100%	un	6,00	2.114,85	2.043,50	15.861,36
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	100%	un	10,00	1.551,02	1.938,77	19.387,70
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	100%	un	12,00	695,86	832,32	9.867,84
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	100%	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM	100%	tx	1,00	942,15	1.177,88	1.177,88
1.8	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	100%	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70

2	02	INÍCIO, APROX E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB.	100%	un mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82	
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 FONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,90 m²	100%	um mês	9,00	923,12	1.153,00	10.385,10	
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 m²	78%	un mês	9,00	575,89	719,85	6.478,65	
2.4	02.03.120	TAPUMEIRO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	100%	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80	
2.5	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	100%	m.mês	40,50	19,29	24,11	978,48	
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	100%	m²	8,00	678,00	847,50	5.095,00	
2.7	02.09.030		100%	m³	280,00	5,34	6,67	1.754,20	
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	100%	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,98	

3	06	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL					
3.1	06.02.020	EGRAV. MANUAL EM SOLO DE 1"2" CA. CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	100%	m³	39,47	493,30	493,30
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	100%	m³	12,27	153,30	153,30
						846,60	
4	08	ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM					
4.1	08.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m³ mds	5,86	11.463,12	11.463,12
4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m³	10,01	9.795,33	9.795,33
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	100%	m³	120,53	2.076,19	2.076,19

15ª MEDIÇÃO - 10/04/2025				
QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	ACUMULADO MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
	-	0,00%	5.254,15	-
	-	0,00%	6.710,72	-
	-	0,00%	15.861,36	-
	-	0,00%	19.387,70	-
	-	0,00%	9.987,84	-
	-	0,00%	5.545,38	-
	-	0,00%	1.177,68	-
	-	0,00%	8.453,70	-
	-		R\$	-
	-	0,00%	7.055,82	0,00
	-	0,00%	10.385,10	-
1,00	719,85	11,11%	5.038,95	1.439,70
	-	0,00%	7.704,80	-
	-	0,00%	976,46	-
	-	0,00%	5.085,00	-
	-	0,00%		-
	-	0,00%	1.734,20	-
	-	0,00%	6.449,96	-
	719,85		R\$	1.439,70
	-	0,00%	493,30	0,00
	-	0,00%	153,30	-
			R\$	0,00
	-	0,00%	11.463,12	0,00
	-	0,00%	9.795,33	-
	-	0,00%	2.076,19	0,00

2

4.4	08.05.180	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KNI/M E TRANSVERSAL DE 50KNI/M	100%	m²	81,00	12,93	16,16	1.308,96	-	0,00%	1.308,96	-
4.5	08.06.040	BARBAÇA EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	100%	m	10,00	21,02	26,27	262,70	-	0,00%	262,70	-
								24.906,30	-R\$	0,00		
FORMA												
5	06	FORMA PLANA EM COMPENSAÇÃO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	100%	m²	480,74	141,41	176,76	84.975,60	-	0,00%	84.975,60	0,00
								84.975,60	-R\$	0,00		
ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL												
6	10	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPa	100%	kg	13.824,00	9,34	11,67	161.328,08	-	0,00%	161.328,08	-
6.1	10.01.040		100%	kg	2.073,60	11,02	13,77	28.553,47	-	0,00%	28.553,47	-
6.2	10.01.060		100%	kg	5.016,00	12,07	15,08	75.641,28	-	0,00%	75.641,28	-
								265.526,83	-R\$			
CONCRETO, MASSA E LASTRO												
7	11	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPa - PARA BOMBAMENTO	100%	m³	62,70	374,13	487,66	29.322,28	-	0,00%	29.322,28	-
7.1	11.01.280		100%	m³	138,24	388,49	485,61	67.130,73	-	0,00%	67.130,73	-
7.2	11.01.290		100%	m³	200,84	80,77	100,96	20.286,90	-	0,00%	20.286,90	-
7.3	11.16.080		100%	m³	39,19	125,27	156,59	6.136,37	-	0,00%	6.136,37	-
								122.876,28	-R\$			
FUNDACÃO PROFUNDA												
8	12	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	100%	tx	1,00	1.515,51	1.894,38	1.894,38	-	0,00%	1.894,38	-
8.1	12.05.010		100%	m	450,00	54,03	67,53	30.388,50	-	0,00%	30.388,50	-
								32.282,88	-R\$			
LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS												
9	13	LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (18+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	100%	m²	355,52	152,65	190,81	67.836,77	-	0,00%	67.836,77	-
9.1	13.01.170		100%	m²	476,21	167,30	208,12	99.585,04	-	0,00%	99.585,04	-
								167.421,81	-R\$			
ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR												
10	14	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B	100%	m³	800,50	66,27	82,63	66.305,42	-	0,00%	66.305,42	-
10.1	14.11.221		100%	m³	812,00	90,93	101,16	82.141,92	-	0,00%	82.141,92	-
10.2	14.11.231		100%	m³	21,42	485,87	607,33	13.009,00	-	0,00%	6.504,50	6.504,50
10.3	14.30.070		50%	m³	87,70	91,54	114,42	10.034,63	-	0,00%	5.017,31	5.017,31
								171.490,95	-R\$	11.521,81		
10.4	14.30.310		50%	m³					-	0,00%		
ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO												
11	15	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOUREADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M	100%	m²	355,52	103,81	129,76	46.132,27	-	0,00%	46.132,27	-
								46.132,27	-R\$			
TELHAMENTO												
12	16	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	100%	m²	460,00	46,86	59,57	26.942,20	-	100,00%	26.942,20	-
12.1	16.03.010		0%	m²	17,50	587,08	733,85	12.842,37	-	0,00%	-	12.842,37
12.2	16.30.020		0%	m²	36,90	243,57	304,46	11.234,57	-	0,00%	-	11.234,57
12.3	16.32.120		100%	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09	-	100,00%	15.392,10	-
								0,01	-			

13	17	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL					66.411,23			42.334,30		R\$	24.076,93
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	0%	m²	2,50	943,04	1.178,80	2.947,00					
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	100%	m²	18,40	508,35	635,43	11.891,91		2,76	1.753,79	15,00%	11.691,91
13.3	17.02.020	CHAPISCO	100%	m²	3.225,00	4,90	0,12	19.737,00		161,75	986,85	5,00%	19.700,95
13.4	17.02.120	EMBOCO COMUM	100%	m²	3.225,00	15,52	10,40	82.695,00				0,00%	62.565,00
13.5	17.02.220	REBOCO	100%	m²	2.288,62	8,76	10,95	25.080,38		228,86	2.506,04	10,00%	25.135,33
							122.001,29				5.246,68		R\$ 2.908,10
14	18	REVESTIMENTO CERAMICO											
14.1	18.08.142	PLACA CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PARA AREA INTERNA COM SAIDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B.L.B., RESISTENCIA QUIMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	90%	m²	537,86	117,77	147,21	79.178,37		107,57	15.835,67	20,00%	71.260,24
14.2	18.08.182	RODAPÊ EM PLACA CERAMICA ESMALTADA ROSTICA PARA AREA INTERNA COM SAIDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B.L.B., RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	70%	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34		60,01	346,87	20,00%	1.214,04
14.3	18.07.020	PLACA CERAMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA, ESPESURA DE 8MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	90%	m²	74,20	143,31	170,13	13.291,44		14,84	2.658,29	20,00%	11.962,30
14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	90%	m²	936,38	55,08	68,82	64.441,87		187,28	12.888,33	20,00%	58.038,38
							158.645,82				31.779,17		R\$ 16.170,85
15	19	REVESTIMENTO EM PEDRA											
15.1	19.01.092	PEITORIL 50X SOLEIRA EM GRANITO, ESPESURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	90%	m	146,10	118,12	147,85	21.571,68		8,77	1.294,30	6,00%	19.452,63
							21.571,68				1.294,30		R\$ 2.109,03
16	21	REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO											
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINILICO, ESPESURA DE 3,2 MM, PARA TRAFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	30%	m²	153,03	178,62	223,27	34.167,00				0,00%	10.250,10
16.2	21.10.081	RODAPÊ PARA PISO VINILICO EM PVC, ESPESURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	30%	m	143,15	27,58	34,47	4.924,38				0,00%	1.480,31
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORCENTE, ALTO TRAFEGO, LARGURA DE 5CM	0%	m	34,50	19,15	23,93	825,58				0,00%	875,58
							39.946,96						R\$ 28.196,54
17	22	FORRO, BRISA E FACHADA											
17.1	22.02.030	FORRO EM PANEIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESURA DE 12,5MM, FIXO	10%	m²	718,00	68,94	88,17	61.870,08				0,00%	6.204,24
							61.870,08						R\$ 55.665,82
18	23	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA											
18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METALICO - 60 X 160 CM	83%	un	6,00	1.238,19	1.545,23	9.271,38		1,00	1.545,23	16,67%	7.726,15
18.2	23.04.800	PORTA EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METALICO - 80 X 210 CM	83%	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46		1,00	1.733,41	16,67%	8.667,05
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METALICO - 80 X 210 CM	71%	un	17,00	1.399,77	1.748,71	28.745,07		2,00	3.499,42	11,76%	20.996,52
18.4	23.08.030	FAXA BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO	70%	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90		3,00	501,69	10,00%	3.511,83
18.5	23.08.040	ARMÁRIO GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	60%	m²	0,90	133,79	167,23	150,50				0,00%	90,30
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRIER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	60%	m²	3,78	390,60	488,25	1.845,58				0,00%	1.107,35
18.7	23.08.550	PORTA LISA COM BATENTE METALICO - 80 X 210 CM	75%	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00				0,00%	2.785,50

2

18.8	23.08.580	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	83%	un	0,00	773,84	987,30	5.803,80
18.9	23.08.590	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 160 X 210 CM	75%	un	12,00	1.019,96	1.274,95	15.299,40
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	71%	un	16,90	44,29	55,36	935,58
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	72%	m	16,90	6,82	8,52	143,58
							82.326,85	
19	24	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO						
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	100%	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47
19.2	24.03.100	ALÇAPACOTAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	0%	m²	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95
							27.558,42	
20	25	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO						
20.1	25.01.050	CAXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	28%	m²	41,10	686,45	833,06	34.238,76
20.2	25.01.060	CAXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	78%	m²	29,55	706,32	882,90	26.089,69
20.3	25.01.080	CAXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	75%	m²	4,10	549,15	686,43	2.814,36
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	80%	m²	19,11	870,40	1.086,00	20.791,68
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBERI BRANCO, SOB MEDIDA	80%	m²	16,80	590,98	746,20	12.536,16
							98.470,85	
21	26	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO						
21.1	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 6 MM	0%	m²	1,50	420,64	526,05	789,07
21.2	26.04.030	ESPILHO COM 3 MM COM MOLDEIRA EM ALUMÍNIO	0%	m²	3,00	529,47	661,83	1.985,49
							2.774,56	
22	27	ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL						
22.1	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	0%	m	126,00	124,82	156,02	19.658,52
							19.658,52	
23	28	FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS						
23.1	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG	0%	un	4,00	246,27	307,83	1.231,32
							1.231,32	
24	30	ACESSIBILIDADE						
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	86%	m	7,00	149,33	186,66	1.306,62
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	86%	un	7,00	95,90	119,87	839,09
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	79%	un	14,00	125,80	157,37	2.203,18
24.4	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	86%	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA, COLORIDO DE 6 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	67%	m²	11,50	150,66	188,70	2.170,05
24.6	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	84%	m	14,00	389,47	486,83	6.815,62
24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	0%	un	2,00	170,78	213,47	426,94
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI DE 700 X 460 MM	80%	un	5,00	766,33	957,91	4.769,55
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	80%	un	5,00	1.192,55	1.490,88	7.453,40
24.10	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	80%	un	5,00	846,78	1.060,97	5.304,85
							33.781,21	
25	32	IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA						

27

25.1	32.15.040	100%	m²	113,30	83,64	79,55	9.013,01
25.2	32.16.010	100%	m²	116,60	13,79	17,23	2.012,48
							11.025,47
26	33	PINTURA					
26.1	33.02.080	0%	m²	1.462,97	11,66	14,57	21.315,47
26.2	33.10.030	0%	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63
26.3	33.10.060	0%	m²	279,20	80,21	100,26	27.992,09
26.4	33.12.011	0%	m²	84,62	32,46	40,61	2.824,21
							106.390,40
27	34	PANSARISMO E FECHAMENTOS					
27.1	34.01.010	0%	m²	4,55	149,63	187,03	850,98
27.2	34.01.020	0%	m²	42,26	1,31	1,83	68,88
27.3	34.02.100	0%	m²	88,70	10,88	13,60	934,32
27.4	34.03.020	0%	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32
27.5	34.03.120	0%	un	15,00	29,53	36,91	553,65
27.6	34.03.130	0%	un	2,00	29,95	37,43	74,86
27.7	34.04.130	0%	un	2,00	89,11	111,36	222,76
27.8	34.03.150	0%	un	13,00	41,88	52,35	680,55
27.9	34.05.200	0%	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60
							31.353,92
28	37	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA					
28.1	37.01.160	100%	un	1,00	500,24	625,30	625,30
28.2	37.03.240	100%	un	4,00	1.011,14	1.263,82	5.055,68
28.3	37.10.010	100%	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50
28.4	37.13.630	100%	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92
28.5	37.13.640	100%	un	8,00	128,47	161,63	1.294,64
28.6	37.13.650	100%	un	24,00	128,52	161,90	3.885,60
28.7	37.13.680	100%	un	6,00	148,26	185,35	1.112,10
28.8	37.14.440	100%	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84
28.9	37.17.070	100%	un	20,00	191,67	227,08	4.541,60
28.10	37.24.042	100%	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20
							32.083,38
29	38	TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA					
29.1	38.19.210	100%	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60
29.2	38.19.220	100%	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40
							18.566,00
30	39	CONDUTOR E ENFIAMAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA					
30.1	39.02.016	72%	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00
30.2	39.02.020	65%	m	660,00	5,05	6,31	4.164,60
30.3	39.02.030	63%	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00
30.4	39.02.040	65%	m	200,00	11,16	13,95	2.780,00
30.5	39.04.070	0%	m	10,00	28,39	35,48	354,80

30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	0%	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00
30.7	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 18 MM², ISOL. 0,8/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	76%	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,8/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	72%	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,8/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	60%	m	120,00	29,08	37,10	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,8/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	60%	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40
								50.884,50
31	40	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA						
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARA 40X40X150 MM	67%	un	8,00	135,72	169,85	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	67%	cj	8,00	22,60	28,25	189,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	50%	cj	90,00	18,30	22,87	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	50%	cj	20,00	21,59	26,98	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	33%	cj	8,00	28,12	35,15	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	51%	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	50%	cj	4,00	25,45	31,91	127,24
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 AMO A - 2NA-2NF	50%	un	2,00	640,33	807,91	1.615,82
								6.837,84
32	41	LUMINACAO						
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	0%	un	3,00	405,79	507,23	1.521,89
32.2	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 9,00 M	0%	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	0%	un	8,00	1.092,71	1.385,88	10.927,04
32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 2680 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	0%	un	23,00	273,68	342,35	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	0%	un	88,00	128,42	160,52	10.915,36
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	0%	un	60,00	214,05	267,56	16.053,60
								62.126,72
33	43	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS.						
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W/ 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	0%	un	5,00	392,50	453,12	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	0%	un	2,00	182,07	227,56	455,16
33.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 160M³/H	0%	un	1,00	359,17	448,96	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETTE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUH	100%	cj	3,00	6.159,05	7.698,81	23.096,43
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETTE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTUH	100%	cj	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUH	100%	cj	12,00	2.718,73	3.398,41	40.760,92
								80.126,17
34	44	APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS						
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 8 LITROS	40%	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUNA	25%	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08
34.3	44.01.210	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	33%	un	6,00	99,71	124,63	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	33%	un	3,00	606,20	757,75	2.273,25
34.5	44.02.062	TAMPONADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	50%	m²	13,82	590,74	738,42	10.278,00
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300/7500 M, COM VISOR	0%	un	10,00	89,91	87,36	873,80

34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS. PARA FOLHAS	0%	un	16,00	56,21	70,26	1.124,16	-	0,00%	-	1.124,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	0%	un	4,00	34,59	43,23	172,92	-	0,00%	-	172,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	100%	un	6,00	159,82	199,77	1.198,62	1.198,62	100,00%	1.198,62	-
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, AÇÃOAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2 OU 3/4"	69%	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21	1.297,53	69,23%	1.297,53	576,68
34.11	44.06.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	50%	un	8,00	201,68	282,10	1.512,80	756,30	50,00%	756,30	756,50
									10.489,42			R\$ 13.104,65
35	48	TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.										
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLÁVEL MARRON, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	180,00	22,26	27,82	5.007,80	4.006,08	0,00%	4.006,08	1.001,52
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLÁVEL MARRON, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50	6.018,00	0,00%	6.018,00	1.504,50
35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	12,00	26,52	33,15	397,80	318,24	0,00%	318,24	79,56
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80	2.041,44	0,00%	2.041,44	510,36
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20	6.346,56	0,00%	6.346,56	1.586,64
35.6	46.08.000	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	8,00	88,85	111,08	668,36	533,09	0,00%	533,09	133,27
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	36,00	99,27	124,08	4.466,88	3.573,50	0,00%	3.573,50	893,38
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	120,00	58,56	70,70	8.484,00	6.787,20	0,00%	6.787,20	1.696,80
												R\$ 7.406,03
36	47	VALVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES.										
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	0%	un	4,00	106,87	133,58	534,32	-	0,00%	-	534,32
36.2	47.01.210	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM ALAVANCA, PASSAGEM PLENA, AÇÃOAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	0%	un	4,00	190,80	238,50	964,00	-	0,00%	-	964,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	38%	un	16,00	80,13	100,16	1.802,56	600,96	0,00%	600,96	1.001,60
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	0%	un	8,00	76,81	95,76	574,86	-	0,00%	-	574,86
												R\$ 3.064,48
37	48	RESERVATÓRIO E TANQUE PARA LÍQUIDOS E GASES										
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	33%	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56	3.116,52	0,00%	3.116,52	6.233,04
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	0%	un	3,00	95,12	118,90	396,70	-	0,00%	-	396,70
												R\$ 6.589,74
38	49	CAIXA, BALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO										
38.1	49.01.030	CAIXA SFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	65%	un	28,00	82,53	103,19	2.682,16	1.753,72	0,00%	1.753,72	928,44
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 800 X 600 X 600 MM	90%	un	20,00	229,17	286,48	5.729,20	5.156,28	0,00%	5.156,28	572,92
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	0%	un	2,00	354,29	442,88	885,72	-	0,00%	-	885,72
38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	0%	un	10,00	12,94	16,17	161,70	-	0,00%	-	161,70
												R\$ 2.548,78
39	54	PAVIMENTAÇÃO E PASSOIO										
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	22%	m²	511,00	3,08	3,85	1.987,35	438,63	0,00%	438,63	1.528,72
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	7%	m²	78,85	174,79	218,48	16.746,49	1.244,57	0,00%	1.244,57	15.501,92
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	0%	m²	511,00	19,35	24,18	12.355,98	-	0,00%	-	12.355,98

39.4	54 04 350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPa, ESPESURA 8 CM, TIPOS RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM RELE EM ÁREA	0%	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07
TOTAL								84.402,89
2.326.081,38								

				0,00%		53.333,07
						R\$ 82.719,69

TOTAL GERAL 15ª MEDIÇÃO						123.380,08
-------------------------	--	--	--	--	--	------------

% MEDIDO						5,30%
----------	--	--	--	--	--	-------

ACUMULADO						1.764.375,29
-----------	--	--	--	--	--	--------------

SALDO REMANESCENTE						R\$ 561.706,08
--------------------	--	--	--	--	--	----------------

Monteiro Lobato, 10 de abril de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIS GUSTAVO DE BARROS
Data: 30/04/2025 13:09:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Luís Gustavo de Barros
Responsável Técnico
CREA 50626954/30

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Engenheiro Civil - Crea: 907023460
Secretário de Obras



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/11/2023

DATA: 31/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REATERRO DO CORREDOR EXTERNO
2	ALVENARIA DA CAIXA DE ESGOTO DO PRÉDIO EXISTENTE
3	MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DO PRÉDIO EXISTENTE
4	EMBOÇO COM ARGAMASSA BARITADA NO RAIO X
5	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV
6	EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA
7	FCHAMENTO DE ALVENARIA
8	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA NA PLATIBANDA DO TELHADO
9	ASSENTAMENTO DE BLOCO NO FECHAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA
10	REQUADRO EXTERNO NAS JANELAS DO 1º PAV
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32	
ENCARRREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL		TOTAL	53	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
ENDEREÇO:	10/11/2023		
INÍCIO:	TERMINO		
DATA:	03/03/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
	TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	FECHAMENTO DE VÃO DE PORTA COM ALVENARIA NO 1º PAV 3,36M²
2	CHAPISCO NO 2º PAV 87,58M²
3	DEMOLIÇÃO PARA ABERTURA DE PORTA NO 1º PAV
4	ALVENARIA DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL
5	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL
6	MONTAGEM DE HIDRÁULICA ÁGUA FRIA E ESGOTO INTERNO NO 1º PAV
7	REQUADRO NO VÃO DE PORTA NO 1º PAV
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO		ANDAIME	32	
ENCARRREGADO		ROMPEDOR	0	
PEDREIRO		BETONEIRA	1	
AJUDANTE		COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO		SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL		TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
ENDEREÇO:	10/11/2023		
INÍCIO:	28/03/2025		
DATA:	10/08/2024		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
	TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo

Observações:	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REATERRO DO CORREDOR EXTERNO
2	MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DA CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL
3	MONTAGEM DAS FORMAS E CONCRETAGEM DAS TAMPA DAS CAIXAS DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
4	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV
5	EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA
6	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA NA PLATIBANDA DO TELHADO
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL	EQUIPAMENTOS	OBSERVAÇÕES:
---------	--------------	--------------

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32
ENCARRREGADO	1	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	5	BETONEIRA	1
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1
		PISO ANDAIME	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADEIRA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0
TOTAL	12	TOTAL	53



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

ENDEREÇO: 10/11/2023

INÍCIO: 25/03/2025

DATA: 10/08/2024

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ ☒ Sem chuva ☐ Com chuva

TARDE ☒ Sem chuva ☐ Com chuva

Improdutivo ☐

Improdutivo ☐

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1 ESCAVAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA RAMPA DO CORREDOR EXTERNO

2 PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

3 REGULARIZAÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL

4 EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV

5 CONTRAPISO NA ÁREA DA CAIXA D'ÁGUA

6 EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA

7 MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV

8 EMBOÇO NO 2º PAV

9 REQUADRO EXTERNO DAS JANELAS DO 1º PAV

10 EMBOÇO NA ÁREA DOS DEPOSITO DE RESÍDUOS BIOLÓGICO E QUÍMICOS

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PESSOAL

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES:

FUNÇÃO

QUANT.

MODELO

QUANT.

ANDAIMES

ROMPEDOR

BETONEIRA

COMPACTADOR

SERRA CIRCULAR

PISO ANDAIME

SERRA MÁRMORE

ESMERILHADEIRA

FURADEIRA

FURADEIRA DE IMPACTO

TOTAL

15

TOTAL

53

ENGENHEIRO FISCAL

CREA - 5062695430

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
ENDEREÇO:			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	24/03/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
	TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ESCAVAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA
2	IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA
3	COLOCAÇÃO DE LONA E REATERRO
4	PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
5	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV
6	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR
7	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA
8	REGULARIZAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DA ESCADA E PLATAFORMA ELEVATÓRIA
9	CONCRETAGEM NA ÁREA DA ESCADA E PLATAFORMA ELEVATÓRIA
10	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV
11	EMBOÇO NO 2º PAV
12	REQUADRO EXTERNO DAS JANELAS DO 1º PAV
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32	
ENCARRREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	13	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTIPIO LOBATO

OBRA:

ENDEREÇO:

INÍCIO:

DATA:

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo

10/11/2023	TERMINO	20/03/2025
10/08/2024		

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR
3	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA
4	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA / ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ/MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)
5	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE HIDRÁULICA DO 2º PAV
6	EMBOÇO NO 2º PAV
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES:

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1
		PISO ANDAIME	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADEIRA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0
TOTAL	11	TOTAL	53

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

ENDEREÇO:

INÍCIO:

DATA:

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS


MANHÃ ☒ Sem chuva ☐ Com chuva ☐ Improdutivo
TARDE ☒ Sem chuva ☐ Com chuva ☐ Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR
3	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA
4	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA / ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ/MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)
5	EMBOÇO NO 2º PAV
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32	
ENCARRREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	11	TOTAL	53	



10/08/2024	TERMINO	10/08/2024
------------	---------	------------

18/03/2025	6702/11/01
------------	------------

	☐ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
--	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

CAS	TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo

REGISTRO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

REPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO

SESTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA

SENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA

MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRAULICA DO 2º PAV

MB000 NO 28 PAV

RESERVAÇÕES:

[illegible]

11/11/11

QUANT.	MODELO	QUANT.
--------	--------	--------

QUANT.	MODELO	QUANT.
--------	--------	--------

0	ANDAIMÉ	32
---	---------	----

1	ROMPEDOR	0
---	----------	---

0	COMPACTADOR	
1	DETONANTE	

1	SERRA CIRCULAR	1
---	----------------	---

1	150 MINIMUM	
1	SEDA MAYMORE	

ESMERILHADEIRA	1
----------------	---

[illegible]

CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL
--------------	--------------

53	1101	53
----	------	----

13	TOTAL	59
----	-------	----

13	TOTAL	59
----	-------	----

13	TOTAL	59
----	-------	----

Estavô de Barros - Eng. Civil

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

OBRA:

ENDEREÇO:

INÍCIO:

DATA:

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ	☐ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
TARDE	☐ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR
3	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA
4	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/ INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ/ MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)
5	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO 2º PAV
6	CONTRAPISO NO 1ºPAV
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL	EQUIPAMENTOS	OBSERVAÇÕES:
---------	--------------	--------------

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32
ENCARRREGADO	1	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1
		PISO ANDAIME	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADEIRA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0
TOTAL	13	TOTAL	53



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTTEIRO LOBATO	
ENDEREÇO:			
INÍCIO:		10/11/2023	TERMINO
DATA:		15/03/2025	

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		Observações:	
MANHÃ	☒ Sem chuva ☐ Com chuva	TARDE	☒ Sem chuva ☐ Com chuva
	☐ Improdutivo		☐ Improdutivo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	CONTRAPISO NO 1º PAV
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32		
ENCARRREGADO	1	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	4	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0		
		SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	8	TOTAL	53		

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		INÍCIO:		10/11/2023		TERMINO		10/08/2024		DATA:	
MANHÃ TARDE ☒ Sem chuva ☐ Com chuva ☐ Improdutivo		CONDICÕES CLIMÁTICAS Observações:		14/03/2025											
PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO		1		ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DO CABO NÚ DE COBRE DO SPDA, INSTALAÇÃO DE HASTE E REATERRO		3		MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOUIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/ INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ/ MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)		5		MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO SEGUNDO PAVIMENTO		6	
MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA SEGUNDA LAJE		7		ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA 80,55M²		8		EMBOÇO DO 2º PAV		9				10	
		11				12				13				14	
		15				16				17				18	
		19				20				21				22	
		23				24				25				26	
		27				28				29				30	
		31				32				33				34	
		35				36				37				38	
		39				40				41				42	
		43				44				45				46	
		47				48				49				50	
		51				52				53				54	
		55				56				57				58	
		59				60				61				62	
		63				64				65				66	
		67				68				69				70	
		71				72				73				74	
		75				76				77				78	
		79				80				81				82	
		83				84				85				86	
		87				88				89				90	
		91				92				93				94	
		95				96				97				98	
		99				100				101				102	
		103				104				105				106	
		107				108				109				110	
		111				112				113				114	
		115				116				117				118	
		119				120				121				122	
		123				124				125				126	
		127				128				129				130	
		131				132				133				134	
		135				136				137				138	
		139				140				141				142	
		143				144				145				146	
		147				148				149				150	
		151				152				153				154	
		155				156				157				158	
		159				160				161				162	
		163				164				165				166	
		167													



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO	
ENDEREÇO:		10/11/2023	
INÍCIO:		TERMINO	
DATA:		10/08/2024	

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		Observações:	
MANHÃ		TARDE	
☒ Sem chuva	☒ Com chuva	☒ Sem chuva	☒ Com chuva
☐ Improdutivo	☐ Improdutivo	☐ Improdutivo	☐ Improdutivo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DO CABO NÚ DE COBRE DO SPDA, INSTALAÇÃO DE HASTE E REATERRO
3	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA,
4	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/ INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ/ MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)
5	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO 2º PAV
6	FURACÃO PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE AÇO DA ESTRUTURA DA PLATIBANDA
7	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA 71,51M²
8	EMBOÇO DO 2º PAV
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

FUNÇÃO		QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRO	ANDAIME	0		32
ENCARRREGADO	ROMPEDOR	0		0
PEDREIRO	BETONEIRA	9		1
AJUDANTE	COMPACTADOR	4		0
CARPINTEIRO	SERRA CIRCULAR	1		1
	PISO ANDAIME			16
	SERRA MÁRMORE			1
	ESMERILHADEIRA			1
	FURADEIRA			1
	FURADEIRA DE IMPACTO			0
TOTAL		14	TOTAL	53

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.

RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

ENDEREÇO:

10/11/2023

TERMINO

10/08/2024

INÍCIO:

10/03/2025

DATA:

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ

☒ Sem chuva

☐ Com chuva

☐ Improdutivo

TARDE

☒ Sem chuva

☐ Com chuva

☐ Improdutivo

Observações:

DESMONTAGEM DAS ESCORAS DO 2º PAV

DESMONTAGEM DAS FORMAS DO 2º PAV

PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL

ESCAVAÇÃO E PASSAGEM DE CABO NÚ DE COBRE DO SPDA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PESSOAL

QUANT.

MODELO

QUANT.

FUNÇÃO

ENGENHEIRO

0

ANDAIM

ENCARRREGADO

1

ROMPEDOR

PEDREIRO

6

BETONEIRA

AJUDANTE

4

COMPACTADOR

CARPINTEIRO

1

SERRA CIRCULAR

ELETRICISTA

1

PISO ANDAIME

AJUDANTE DE ELÉTRICA

1

SERRA MARMORE

ESMERILHADEIRA

1

FURADEIRA

FURADEIRA DE IMPACTO

0

TOTAL

14

TOTAL

53



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO	
ENDEREÇO:	10/11/2023		
INÍCIO:	TERMINO		
DATA:	10/08/2024		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		Observações:	
MANHÃ	☒ Sem chuva ☐ Com chuva	TARDE	☒ Sem chuva ☐ Com chuva
☐ Improdutivo		☐ Improdutivo	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	CHAPISCO NO 2º PAV 137,52M²
2	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
3	ACABAMENTO INTERNO NAS JANELAS DO 1º PAV
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARRREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	13	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO	
ENDEREÇO:		10/11/2023	TERMINO
INÍCIO:		10/08/2024	
DATA:		06/03/2025	

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		Observações:	
MANHÃ	☒ Sem chuva ☐ Com chuva	TARDE	☒ Sem chuva ☐ Com chuva
	☐ Improdutivo		☐ Improdutivo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	CHAPISCO NO 2º PAV 132,06M²
2	ESCVAÇÃO PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
3	REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 6,28M²
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARRREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	12	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO	
ENDEREÇO:			
INÍCIO:		10/11/2023	TERMINO
DATA:		05/03/2025	
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	☒ Sem chuva ☐ Com chuva
		TARDE	☒ Sem chuva ☐ Com chuva
Observações:		☐ Improdutivo	
		☐ Improdutivo	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES			
1 CHAPISCO NO 2º PAV 92,53M²			
2 ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL			
3 REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 7,06M²			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
PESSOAL		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO		QUANT.	MODELO
ENGENHEIRO	0	ANDAIMÉ	32
ENCARRREGADO	0	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	4	BETONEIRA	1
AJUDANTE	1	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1
		PISO ANDAIMÉ	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADEIRA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0
TOTAL	6	TOTAL	53

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

ENDEREÇO:

10/11/2023

TERMINO

10/08/2024

INÍCIO:

04/03/2025

DATA:

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ ☒ Sem chuva ☐ Com chuva ☐ Improdutivo
TARDE ☒ Sem chuva ☐ Com chuva ☐ Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	CHAPISCO NO 2º PAV 90,26 M²
2	ALVENARIA DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL
3	PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL
4	REATERRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
5	REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 8,33M²
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL

QUANT.

MODELO

QUANT.

FUNÇÃO

ENGENHEIRO

0

ANDAIMÉ

0

ROMPEDOR

0

BETONEIRA

1

COMPACTADOR

0

AJUDANTE

1

CARPINTEIRO

471	PISO ANDAIMÉ
461	SERRA MÁRMORE
451	ESMERILHADEIRA
441	FURADEIRA
431	FURADEIRA DE IMPACTO

TOTAL

7

TOTAL

53



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.	
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO	
INÍCIO:		10/11/2023	TERMINO
DATA:		03/03/2025	
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ TARDE ☒ Sem chuva ☐ Com chuva ☐ Improdutivo ☒ Sem chuva ☐ Com chuva ☐ Improdutivo	



18/08/2024

10/08/2024

TERMINO

10/08/2024

01/03/2025

10/08/2024

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

TARDE	
-------	--

Sem diuiva Com diuiva

☐ unproductive

TARDE	
-------	--

☐ Sem chuva ☐ Com chuva

☐ Improductive

Observations:

SABADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

EMBOÇO DO 1º PAV 17,85M²

ALVENARIA DAS CAIXAS DE AGUA PLUVIAL

ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA AGUA PLUVIAL

REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 7,32M²

REQUADRO NO VÃO DE PORTA DO 1º PAV

EQUIPA	
--------	--

FUNÇÃO

QUANT.

MODELO

QUANT.

OBSERVAÇÕES:

TOTAL

από τον

Documento assinado digitalmente
LUIZ GUSTAVO DE BARROS
01/04/2025 13:09:56 -0200

Data: 30/04/2025 13:09:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL

CONTRATO: 097/2023		Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil		CREA: SP-5062695430
RELATÓRIO Nº: 15/2023		AUTOR:		
DATA: 10/04/2025		Fiscal do contrato		
		CONFERIDO:		
		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP



DATA: 10/04/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO
FOLHA: 2 / 8		

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS

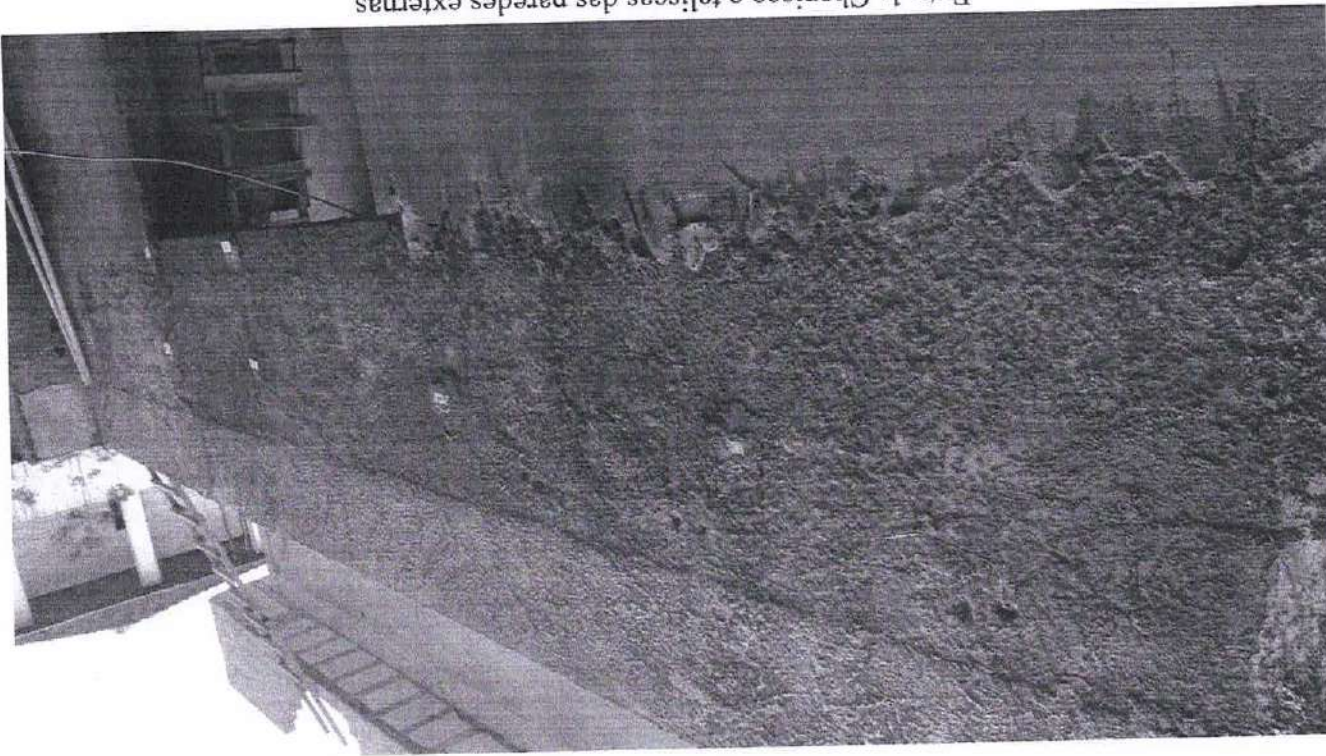


Foto 1: Chapisco e taliscas das paredes externas

Autor:	Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430
Conferido:	FISCAL DO CONTRATO

Foto 3: Assentamento de peitoril, reguadro das janelas do primeiro pavimento

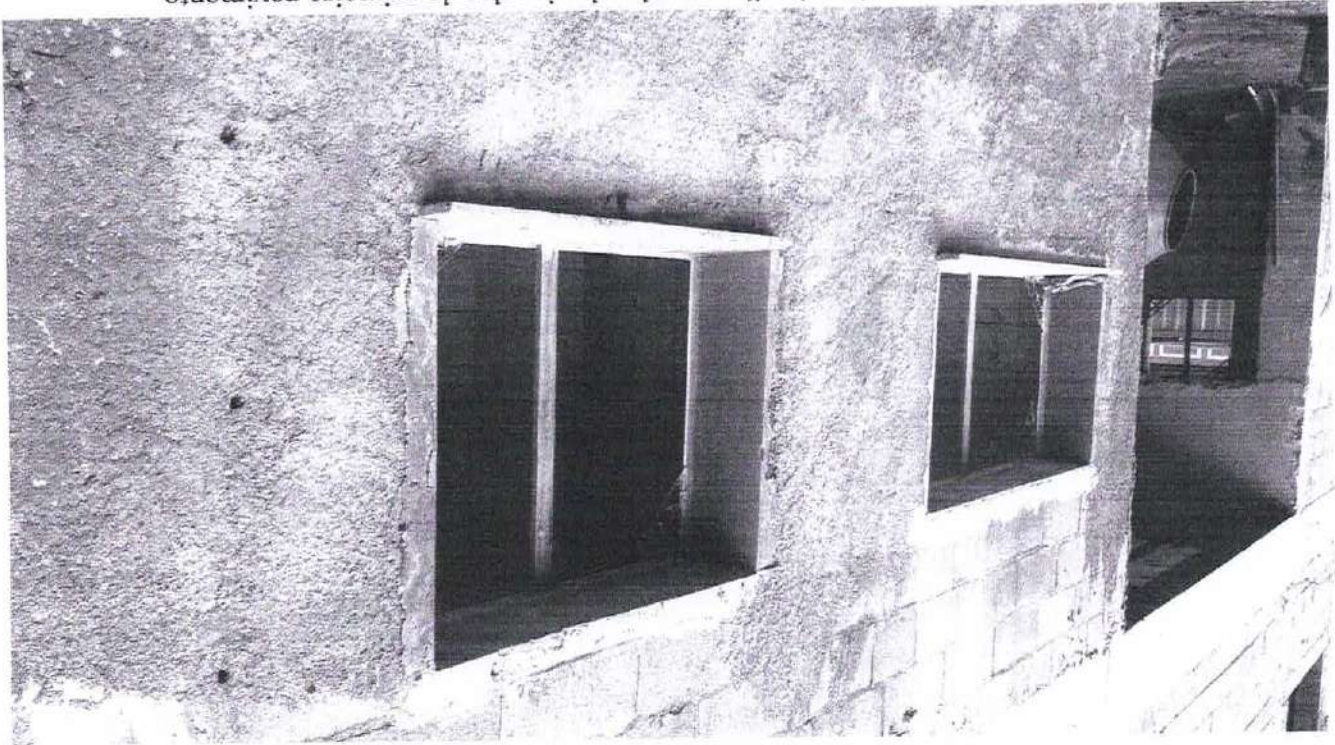


Foto 2: Reboco das paredes externas

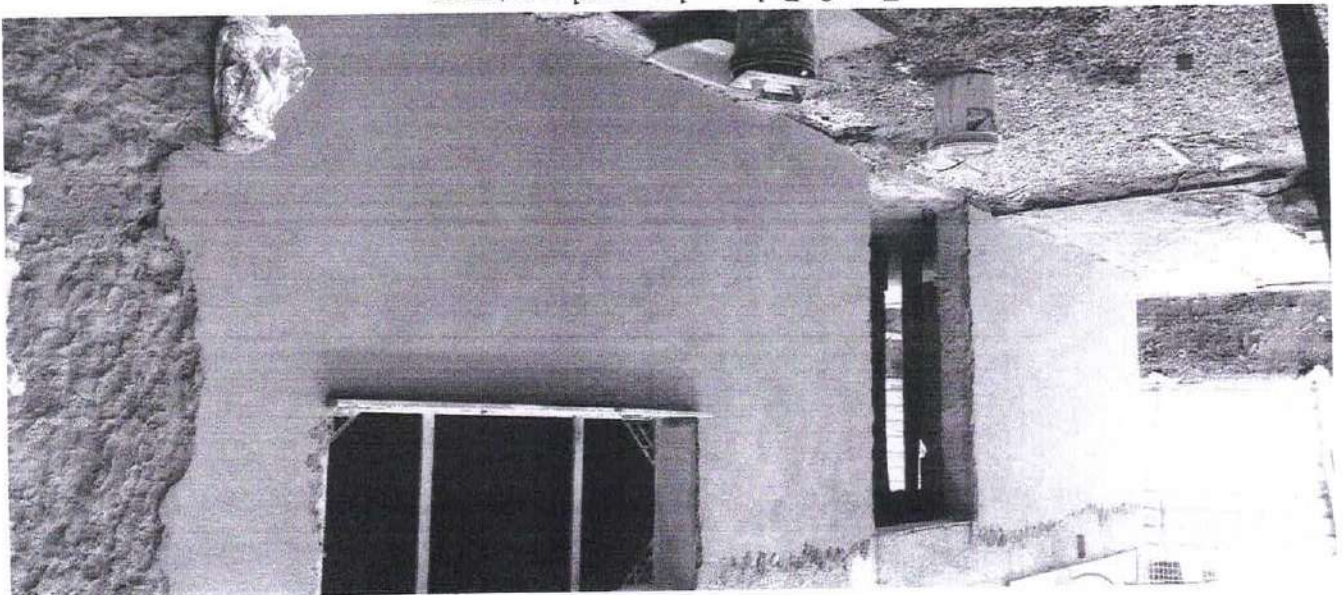




Foto 4: Contrapiso para a instalação dos pisos porcelanato



Foto 5: Assentamento de revestimento cerâmico

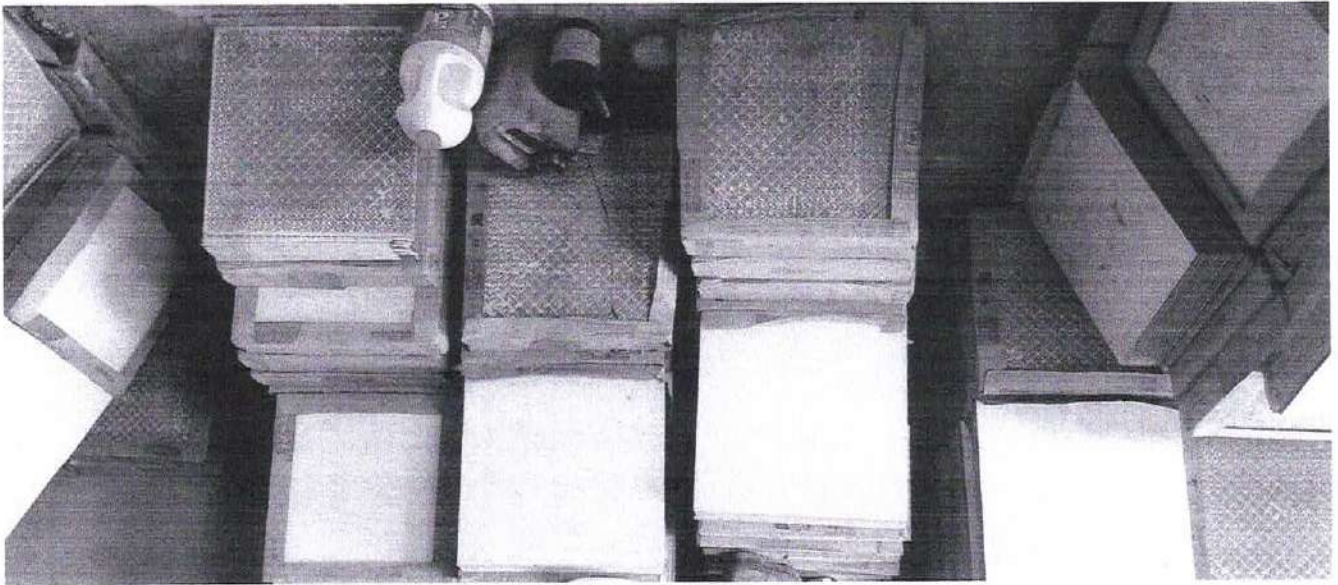


Foto 6: Pisos porcelanato

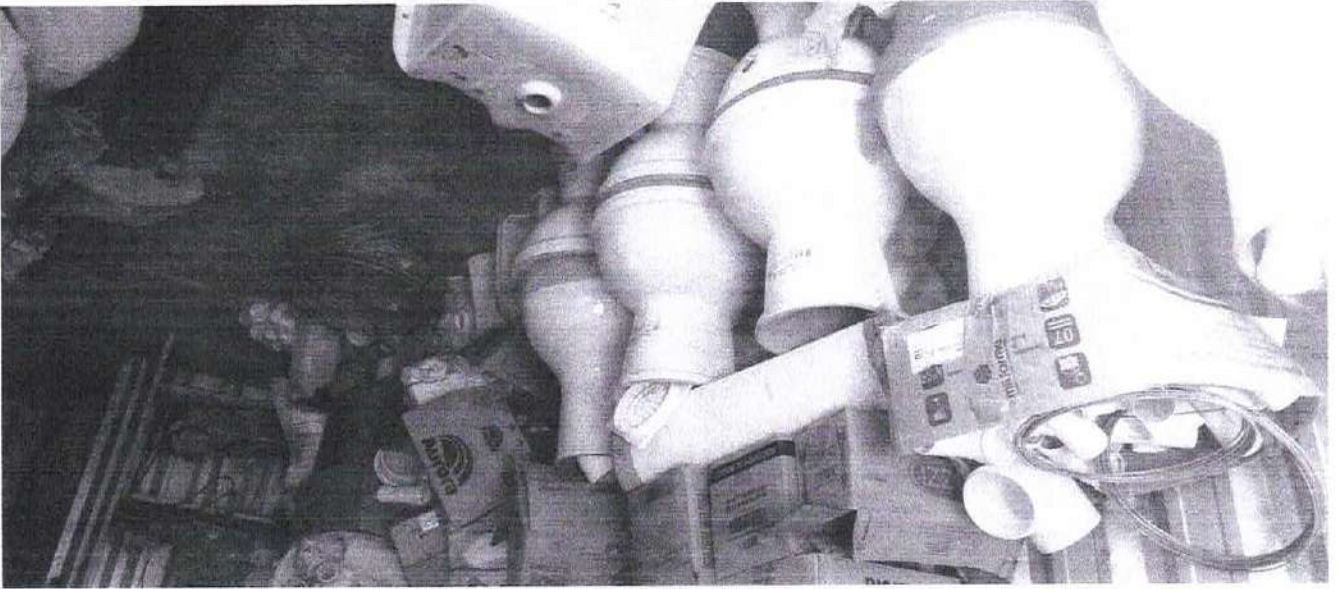


Foto 7: Bacias sanitárias, tanque e pias

DATA:
10/04/2025

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 15ª MEDIÇÃO

FOLHA: 6 / 8

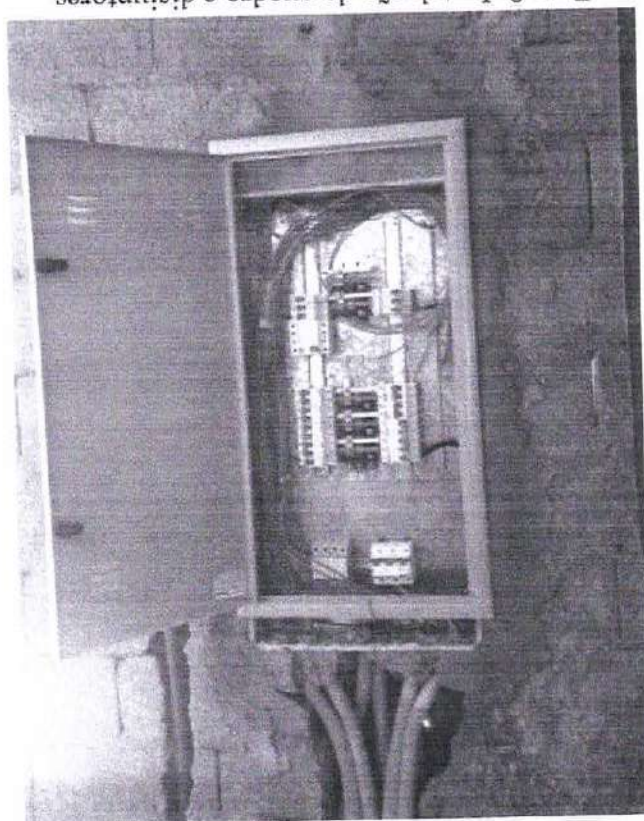


Foto 8: Instalação de quadro e disjuntores.

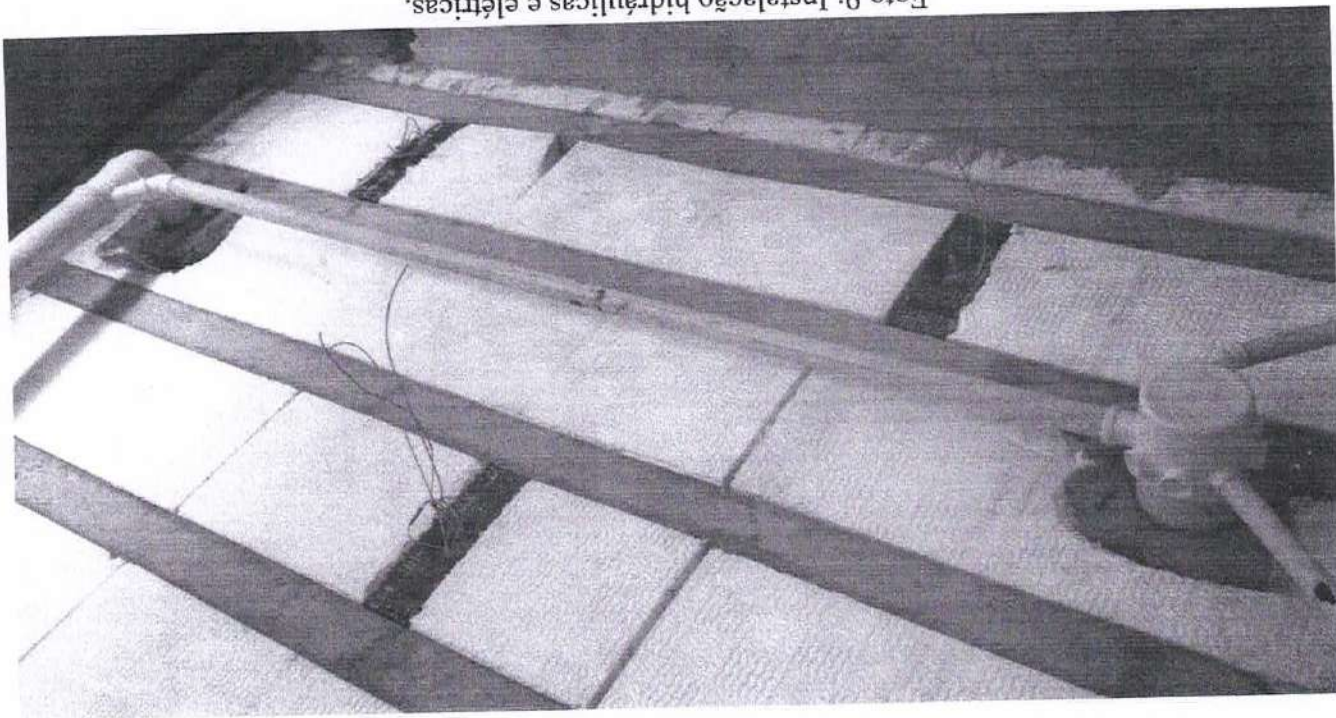


Foto 9: Instalação hidráulicas e elétricas.

Autor:

Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conteúdo:

FISCAL DO CONTRATO

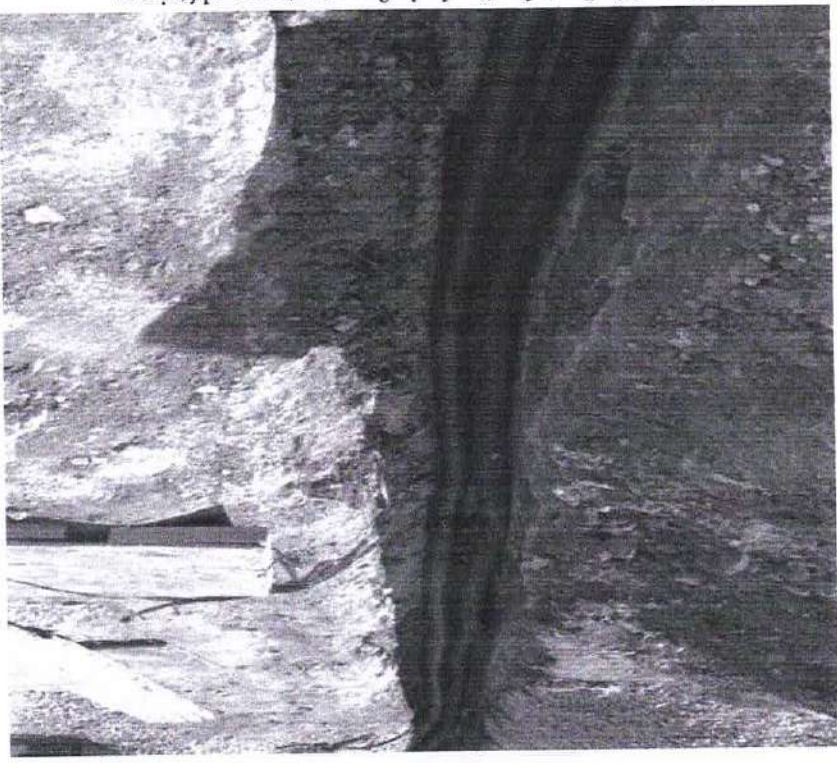


Foto 10: Instalação de infraestruturas elétricas.

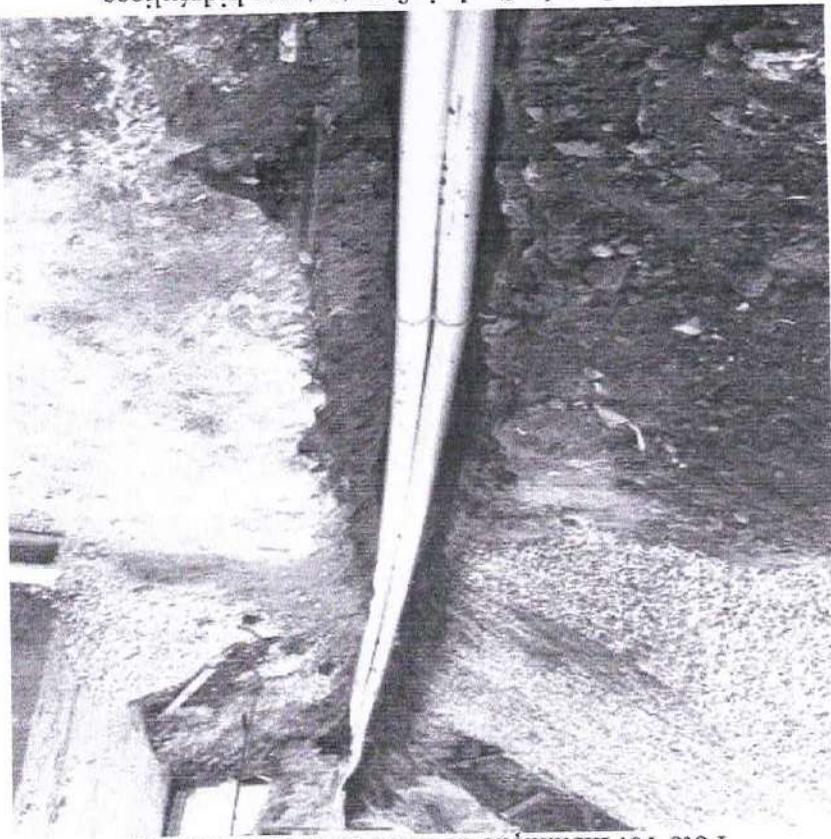


Foto 11: Instalação de infraestruturas hidráulicas.

DATA:
10/04/2025

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO

FOLHA: 8 / 8

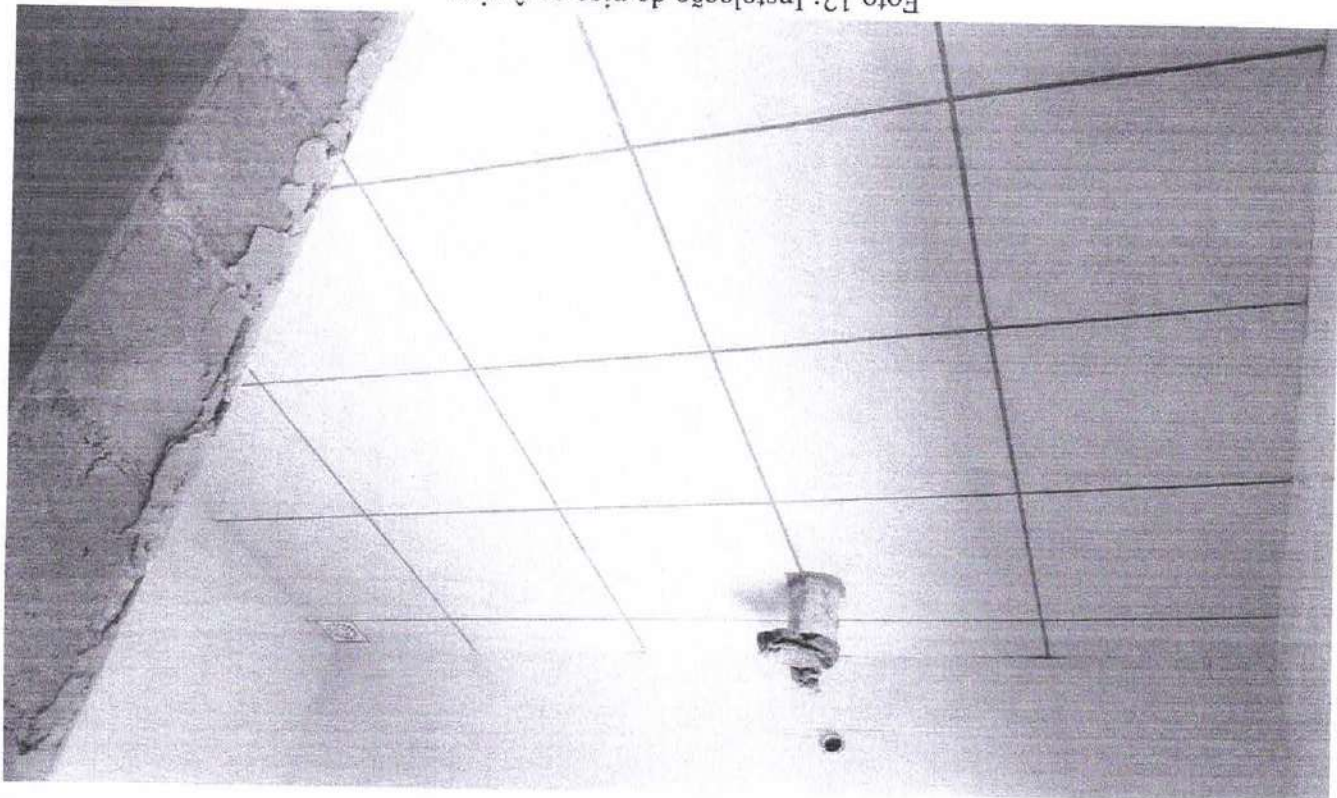


Foto 12: Instalação de piso cerâmico.

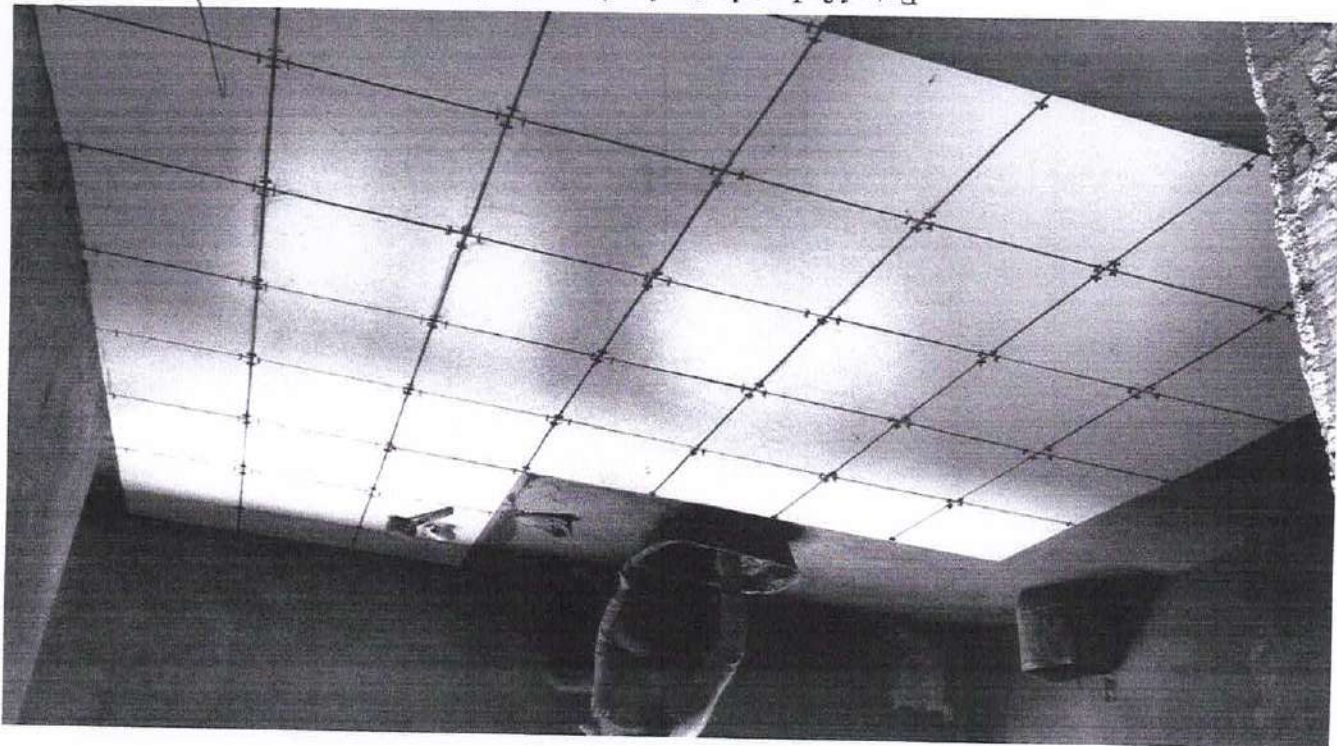


Foto 13: Instalação de piso cerâmico.

gov.br
Autor: LUIS GUSTAVO DE BARROS
Documento assinado digitalmente
Data: 30/04/2025 13:09:56-0300
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

RICARDO ALASSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Engenheiro Civil - Crea: 507022880
Secretaria de Obras



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:08:48 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **C718.26BB.E418.4796**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinatura e Carimbo
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2025/000004119313

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Certidão emitida em: 10/04/2025, às 11:55:42 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **43273400F1F5161D**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.
- g) **As execuções criminais constarão apenas na certidão do 1º grau.**

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão nº: 20250406/2025

Expedição: 09/04/2025, às 15:32:10

Validade: 06/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.563.488/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 339284

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 08/04/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de abril de 2025.

PEDIDO Nº:

0085572049





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 66819551

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/04/2025 15:21:49

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 66819551

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/04/2025 15:21:49

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25040949093-64

Data e hora da emissão 28/04/2025 09:32:35

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
LTDA

CNPJ: 14.563.488/0001-70

CERTIDÃO EMITIDA em 10/04/2025, às 13:19:05

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 07/04/2025, **DESOBPIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **Q1NobiZAVLaOFmM**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 07/04/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 07/04/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO

Certidão nº 248248 / 2025

CERTIFICA-SE que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 09/04/2025, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2025/000004119221

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Certidão emitida em: 10/04/2025, às 11:54:06 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **A13F1788B9829C1C**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Serviço de Dívida Ativa

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácara Selles – Guaratinguetá - SP - 12.505-470

Certidão Fiscal NEGATIVA de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 248/2025
Processo nº 3033//2025

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, “**C E R T I F I C A**” a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no **CNPJ 14.563.488/0001-70**, com inscrição municipal **13-5546/01/ISS**. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município no CNPJ da firma acima citada

CERTIFICA-SE ainda que “**NADA DEVE**”, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.563.488/0001-70
Razão Social: A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI
Endereço: ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2025 a 15/05/2025

Certificação Número: 2025041604121877731544

Informação obtida em 16/04/2025 08:23:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07

833 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 327	DATA: 05/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	230852/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2025
------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	14.563.488/0001-70	CÓDIGO: 10786
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES	GUARATINGUETA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 802 TRANSF. UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND 001 PLANO AÇÃO 09032024-075342/24 SAULO PEDR	PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido 31.613,87 Desconto 1.663,89

GL	SOMA	33.277,76
----	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1029.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES EXECUÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CENTRO SAUDE DR. JOAO AURICCHIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
774.381,35	214.916,68	33.277,76	559.464,67

VALOR A SER PAGO R\$	33.277,76
trinta e três mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos *****	
DESCONTOS	

8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	1.663,89
TOTAL DE DESCONTOS	
1.663,89	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/05/2025	Carissa Marcos
-------------------------------------	----------------

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DATA	Carolina de Sousa Silva - Secretária de Finanças

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora	DATA Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
