

DOCUMENTO 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMENDA PIX: 202445120010

PARLAMENTAR: SAULO PEDROSO

PLANO DE AÇÃO: 09032024-075342 / 2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA PIX: 202445120010
PARLAMENTAR: SAULO PEDROSO
PLANO DE AÇÃO: 9032024-075342 / 2024

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PIX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JÃO AURICCHIO; REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE; COBERTURA DA QUADRA VILA ESPERANÇA E CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE
EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 46.643.482/0001-07

ENDEREÇO e CEP: PRAÇA DEPUTADO ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO, 180 - CENTRO, CEP: 12.250-000

RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO: EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 3.000.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 9.931,65
TOTAL	R\$ 3.009.931,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) mais rendimentos financeiros no valor de R\$ 9.931,65 (nove mil novecentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 0,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 3.009.931,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 3.009.931,65

Declaro, na qualidade de responsável pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
235/2023	26/10/2023	ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DR. JOÃO AURICCHIO	TOMADA DE PREÇOS N: 08/2023	FEDERAL	R\$ 2.326.081,35

LOCAL E DATA: MONTEIRO LOBATO, 11 DE JUNHO DE 2025.

RESPONSÁVEL: EDMAR JOSÉ DE ARAUJO - PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA PIX: 202445120010
PARLAMENTAR: SAULO PEDROSO
PLANO DE AÇÃO: 9032024-075342 / 2024

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PIX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JÃO AURICCHIO; REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE; COBERTURA DA QUADRA VILA ESPERANÇA E CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE
EXERCÍCIO: JANEIRO A MAIO DE 2025
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
CNPJ: 46.643.482/0001-07
ENDEREÇO e CEP: PRAÇA DEPUTADO ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO, 180 - CENTRO, CEP: 12.250-000
RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO: EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 0,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/12/2024)	R\$ 3.009.931,65
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 114.855,99
TOTAL	R\$ 3.124.787,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no valor de R\$ 3.0000.0000,00 (três milhões de reais) mais rendimentos financeiros no valor de R\$ 114.855,99 (cento e catorze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
10/03/2025	NF: 588	ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 181.638,92
30/04/2025	NF: 598	ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 33.277,76
28/05/2023	NF: 604	ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 255.700,57
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 470.617,25
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 2.654.170,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 2.654.170,39

Declaro, na qualidade de responsável pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
235/2023	26/10/2023	ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DR. JOÃO AURICCHIO	TOMADA DE PREÇOS N: 08/2023	FEDERAL	R\$ 2.326.081,35

LOCAL E DATA: MONTEIRO LOBATO, 11 DE JUNHO DE 2025.

RESPONSÁVEL: EDMAR JOSÉ DE ARAUJO - PREFEITO MUNICIPAL

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número da Nota 588			
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data e Hora de Emissão 10/03/2025 17:13:50			
			Código de Verificação * O0IH-WRHR			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000 Município: MONTEIRO LOBATO UF: SP E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 10/03/2025, EM MONTEIRO LOBATO - SP						
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 14ª Medição Período: 12/02/2025 a 07/03/2025 Valor: R\$ 181.638,92 Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica a retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022. 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1						
Valor do Serviço R\$ 181.638,92		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 181.638,92	Aliquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 9.081,95
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 181.638,92						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 172.556,97						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Engenheiro Civil - Crea: 5070225050
Secretário de Obras



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO



MEMORANDO SEC.OBRAS 25048/2025

Ref.: 14º Medição - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

A Secretária de Finanças

Prezada;

A Secretaria Obras do município de Monteiro Lobato - SP, vem através deste, solicitar o pagamento da 14º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido Processo N° 230852/2023, Tomada de Preço N°008/2023, no valor total de **R\$181.638,92** na seguinte nota fiscal, nº588-E.

Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 11 de março de 2025.

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA

Eng. Civil - CREA SP 5070225050

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000

Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: gabinete@monteirolobato.sp.gov.br

www.monteirolobato.sp.gov.br



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP



PREFEITURA DE
**MONTEIRO
LOBATO**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 06/03/2025

RELATÓRIO Nº:
14/2023

CONFERIDO:

Fiscal do contrato

AUTOR:

CONTRATO: 097/2023

Lúis Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

DATA: 06/03/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 14ª MEDIÇÃO	FOLHA: 2 / 7
---------------------	--	--------------

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS



Foto 1: Assentamento do revestimento cerâmico no 1º Pavimento

Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
---	---

DATA:
06/03/2025

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 3 / 7

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 14ª MEDIÇÃO

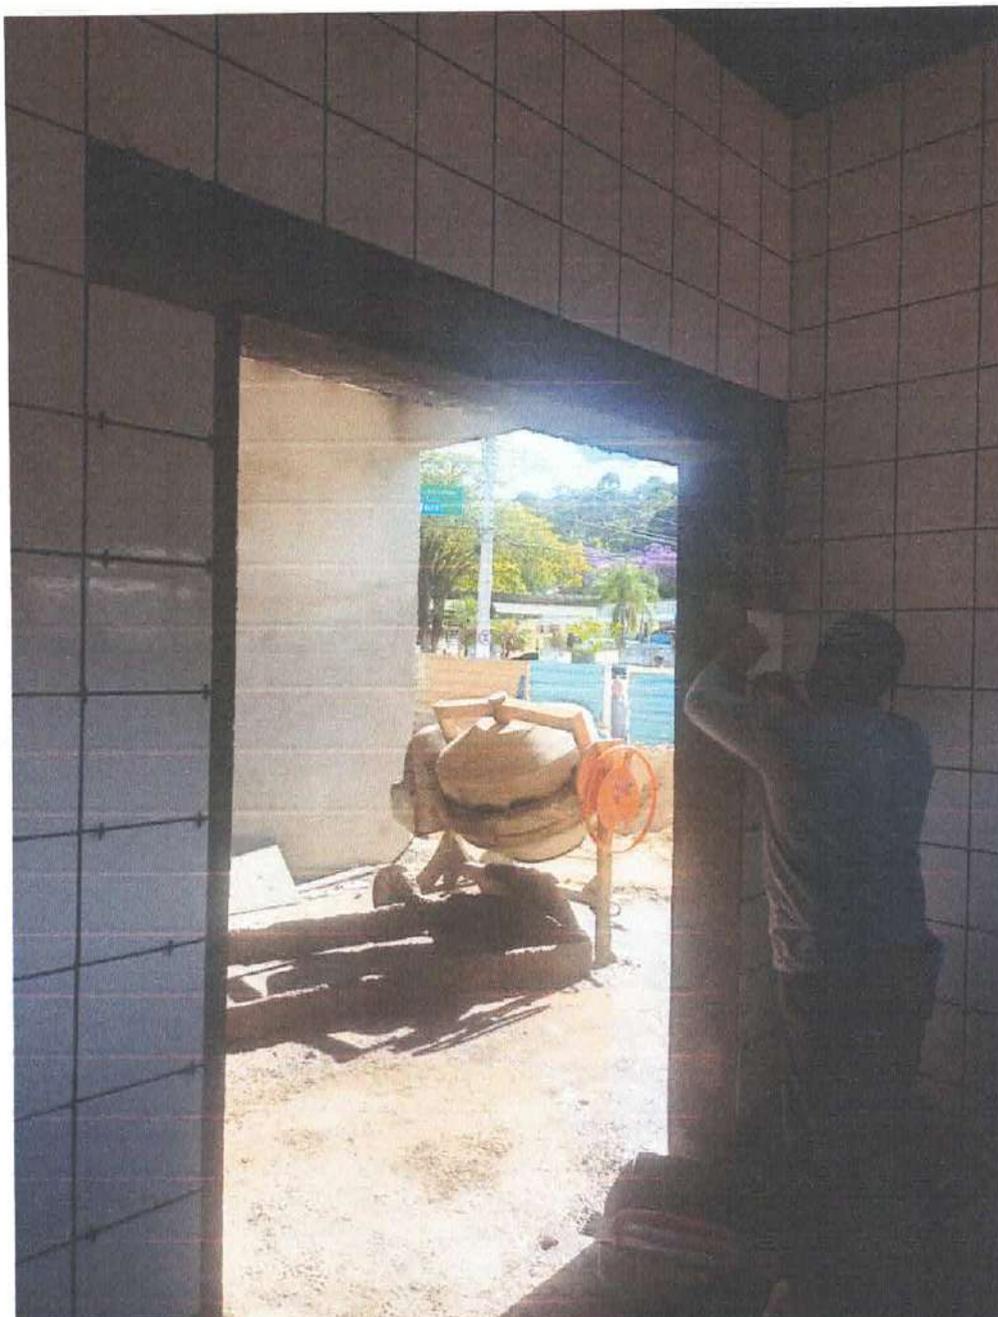


Foto 2: Assentamento do revestimento cerâmico no 1º Pavimento

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA:
06/03/2025

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL


FOLHA: 4 / 7

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 14ª MEDIÇÃO



Foto 3: Chapisco do 2º Pavimento

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA:
06/03/2025

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 5 / 7

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 14ª MEDIÇÃO

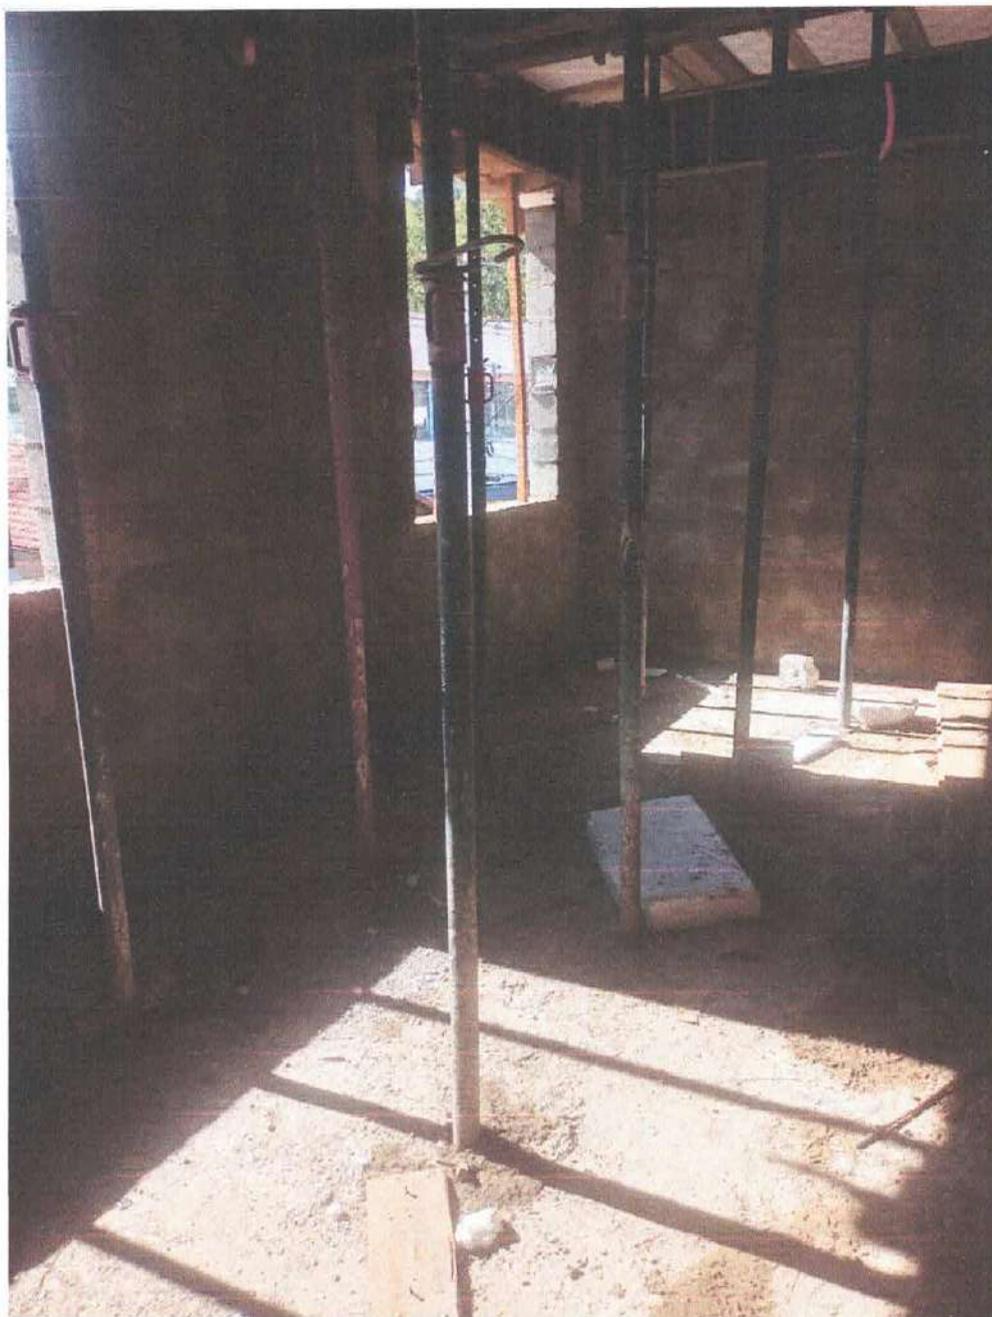


Foto 4: Chapisco do 2º Pavimento

Autor:


Luis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA: 06/03/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 14ª MEDIÇÃO	FOLHA: 6 / 7
---------------------	---	---------------------

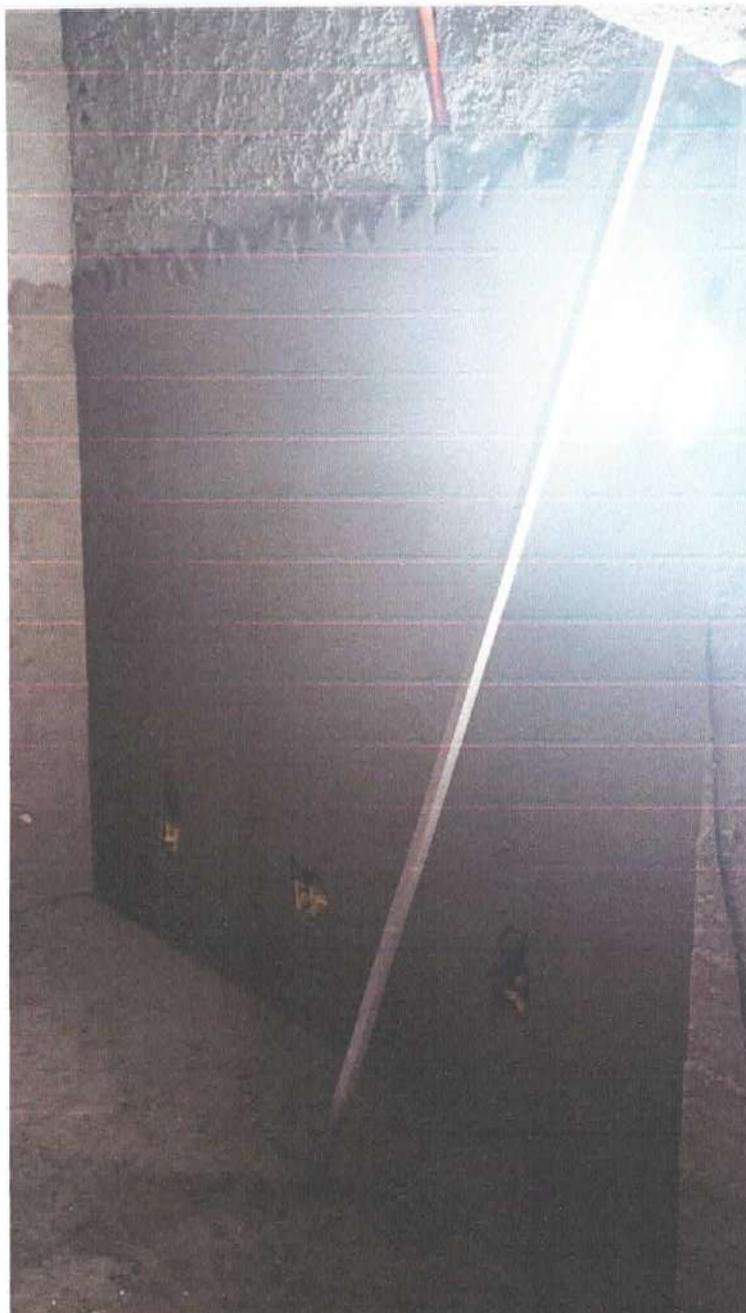


Foto 5: Reboco e emboço do 1º Pavimento

Autor:  Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
---	--

<p>DATA: 06/03/2025</p>	<p align="center">CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p align="center">RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 14ª MEDIÇÃO</p>	<p align="center">FOLHA: 7 / 7</p>
-----------------------------	--	---


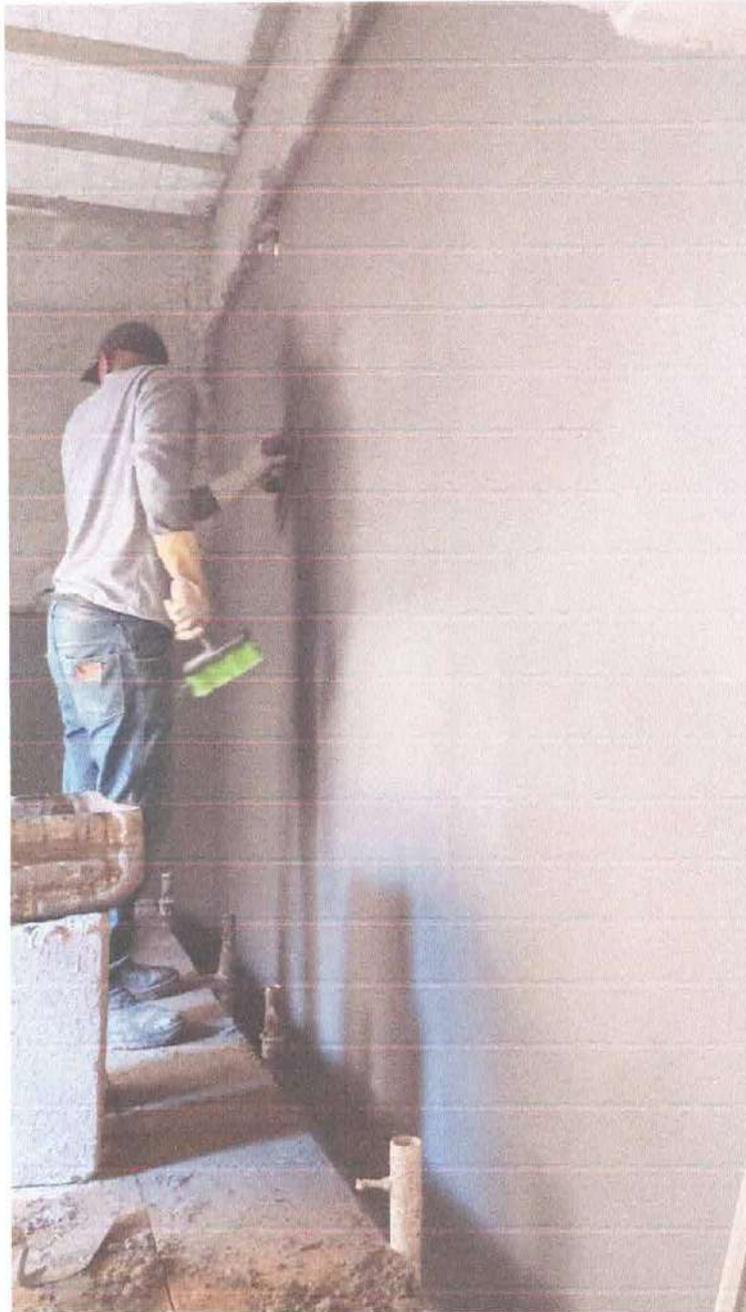


Foto 6: Reboco e emboço do 1º Pavimento


RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
 Engenheiro Civil - Crea: 5070225050
 Secretário de Obras

<p>Autor:</p> <p align="center">  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430 </p>	<p>Conferido:</p> <p align="center">FISCAL DO CONTRATO</p>
---	---



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO								
OBJETO			DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA					
BDI = 25%								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
						S/ BDI	C/ BDI	
1								
01								
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO								
1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	100%	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	100%	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	100%	un	6,00	2.114,85	2.643,56	15.861,36
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	100%	un	10,00	1.551,02	1.938,77	19.387,70
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	100%	un	12,00	865,86	832,32	9.987,84
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	100%	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM	100%	tx	1,00	942,15	1.177,68	1.177,68
1.8	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	100%	m	90,00	75,15	93,03	8.453,70
								72.378,53
2								
02								
INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA								
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	100%	un.mês	9,90	627,19	783,98	7.055,82
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	100%	un.mês	9,90	923,12	1.153,90	10.385,10
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	67%	un.mês	9,90	575,88	719,85	6.478,85
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	100%	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80
2.5	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	100%	m.mês	40,50	19,29	24,11	976,46
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	100%	m²	6,00	678,00	847,60	5.085,00
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	100%	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	100%	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,96
								45.889,99
3								
06								
SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL								
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1º/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	100%	m³	10,00	39,47	49,33	493,30
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	100%	m³	10,00	12,27	15,33	153,30
								646,60
4								
08								
ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM								
4.1	08.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m³.mês	1.566,00	5,86	7,32	11.463,12
4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m²	783,00	10,01	12,51	9.795,33
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	100%	m²	18,20	102,53	128,16	2.076,19

14ª MEDIÇÃO - 05/03/2025					
QUANT.	MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	ACUMULADO MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
		-	0,00%	5.254,15	-
		-	0,00%	6.710,72	-
		-	0,00%	15.861,36	-
		-	0,00%	19.387,70	-
		-	0,00%	9.987,84	-
		-	0,00%	5.545,38	-
		-	0,00%	1.177,68	-
		-	0,00%	8.453,70	-
		-			R\$ -
		-	0,00%	7.055,82	0,00
		-	0,00%	10.385,10	-
1,00		719,85	11,11%	4.319,10	2.159,55
		-	0,00%	7.704,80	-
		-	0,00%	976,46	-
		-	0,00%	5.085,00	-
		-	0,00%	1.734,20	-
		-	0,00%	6.449,96	-
		719,85			R\$ 2.159,55
		-	0,00%	493,30	0,00
		-	0,00%	153,30	-
		-			R\$ 0,00
		-	0,00%	11.463,12	0,00
		-	0,00%	9.795,33	-
		-	0,00%	2.076,19	0,00

4.4	08.05.180	MANTA GEOTÊXTEL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	100%	m²	81,00	12,83	16,16	1.308,96
4.5	08.06.040	BARBACÁ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	100%	m	10,00	21,02	26,27	262,70
24.906,30								
5	09	FORMA						
5.1	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	100%	m²	480,74	141,41	178,76	84.975,60
84.975,60								
6	10	ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL						
6.1	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	100%	kg	13.824,00	9,34	11,67	161.326,08
6.2	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	100%	kg	2.073,60	11,02	13,77	28.553,47
6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	100%	kg	5.016,00	12,07	15,08	75.641,28
265.520,83								
7	11	CONCRETO, MASSA E LASTRO						
7.1	11.01.260	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO	100%	m³	62,70	374,13	467,66	29.322,28
7.2	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO	100%	m³	138,24	388,49	485,61	67.130,73
7.3	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB.	100%	m³	200,94	80,77	100,96	20.286,90
7.4	11.16.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	100%	m³	39,19	125,27	156,58	6.136,37
122.876,28								
8	12	FUNDAÇÃO PROFUNDA						
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	100%	tx	1,00	1.515,51	1.894,38	1.894,38
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	100%	m	450,00	54,03	67,53	30.388,50
32.282,88								
9	13	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS						
9.1	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (18+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	100%	m²	355,52	152,86	190,81	67.836,77
9.2	13.01.190	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	100%	m²	476,21	167,30	209,12	98.585,04
167.421,81								
10	14	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR						
10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B	100%	m²	900,50	86,27	82,83	66.305,41
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B	100%	m²	812,00	80,93	101,18	82.141,92
10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	50%	m²	21,42	485,87	607,33	13.009,00
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	50%	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,63
171.490,96								
11	16	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO						
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M	100%	m²	355,52	103,81	129,76	46.132,27
46.132,27								
12	16	TELHAMENTO						
12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	0%	m²	460,00	46,86	58,57	28.942,20
12.2	16.30.020	DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	0%	m²	17,50	587,08	733,85	12.842,37
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	0%	m²	36,90	243,57	304,46	11.234,57
12.4	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CÔRTE 0,59 M	0%	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09

			0,00%	1.308,96	-	-
			0,00%	262,70	-	-
					-R\$	0,00
			0,00%	84.975,60	-	0,00
					R\$	0,00
			0,00%	161.326,08	-	0,00
			0,00%	28.553,47	-	0,00
			0,00%	75.641,28	-	-
					-R\$	0,00
			0,00%	29.322,28	-	0,00
			0,00%	67.130,73	-	0,00
			0,00%	20.286,90	-	0,00
			0,00%	6.136,37	-	0,00
					-R\$	0,00
			0,00%	1.894,38	-	-
			0,00%	30.388,50	-	0,00
					-R\$	0,00
			0,00%	67.836,77	-	-
			0,00%	99.585,04	-	-
					R\$	-
			0,00%	66.305,42	-	-
			0,00%	82.141,92	-	-
10,71	6.504,50	50,00%	6.504,50	6.504,50	6.504,50	
43,85	5.017,32	50,00%	5.017,32	5.017,32	5.017,31	
	11.521,82				R\$	11.521,81
355,52	46.132,27	100,00%	46.132,27		-	
	46.132,27				R\$	-
		0,00%	-	-	26.942,20	
		0,00%	-	-	12.842,37	
		0,00%	-	-	11.234,57	
		0,00%	-	-	15.392,09	

								66.411,23				R\$ 66.411,23	
13	17	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL											
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	0%	m²	2,50	943,04	1.178,80	2.947,00	-	0,00%	-	2.947,00	
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	85%	m²	18,40	508,35	835,43	11.691,91	-	0,00%	9.938,13	1.753,78	
13.3	17.02.020	CHAPISCO	95%	m²	3.225,00	4,90	6,12	19.737,00	1.507,40	9.225,29	46,74%	18.714,10	1.022,90
13.4	17.02.120	EMBOÇO COMUM	100%	m²	3.225,00	15,52	19,40	62.565,00	836,04	16.219,18	25,92%	62.565,00	-
13.5	17.02.220	REBOCO	90%	m²	2.268,62	8,78	10,95	25.060,38	389,06	4.260,21	17,00%	22.629,29	2.431,09
								122.001,29				R\$ 8.154,77	
14	18	REVESTIMENTO CERÂMICO											
14.1	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B1LA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	70%	m²	537,66	117,77	147,21	79.178,37	107,57	15.835,38	20,00%	55.424,57	23.753,81
14.2	18.06.162	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RUSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B1LB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	50%	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34	-	0,00%	867,17	867,17	
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	70%	m²	74,20	143,31	179,13	13.291,44	14,84	2.658,29	20,00%	9.304,01	3.987,43
14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	70%	m²	936,38	55,06	68,82	64.441,67	187,87	12.929,21	20,06%	45.150,05	19.291,62
								158.645,82				R\$ 47.900,02	
15	19	REVESTIMENTO EM PEDRA											
15.1	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	84%	m	146,10	118,12	147,65	21.571,66	-	0,00%	18.168,33	3.403,33	
								21.571,66				R\$ 3.403,33	
16	21	REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO											
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	30%	m²	153,03	178,82	223,27	34.167,00	-	0,00%	10.250,10	23.916,90	
16.2	21.10.061	RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	30%	m	143,15	27,58	34,47	4.034,38	-	0,00%	1.480,31	3.454,07	
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM	0%	m	34,50	19,15	23,93	825,58	-	0,00%	-	825,58	
								39.926,96				R\$ 28.196,54	
17	22	FORRO, BRISE E FACHADA											
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	10%	m²	718,00	68,94	86,17	61.870,06	72,00	6.204,24	10,03%	6.204,24	55.665,82
								61.870,06				R\$ 55.665,82	
18	23	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA											
18.1	23.04.560	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM	87%	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38	-	0,00%	6.180,92	3.090,46	
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	87%	un	6,00	1.385,73	1.733,41	10.400,46	-	0,00%	6.933,64	3.466,82	
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	59%	un	17,00	1.399,77	1.749,71	29.745,07	-	0,00%	17.497,10	12.247,97	
18.4	23.08.030	FAXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	60%	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90	-	0,00%	3.010,14	2.006,76	
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	60%	m²	0,90	133,79	167,23	150,50	-	0,00%	90,30	60,20	
18.6	23.09.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	60%	m²	3,78	390,80	488,25	1.845,58	-	0,00%	1.107,35	738,23	
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	75%	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00	-	0,00%	2.785,50	928,50	

18.8	23.09.580	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	67%	un	6,00	773,84	967,30	5.803,80
18.9	23.09.590	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO -160 X 210 CM	58%	un	12,00	1.019,96	1.274,95	15.269,40
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	59%	un	16,90	44,29	55,36	935,58
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	60%	m	16,90	6,62	8,52	149,98
82.326,65								
19	24	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO						
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	100%	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47
19.2	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	0%	m²	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95
27.658,42								
20	25	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO						
20.1	25.01.050	CAXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	29%	m²	41,10	666,45	833,06	34.238,76
20.2	25.01.060	CAXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	78%	m²	29,55	706,32	882,90	26.089,69
20.3	25.01.090	CAXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	50%	m²	4,10	549,15	686,43	2.814,36
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	60%	m²	19,11	870,40	1.088,00	20.791,88
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	60%	m²	16,80	596,96	746,20	12.536,16
96.470,65								
21	26	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO						
21.1	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM	0%	m²	1,50	420,84	526,05	789,07
21.2	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	0%	m²	3,00	529,47	661,83	1.985,49
2.774,56								
22	27	ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL						
22.1	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	0%	m	126,00	124,82	156,02	19.658,52
19.658,52								
23	28	FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS						
23.1	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 80 KG ATÉ 80 KG	0%	un	4,00	245,27	307,83	1.231,32
1.231,32								
24	30	ACESSIBILIDADE						
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	57%	m	7,00	149,33	186,66	1.306,62
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	57%	un	7,00	95,90	119,87	839,09
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	60%	un	14,00	125,90	157,37	2.203,18
24.4	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	57%	un	7,00	282,61	353,13	2.471,91
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	50%	m²	11,50	150,96	188,70	2.170,05
24.6	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	50%	m	14,00	389,47	486,83	6.815,62
24.7	30.08.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	0%	un	2,00	170,78	213,47	426,94
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	60%	un	5,00	766,33	957,91	4.789,55
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	60%	un	5,00	1.192,55	1.490,66	7.453,40
24.10	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	60%	un	5,00	848,78	1.060,97	5.304,85
33.781,21								
25	32	IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA						

-	0,00%	3.869,20	1.934,60
-	0,00%	8.924,65	6.374,75
-	0,00%	553,60	381,98
-	0,00%	86,39	57,59
-			R\$ 31.287,85
-	0,00%	26.314,47	-
-	0,00%	-	1.343,95
-			R\$ 1.343,95
-	0,00%	9.852,08	24.386,68
-	0,00%	20.306,70	5.782,99
-	0,00%	1.407,18	1.407,18
1,91	2.078,08	9,99%	12.479,36
1,68	1.253,62	10,00%	7.521,70
	3.331,70		R\$ 44.903,63
-	0,00%	-	789,07
-	0,00%	-	1.985,49
-			R\$ 2.774,56
-	0,00%	-	19.658,52
-			R\$ 19.658,52
-	0,00%	-	1.231,32
-			R\$ 1.231,32
4,00	746,64	57,14%	746,64
4,00	479,48	57,14%	479,48
7,00	1.101,59	50,00%	1.101,59
4,00	1.412,52	57,14%	1.412,52
5,75	1.085,03	50,00%	1.085,03
7,00	3.407,81	50,00%	3.407,81
-		0,00%	-
3,00	2.873,73	60,00%	2.873,73
3,00	4.472,04	60,00%	4.472,04
3,00	3.182,91	60,00%	3.182,91
	18.761,75		R\$ 15.019,47

25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	100%	m²	113,30	63,64	78,55	9.013,01			0,00%	9.013,02	
25.2	32.15.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	100%	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,46			0,00%	2.012,46	
									11.025,47				
26	33	PINTURA											
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	0%	m²	1.462,97	11,66	14,57	21.315,47			0,00%	-	21.315,47
26.2	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63			0,00%	-	54.458,63
26.3	33.10.060	EPOXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	279,20	80,21	100,26	27.992,09			0,00%	-	27.992,09
26.4	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	84,62	32,49	40,61	2.624,21			0,00%	-	2.624,21
									106.390,40				106.390,40
27	34	PASAGISMO E FECHAMENTOS											
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	0%	m³	4,55	149,63	187,03	850,98			0,00%	-	850,98
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	0%	m²	42,25	1,31	1,63	68,88			0,00%	-	68,88
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	0%	m²	68,70	10,88	13,60	934,32			0,00%	-	934,32
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALEA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32			0,00%	-	1.354,32
27.5	34.03.120	ARBUSTO MORÊJA - H= 0,50 M	0%	un	15,00	29,53	36,91	553,65			0,00%	-	553,65
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	2,00	29,95	37,43	74,86			0,00%	-	74,86
27.7	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	0%	un	2,00	89,11	111,38	222,76			0,00%	-	222,76
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	13,00	41,88	52,35	680,55			0,00%	-	680,55
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA	0%	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60			0,00%	-	26.613,60
									31.353,92				31.353,92
28	37	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA											
28.1	37.01.160	QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	100%	un	1,00	500,24	625,30	625,30			0,00%	625,30	-
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	100%	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.055,68			0,00%	5.055,68	-
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	100%	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50			0,00%	1.172,50	-
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	100%	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92			0,00%	2.875,92	-
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	100%	un	8,00	129,47	161,83	1.294,64			0,00%	1.294,64	-
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	100%	un	24,00	129,52	161,90	3.885,60	24,00	3.885,60	100,00%	3.885,60	-
28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	100%	un	6,00	148,28	185,35	1.112,10	6,00	1.112,10	100,00%	1.112,10	-
28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS	100%	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84			0,00%	8.719,84	-
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	100%	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60			0,00%	4.541,60	-
28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/15V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	100%	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20			0,00%	2.800,20	-
									32.083,38				
29	38	TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA											
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	100%	m	980,00	12,54	15,67	15.358,60			0,00%	15.356,60	0,00
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	100%	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40			0,00%	3.209,40	0,00
									18.566,00				0,00
30	39	CONDUTOR E ENFIACAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA											
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	72%	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00	1.600,00	6.576,00	38,10%	12.503,47	4.758,53
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	5%	m	860,00	5,05	6,31	4.164,60			0,00%	220,16	3.944,44
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	93%	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00			0,00%	2.989,59	237,42
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	50%	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00	100,00	1.395,00	50,00%	1.395,00	1.395,00
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	0%	m	10,00	28,39	35,48	354,80			0,00%	-	354,80

30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	0%	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00	-	0,00%	-	1.532,00	
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	61%	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20	120,00	2.109,60	50,00%	2.585,49	1.633,71
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	72%	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50	-	0,00%	2.734,07	1.053,43	
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	15%	m	120,00	29,68	37,10	4.452,00	-	0,00%	663,72	3.788,28	
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	50%	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40	90,00	4.547,70	50,00%	4.547,70	4.547,70
								50.684,50				R\$ 23.245,30	
31	40	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA											
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, CCM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM	67%	un	6,00	135,72	169,65	1.017,90	-	0,00%	678,60	339,30	
31.2	40.04.090	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	67%	cj	6,00	22,60	26,25	169,50	-	0,00%	113,00	56,50	
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	50%	cj	90,00	18,30	22,97	2.059,30	-	0,00%	1.029,15	1.029,15	
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	50%	cj	20,00	21,59	26,98	539,60	-	0,00%	269,80	269,80	
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	33%	cj	6,00	28,12	35,15	210,90	-	0,00%	70,30	140,60	
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	51%	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58	-	0,00%	560,50	538,08	
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	50%	cj	4,00	25,45	31,81	127,24	-	0,00%	63,62	63,62	
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 3S A140 A - 2NA+2NF	50%	un	2,00	545,33	807,91	1.615,82	-	0,00%	807,91	807,91	
								6.837,84				R\$ 3.244,96	
32	41	ILUMINAÇÃO											
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	0%	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69	-	0,00%	-	1.521,69	
32.2	41.10.430	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	0%	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,98	-	0,00%	-	4.834,98	
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 116 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	0%	un	8,00	1.092,71	1.365,88	10.927,04	-	0,00%	-	10.927,04	
32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANS., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	0%	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05	-	0,00%	-	7.874,05	
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1069 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	0%	un	68,00	128,42	160,52	10.915,36	-	0,00%	-	10.915,36	
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSLD., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	0%	un	60,00	214,05	267,56	16.053,60	-	0,00%	-	16.053,60	
								52.126,72				R\$ 52.126,72	
33	43	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.											
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500 W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	0%	un	5,00	362,60	453,12	2.265,80	-	0,00%	-	2.265,80	
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	0%	un	2,00	182,07	227,58	455,16	-	0,00%	-	455,16	
33.3	43.06.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H	0%	un	1,00	359,17	448,96	448,96	-	0,00%	-	448,96	
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	100%	cj	3,00	6.159,05	7.698,61	23.096,43	1,00	7.698,61	33,33%	23.096,43	-
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	100%	cj	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10	-	0,00%	13.078,10	-	
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	100%	cj	12,00	2.718,73	3.308,41	40.780,92	1,00	3.398,41	8,33%	40.780,92	-
								80.125,17				R\$ 3.169,72	
34	44	APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS											
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	0%	un	5,00	219,62	274,77	1.373,85	-	0,00%	-	1.373,85	
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	0%	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08	-	0,00%	-	2.164,08	
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	0%	un	6,00	99,71	124,63	747,78	-	0,00%	-	747,78	
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	0%	un	3,00	606,20	757,75	2.273,25	-	0,00%	-	2.273,25	
34.5	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	0%	m²	13,92	590,74	736,42	10.278,80	-	0,00%	-	10.278,80	
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 306 / 600 M, COM VISOR	0%	un	10,00	89,91	87,38	873,80	-	0,00%	-	873,80	

34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	0%	un	16,00	56,21	70,26	1.124,16			0,00%	-		1.124,16	
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	0%	un	4,00	34,59	43,23	172,92			0,00%	-		172,92	
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	0%	un	6,00	159,82	199,77	1.198,62			0,00%	-		1.198,62	
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OJ 3/4"	0%	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21			0,00%	-		1.874,21	
34.11	44.06.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	0%	un	6,00	201,68	252,10	1.512,60			0,00%	-		1.512,60	
													R\$	23.594,07	
35	46	TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.													
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	180,00	22,26	27,82	5.007,60			0,00%	4.006,08		1.001,52	
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50			0,00%	6.018,00		1.504,50	
35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	12,00	26,52	33,15	397,80			0,00%	318,24		79,56	
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80			0,00%	2.041,44		510,36	
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20			0,00%	6.346,56		1.586,64	
35.6	46.08.006	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	6,00	88,85	111,06	666,36			0,00%	533,09		133,27	
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	38,00	69,27	124,08	4.468,88			0,00%	3.573,50		893,38	
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	120,00	56,56	70,70	8.484,00			0,00%	6.787,20		1.696,80	
													R\$	7.406,03	
36	47	VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES													
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	0%	un	4,00	108,87	133,58	534,32			0,00%	-		534,32	
36.2	47.01.210	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	0%	un	4,00	190,80	238,50	954,00			0,00%	-		954,00	
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	38%	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56			0,00%	600,96		1.001,60	
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	0%	un	6,00	76,81	95,76	574,56			0,00%	-		574,56	
													R\$	3.064,48	
37	48	RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES													
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	33%	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56	1,00	3.116,52	33,33%	3.116,52		6.233,04	
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	0%	un	3,00	95,12	118,90	356,70			0,00%	-		356,70	
													R\$	6.589,74	
38	49	CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO													
38.1	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	65%	un	26,00	82,53	103,16	2.682,16			0,00%	1.753,72		928,44	
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	90%	un	20,00	229,17	286,46	5.729,20			0,00%	5.156,28		572,92	
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	0%	un	2,00	354,29	442,86	885,72			0,00%	-		885,72	
38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	0%	un	10,00	12,94	16,17	161,70			0,00%	-		161,70	
													R\$	2.548,78	
39	54	PAVIMENTACAO E PASSEIO													
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	22%	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35			0,00%	438,63		1.528,72	
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	7%	m²	76,65	174,79	218,48	16.748,49			0,00%	1.244,57		15.501,92	
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	0%	m²	511,00	19,35	24,18	12.366,98			0,00%	-		12.366,98	

39.4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJ E EM AREIA	0%	m²	511,00	83,50	104,37	59.333,07
								84.402,89
TOTAL								2.326.081,38

		0,00%		53.333,07
			R\$	82.719,69

TOTAL GERAL 14ª MEDIÇÃO				181.638,92
% MEDIDO				7,81%
ACUMULADO				1.640.995,21
SALDO REMANESCENTE			R\$	685.086,16

Monteiro Lobato, 09 de janeiro de 2025



Luis Gustavo de Barros
Responsável Técnico
CREA 5062695430



RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Engenheiro Civil - Crec: 5070225050
Secretário de Obras

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATOPÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

833 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 327	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	230852/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2025
------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	14.563.488/0001-70	CÓDIGO: 10786
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES	GUARATINGUETA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido 172.556,97 Desconto 9.081,95
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
00 Recursos Ordinarios		
802 TRANSF. UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND		
001 PLANO AÇÃO 09032024-075342/24 SAULO PEDR		

GL	SOMA	181.638,92
----	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1029.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES EXECUÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CENTRO SAUDE DR. JOAO AURICCHIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
774.381,35	181.638,92	181.638,92	592.742,43

VALOR A SER PAGO R\$	181.638,92
cento e oitenta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos *****	

DESCONTOS		
8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	9.081,95	
TOTAL DE DESCONTOS		9.081,95

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/03/2025 

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____ Carolina de Sousa Silva - Secretária de Finanças

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____ Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora	DATA _____ Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.

DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
					RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00967

DATA: 14/03/2025 VENCI 17/03/2025 PAGTO: 14/03/2025

Credor...: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade...: GUARATINGUETA CEP:

Discriminação...:

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **181.638,92**

(cento e oitenta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 181.638,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
833	/ 1	GL 010401	10.301.0012.1029.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 181.638,92	RR\$ 0,00	RR\$ 9.081,95	RR\$ 172.556,97
TOTAL					RR\$ 181.638,92	RR\$ 0,00	RR\$ 9.081,95	RR\$ 172.556,97

Despesa Líquida: **RR\$ 172.556,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	48682		RR\$ 172.556,97
TOTAL			RR\$ 172.556,97

Despesa paga em 14/03/2025 Com os recursos acima discriminados

CAROLINA DE SOUSA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.24
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.868-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA,AV JOAO PESSOA
CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70
VALOR: R\$ 172.556,97
DEBITO EM: 14/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: E.58B.2F6.E50.65F.CE2

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 598			
			Data e Hora de Emissão 30/04/2025 11:25:50			
			Código de Verificação * TJ3P-L1CJ			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000 Município: MONTEIRO LOBATO UF: SP E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/04/2025, EM MONTEIRO LOBATO - SP						
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 15ª Medição Período:08/03/2025 a 10/04/2025 Valor: R\$ 33.277,76 Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114.inciso II. da IN RFB nº 2.110/2022. 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1						
Valor do Serviço R\$ 33.277,76		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 33.277,76	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 1.663,89
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.277,76						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 31.613,87						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.


RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Prestador de Serviço Civil - CREA: 5070225050
Secretário de Obras



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DE OBRAS

MEMORANDO SEC.OBRAS 25076/2025

A/C: Secretaria de Finanças

De: Secretaria de Obras

Ref.: 15º Medição - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

Prezada;

A Secretaria Obras do município de Monteiro Lobato -SP, vem através deste, solicitar o pagamento da 15º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido Processo N° 230852/2023, Tomada de Preço N°008/2023. No valor de **R\$90.102,32** referente a Nota Fiscal n°597-E e no valor de **R\$33.277,76** referente a Nota Fiscal n°598-E. Com o valor total da 15º Medição de **R\$123.380,08**.

Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 5 de maio de 2025.



RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Eng. Civil - CREA SP 5070225050
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 - I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		
					S/ BDI	C/BDI			
1 01 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO									
1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	100%	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15	
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	100%	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72	
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	100%	un	6,00	2.114,85	2.043,56	15.861,36	
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	100%	un	10,00	1.551,02	1.936,77	19.387,70	
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	100%	un	12,00	665,66	832,32	9.987,84	
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	100%	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38	
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDADE	100%	tx	1,00	942,15	1.177,68	1.177,68	
1.8	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	100%	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70	
								72.378,63	
2 02 INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	100%	un.mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82	
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	100%	un.mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10	
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	78%	un.mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65	
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	100%	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80	
2.5	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	100%	m.mês	40,50	19,29	24,11	976,46	
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	100%	m²	6,00	678,00	847,50	5.085,00	
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	100%	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20	
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	100%	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,96	
								45.869,99	
3 06 SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL									
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1º/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	100%	m³	10,00	39,47	49,33	493,30	
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	100%	m³	10,00	12,27	15,33	153,30	
								646,60	
4 08 ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM									
4.1	08.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m³.mês	1.566,00	5,86	7,32	11.463,12	
4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m³	783,00	10,01	12,51	9.795,33	
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	100%	m³	16,20	102,53	128,16	2.076,19	

15ª MEDIÇÃO - 10/04/2025				
QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	ACUMULADO MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
	-	0,00%	5.254,15	-
	-	0,00%	6.710,72	-
	-	0,00%	15.861,36	-
	-	0,00%	19.387,70	-
	-	0,00%	9.987,84	-
	-	0,00%	5.545,38	-
	-	0,00%	1.177,68	-
	-	0,00%	8.453,70	-
	-			R\$ -
	-	0,00%	7.055,82	0,00
	-	0,00%	10.385,10	-
1,00	719,85	11,11%	5.038,95	1.439,70
	-	0,00%	7.704,80	-
	-	0,00%	976,46	-
	-	0,00%	5.085,00	-
	-	0,00%	1.734,20	-
	-	0,00%	6.449,96	-
	719,85			R\$ 1.439,70
	-	0,00%	493,30	0,00
	-	0,00%	153,30	-
				R\$ 0,00
	-	0,00%	11.463,12	0,00
	-	0,00%	9.795,33	-
	-	0,00%	2.076,19	0,00

Handwritten signature

4.4	08.05.180	MANTA GECTEXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	100%	m²	81,00	12,93	16,16	1.308,96	-	0,00%	1.308,96	-	
4.5	08.06.040	BARBACÁ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	100%	m	10,00	21,02	26,27	262,70	-	0,00%	262,70	-	
											R\$	0,00	
5 09 FORMA													
5.1	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	100%	m²	480,74	141,41	176,76	84.975,60	-	0,00%	84.975,60	0,00	
											R\$	0,00	
6 10 ARMADURA E CORDALHA ESTRUTURAL													
6.1	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	100%	kg	13.824,00	9,34	11,67	161.326,08	-	0,00%	161.326,08	-	
6.2	10.01.080	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	100%	kg	2.073,60	11,02	13,77	28.553,47	-	0,00%	28.553,47	-	
6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	100%	kg	5.016,00	12,07	15,08	75.641,28	-	0,00%	75.641,28	-	
											R\$	-	
7 11 CONCRETO, MASSA E LASTRO													
7.1	11.01.280	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBAMENTO	100%	m³	62,70	374,13	467,68	29.322,28	-	0,00%	29.322,28	-	
7.2	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBAMENTO	100%	m³	138,24	388,49	485,61	67.130,73	-	0,00%	67.130,73	-	
7.3	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB.	100%	m²	200,94	80,77	100,96	20.286,90	-	0,00%	20.286,90	-	
7.4	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	100%	m²	39,19	125,27	156,58	6.136,37	-	0,00%	6.136,37	-	
											R\$	-	
8 12 FUNDAÇÃO PROFUNDA													
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	100%	tx	1,00	1.515,51	1.894,38	1.894,38	-	0,00%	1.894,38	-	
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	100%	m	450,00	54,03	67,53	30.388,50	-	0,00%	30.388,50	-	
											R\$	-	
9 13 LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS													
9.1	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (18+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	100%	m²	355,52	152,65	190,81	67.836,77	-	0,00%	67.836,77	-	
9.2	13.01.190	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	100%	m²	476,21	167,30	209,12	99.585,04	-	0,00%	99.585,04	-	
											R\$	-	
10 14 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR													
10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B	100%	m³	800,50	66,27	82,83	66.305,41	-	0,00%	66.305,42	-	
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B	100%	m³	812,00	80,93	101,16	82.141,92	-	0,00%	82.141,92	-	
10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	50%	m²	21,42	485,87	607,33	13.009,00	-	0,00%	6.504,50	6.504,50	
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	50%	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,63	-	0,00%	5.017,32	5.017,31	
											R\$	11.521,81	
11 15 ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO													
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,91 A 18,00 M	100%	m²	355,52	103,81	129,76	46.132,27	-	0,00%	46.132,27	-	
											R\$	-	
12 16 TELHAMENTO													
12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	100%	m²	460,00	46,86	58,57	26.942,20	460,00	26.942,20	100,00%	26.942,20	-
12.2	16.30.020	DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	0%	m²	17,50	587,08	733,85	12.842,37	-	0,00%	-	12.842,37	
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	0%	m²	36,90	243,57	304,46	11.234,57	-	0,00%	-	11.234,57	
12.4	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	100%	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09	112,22	15.392,10	100,00%	15.392,10	0,01

Handwritten signature or mark.

								66.411,23
13	17	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL						
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	0%	m²	2,50	943,04	1.178,80	2.947,00
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	100%	m²	18,40	508,35	635,43	11.691,91
13.3	17.02.020	CHAPIÇO	100%	m²	3.225,00	4,90	6,12	19.737,00
13.4	17.02.120	EMBOÇO COMUM	100%	m²	3.225,00	15,52	10,40	62.585,00
13.5	17.02.220	REBOCO	100%	m²	2.288,62	8,76	10,95	25.080,38
								122.001,29
14	18	REVESTIMENTO CERÂMICO						
14.1	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	90%	m²	537,86	117,77	147,21	79.178,37
14.2	18.06.162	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-6 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	70%	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	90%	m²	74,20	143,31	170,13	13.291,44
14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	90%	m²	936,38	55,06	68,62	64.441,67
								158.645,82
15	19	REVESTIMENTO EM PEDRA						
15.1	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	90%	m	146,10	118,12	147,65	21.571,68
								21.571,68
16	21	REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO						
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	30%	m²	153,03	178,62	223,27	34.167,00
16.2	21.10.061	RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	30%	m	143,15	27,58	34,47	4.934,38
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM	0%	m	34,50	19,15	23,93	825,58
								39.926,96
17	22	FORRO, BRISE E FACHADA						
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	10%	m²	718,00	68,94	86,17	61.870,06
								81.870,06
18	23	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA						
18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM	83%	un	6,00	1.230,19	1.545,23	9.271,38
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	83%	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	71%	un	17,00	1.399,77	1.748,71	29.745,07
18.4	23.08.030	FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	70%	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	60%	m²	0,90	133,79	167,23	150,50
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	60%	m²	3,78	390,60	488,25	1.845,58
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	75%	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00

			42.334,30	R\$ 24.076,93	
					2.947,00
		0,00%	-	-	0,00
2,76	1.753,79	15,00%	11.691,91	-	36,05
161,25	986,85	5,00%	19.700,95	-	0,00
		0,00%	62.565,00	-	74,95
228,86	2.506,04	10,00%	25.135,33	-	R\$ 2.908,10
	5.246,68				
107,57	15.835,67	20,00%	71.260,24		7.918,13
60,01	346,87	20,00%	1.214,04		520,30
14,84	2.658,29	20,00%	11.962,30		1.329,14
187,28	12.888,33	20,00%	58.038,38		6.403,29
	31.729,17				R\$ 16.170,85
8,77	1.294,30	6,00%	19.462,63		2.109,03
	1.294,30				R\$ 2.109,03
		0,00%	10.250,10		23.916,90
		0,00%	1.480,31		3.454,07
		0,00%	-		825,58
					R\$ 28.196,54
		0,00%	6.204,24		55.665,82
					R\$ 55.665,82
1,00	1.545,23	16,67%	7.726,15		1.545,23
1,00	1.733,41	16,67%	8.667,05		1.733,41
2,00	3.499,42	11,76%	20.996,52		8.748,55
3,00	501,69	10,00%	3.511,83		1.505,07
		0,00%	90,30		60,20
		0,00%	1.107,35		738,23
		0,00%	2.785,50		928,50

M

18.8	23.09.580	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	83%	un	6,00	773,84	967,30	5.803,80
18.9	23.09.590	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 160 X 210 CM	75%	un	12,00	1.019,96	1.274,95	15.299,40
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	71%	un	16,90	44,29	55,36	935,58
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	72%	m	16,90	6,82	8,52	143,88
82.326,65								
19	24	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO						
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	100%	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47
19.2	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	0%	m²	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95
27.668,42								
20	25	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO						
20.1	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	29%	m²	41,10	666,45	833,06	34.238,76
20.2	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	78%	m²	29,55	708,32	862,90	26.089,69
20.3	25.01.090	CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	75%	m²	4,10	549,15	666,43	2.814,36
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	80%	m²	19,11	870,40	1.088,00	20.791,68
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	80%	m²	16,80	596,98	746,20	12.536,16
96.470,55								
21	26	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO						
21.1	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM	0%	m²	1,50	420,84	526,05	789,07
21.2	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	0%	m²	3,00	529,47	661,83	1.985,49
2.774,56								
22	27	ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL						
22.1	27.04.070	BATE-MAÇA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	0%	m	126,00	124,82	156,02	19.658,52
19.658,52								
23	28	FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS						
23.1	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG	0%	un	4,00	248,27	307,83	1.231,32
1.231,32								
24	30	ACESSIBILIDADE						
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	86%	m	7,00	149,33	186,66	1.306,62
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	86%	un	7,00	95,90	119,87	839,09
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	79%	un	14,00	125,90	157,37	2.203,18
24.4	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	86%	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL - COLADO	67%	m²	11,50	150,96	188,70	2.170,05
24.6	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	64%	m	14,00	389,47	486,83	6.815,62
24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	0%	un	2,00	170,78	213,47	426,94
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	80%	un	5,00	766,33	957,91	4.789,55
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	80%	un	5,00	1.192,55	1.490,68	7.453,40
24.10	30.08.080	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	80%	un	5,00	848,78	1.060,97	5.304,85
33.781,21								
25	32	IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA						

1,00	967,30	16,67%	4.836,50	967,30
2,00	2.549,90	16,67%	11.474,55	3.824,85
2,00	110,72	11,83%	664,32	271,26
2,00	17,04	11,83%	103,43	40,55
	10.924,71			R\$ 20.363,14
	-	0,00%	26.314,47	-
	-	0,00%	-	1.343,95
	-			R\$ 1.343,95
	-	0,00%	9.852,08	24.386,68
	-	0,00%	20.306,70	5.782,99
1,03	703,59	25,00%	2.110,77	703,59
3,82	4.158,34	20,00%	16.637,70	4.153,98
3,36	2.507,23	20,00%	10.028,93	2.507,23
	7.369,16			R\$ 37.534,47
	-	0,00%	-	789,07
	-	0,00%	-	1.985,49
	-			R\$ 2.774,56
	-	0,00%	-	19.658,52
	-			R\$ 19.658,52
	-	0,00%	-	1.231,32
	-			R\$ 1.231,32
2,00	373,32	28,57%	1.119,96	186,66
2,00	739,74	28,57%	719,22	119,87
4,00	629,48	28,57%	1.731,07	472,11
2,00	706,26	28,57%	2.118,78	353,13
2,00	377,40	17,39%	1.462,43	707,63
2,00	973,66	14,29%	4.381,47	2.434,15
	-	0,00%	-	426,94
1,00	957,91	20,00%	3.831,64	957,91
1,00	1.490,68	20,00%	5.962,72	1.490,68
1,00	1.060,97	20,00%	4.243,88	1.060,97
	6.809,42			R\$ 8.210,05

Handwritten signature or mark.

25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	100%	m²	113,30	83,64	79,55	9.013,01	-	0,00%	9.013,02	-	0,00
25.2	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	100%	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,48	-	0,00%	2.012,46	-	0,00
									-		-R\$	0,01	
									11.025,47				
26	33	PINTURA								0,00%	-		21.315,47
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	0%	m²	1.462,97	11,66	14,57	21.315,47		0,00%	-		54.458,63
26.2	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIFORMO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	1.989,72	21,90	27,37	27.992,09		0,00%	-		27.992,09
26.3	33.10.060	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	279,20	80,21	100,26	2.624,21		0,00%	-		2.624,21
26.4	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	64,62	32,49	40,61	106.390,40		0,00%	-		R\$ 106.390,40
									106.390,40				
27	34	PAISAGISMO E FECHAMENTOS								0,00%	-		850,98
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	0%	m³	4,55	149,83	187,03	850,98		0,00%	-		68,88
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	0%	m²	42,28	1,31	1,83	68,88		0,00%	-		934,32
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	0%	m²	68,70	10,88	13,60	934,32		0,00%	-		1.354,32
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALÉA - H= 0,80 A 0,80 M	0%	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32		0,00%	-		553,65
27.5	34.03.120	ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M	0%	un	15,00	29,53	38,91	553,65		0,00%	-		74,86
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,80 A 0,80 M	0%	un	2,00	29,95	37,43	74,86		0,00%	-		222,76
27.7	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	0%	un	2,00	89,11	111,38	222,76		0,00%	-		680,55
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	13,00	41,88	52,35	680,55		0,00%	-		26.613,60
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 85 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	0%	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60		0,00%	-		R\$ 31.353,92
									31.353,92				
28	37	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA								0,00%	625,30	-	-
28.1	37.01.160	QUADRO TELEGRÁFS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	100%	un	1,00	500,24	625,30	625,30		0,00%	625,30	-	-
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON-225 A - SEM COMPONENTES	100%	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.055,68		0,00%	5.055,68	-	-
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	100%	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50		0,00%	1.172,50	-	-
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	100%	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92		0,00%	2.875,92	-	-
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 80 A ATÉ 100 A	100%	un	6,00	129,47	181,83	1.294,64		0,00%	1.294,64	-	-
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	100%	un	24,00	129,52	181,90	3.885,80		0,00%	3.885,60	-	0,00
28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 80 A ATÉ 100 A	100%	un	6,00	148,26	185,35	1.112,10		0,00%	1.112,10	-	-
28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS	100%	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84		0,00%	8.719,84	-	-
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	100%	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60		0,00%	4.541,60	-	-
28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	100%	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20		0,00%	2.800,20	-	-
									32.083,38			-R\$	0,00
29	38	TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA								0,00%	15.356,60		0,00
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	100%	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60		0,00%	15.356,60		0,00
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	100%	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40		0,00%	3.209,40		0,00
									18.566,00			R\$	0,00
30	39	CONDUTOR E ENFIAÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA								0,00%	12.503,47		4.758,53
30.1	39.02.010	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	72%	m	4.200,00	3,29	4,11	17.282,00		0,00%	12.503,47		4.758,53
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	65%	m	860,00	5,05	6,31	4.164,80	396,00	2.498,76	60,00%	2.718,92	1.445,68
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	93%	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00		0,00%	2.989,59		237,42
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	65%	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00	30,00	418,50	15,00%	1.813,50	976,50
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	0%	m	10,00	28,39	35,48	354,80		0,00%	-		354,80

Handwritten signature or mark.

30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	0%	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,8/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	76%	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,8/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	72%	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,8/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	60%	m	120,00	28,88	37,10	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,8/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	60%	m	180,00	40,43	50,53	9.065,40
								80.884,50
31	40	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA						
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF. 400X400X150 MM	67%	un	6,00	135,72	169,85	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	67%	cj	6,00	22,60	28,25	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	50%	cj	90,00	18,30	22,87	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	50%	cj	20,00	21,59	26,98	539,80
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	33%	cj	8,00	28,12	35,15	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	51%	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	50%	cj	4,00	25,45	31,81	127,24
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA-2NF	50%	un	2,00	646,33	807,91	1.615,82
								6.837,84
32	41	ILUMINAÇÃO						
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	0%	un	3,00	405,79	507,23	1.521,89
32.2	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M	0%	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	0%	un	8,00	1.092,71	1.385,88	10.927,04
32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOM COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	0%	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	0%	un	88,00	128,42	160,52	10.915,36
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	0%	un	60,00	214,05	267,56	16.053,60
								62.126,72
33	43	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GAS.						
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	0%	un	5,00	362,50	453,12	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	0%	un	2,00	182,07	227,56	455,16
33.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H	0%	un	1,00	359,17	448,96	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETTE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	100%	cj	3,00	6.159,05	7.698,81	23.096,43
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETTE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	100%	cj	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	100%	cj	12,00	2.718,73	3.398,41	40.780,92
								80.126,17
34	44	APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS						
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 8 LITROS	40%	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	25%	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	33%	un	6,00	99,71	124,63	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	33%	un	3,00	606,20	757,75	2.273,25
34.5	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	50%	m²	13,82	590,74	738,42	10.278,80
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	0%	un	10,00	69,91	87,38	873,80

	-	0,00%	-	1.532,00
36,00	632,88	15,00%	3.218,37	1.000,83
	-	0,00%	2.734,07	1.053,43
54,00	2.003,40	45,00%	2.667,12	1.784,88
18,00	909,54	10,00%	5.457,24	3.638,16
	6.463,08			R\$ 16.782,22
	-	0,00%	678,60	339,30
	-	0,00%	113,00	56,50
	-	0,00%	1.029,15	1.029,15
	-	0,00%	269,80	269,80
	-	0,00%	70,30	140,60
	-	0,00%	560,50	538,08
	-	0,00%	63,62	63,62
	-	0,00%	807,91	807,91
	-			R\$ 3.244,96
	-	0,00%	-	1.521,89
	-	0,00%	-	4.834,98
	-	0,00%	-	10.927,04
	-	0,00%	-	7.874,05
	-	0,00%	-	10.915,36
	-	0,00%	-	16.053,60
	-			R\$ 52.126,72
	-	0,00%	-	2.265,60
	-	0,00%	-	455,16
	-	0,00%	-	448,96
	-	0,00%	23.096,43	0,00
	-	0,00%	13.078,10	-
	-	0,00%	40.780,92	-
	-			R\$ 3.169,72
2,00	549,54	40,00%	549,54	824,31
2,00	541,02	25,00%	541,02	1.623,06
2,00	249,26	33,33%	249,26	498,52
1,00	757,75	33,33%	757,75	1.515,50
6,96	5.139,40	50,00%	5.139,40	5.139,40
	-	0,00%	-	873,80

RP

34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	0%	un	16,00	56,21	70,26	1.124,16			0,00%	-	1.124,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	0%	un	4,00	34,59	43,23	172,92			0,00%	-	172,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	100%	un	6,00	159,82	189,77	1.198,62	6,00	1.198,62	100,00%	1.198,62	-
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	69%	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21	9,00	1.297,53	69,23%	1.297,53	576,68
34.11	44.06.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	50%	un	6,00	201,68	252,10	1.512,60	3,00	756,30	50,00%	756,30	756,30
										10.489,42		R\$ 13.104,65	
35 46 TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.													
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	180,00	22,26	27,82	5.007,80			0,00%	4.006,08	1.001,52
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50			0,00%	6.018,00	1.504,50
35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	12,00	28,52	33,15	397,80			0,00%	318,24	79,56
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80			0,00%	2.041,44	510,36
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20			0,00%	6.346,56	1.586,64
35.6	46.08.000	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	6,00	88,85	111,08	668,38			0,00%	533,09	133,27
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	36,00	99,27	124,08	4.466,88			0,00%	3.573,50	893,38
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	120,00	58,58	70,70	8.484,00			0,00%	6.787,20	1.696,80
												R\$ 7.406,03	
36 47 VALVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES													
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	0%	un	4,00	106,87	133,58	534,32			0,00%	-	534,32
36.2	47.01.210	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	0%	un	4,00	190,80	238,50	954,00			0,00%	-	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	38%	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56			0,00%	600,96	1.001,60
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	0%	un	6,00	76,81	95,76	574,56			0,00%	-	574,56
												R\$ 3.064,48	
37 48 RESERVATORIO E TANQUE PARA LÍQUIDOS E GASES													
37.1	46.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	33%	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56			0,00%	3.116,52	6.233,04
37.2	46.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	0%	un	3,00	95,12	118,90	356,70			0,00%	-	356,70
												R\$ 6.589,74	
38 49 CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO													
38.1	49.01.030	CAIXA SFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	65%	un	26,00	82,53	103,18	2.682,16			0,00%	1.753,72	928,44
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	90%	un	20,00	229,17	286,48	5.729,20			0,00%	5.156,28	572,92
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	0%	un	2,00	354,29	442,88	885,72			0,00%	-	885,72
38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	0%	un	10,00	12,94	16,17	161,70			0,00%	-	161,70
												R\$ 2.548,78	
39 54 PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO													
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	22%	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35			0,00%	438,63	1.528,72
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	7%	m²	76,85	174,79	218,48	16.746,49			0,00%	1.244,57	15.501,92
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	0%	m²	511,00	19,35	24,18	12.355,98			0,00%	-	12.355,98

M

39,4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJE EM AREIA	0%	m ²	511,00	83,50	104,37	53.333,07
TOTAL								2.326.081,38

	-	0,00%	-	53.333,07
	-			R\$ 82.719,69

TOTAL GERAL 15ª MEDIÇÃO				123.380,08
-------------------------	--	--	--	------------

% MEDIDO				5,30%
----------	--	--	--	-------

ACUMULADO				1.764.375,29
-----------	--	--	--	--------------

SALDO REMANESCENTE				R\$ 561.706,08
--------------------	--	--	--	----------------

Monteiro Lobato, 10 de abril de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUIS GUSTAVO DE BARROS
 Data: 30/04/2025 13:09:56-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

 Luis Gustavo de Barros
 Responsável Técnico
 CREA 5062695430

(Handwritten Signature)
RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
 Engenheiro Civil - Crea: 5070225050
 Secretário de Obras



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO
INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024
DATA: 31/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
MANHÃ: Sem chuva Com chuva Improdutivo
TARDE: Sem chuva Com chuva Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

- 1 REATERRO DO CORREDOR EXTERNO
- 2 ALVENARIA DA CAIXA DE ESGOTO DO PRÉDIO EXISTENTE
- 3 MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DO PRÉDIO EXISTENTE
- 4 EMBOÇO COM ARGAMASSA BARITADA NO RAIOS X
- 5 EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV
- 6 EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA
- 7 FECHAMENTO DE ALVENARIA
- 8 ASSENTAMENTO DA ALVENARIA NA PLATIBANDA DO TELHADO
- 9 ASSENTAMENTO DE BLOCO NO FECHAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA
- 10 REQUADRO EXTERNO NAS JANELAS DO 1º PAV
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

PESSOAL EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÕES:

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1
		PISO ANDAIME	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADEIRA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0
TOTAL	13	TOTAL	53

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO
INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024
DATA: 03/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	FECHAMENTO DE VÃO DE PORTA COM ALVENARIA NO 1º PAV 3,36M²
2	CHAPISCO NO 2ºPAV 87,58M²
3	DEMOLIÇÃO PARA ABERTURA DE PORTA NO 1º PAV
4	ALVENARIA DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL
5	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL
6	MONTAGEM DE HIDRÁULICA ÁGUA FRIA E ESGOTO INTERNO NO 1º PAV
7	REQUADRO NO VÃO DE PORTA NO 1º PAV
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES:

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRO		ANDAIME	32
ENCARREGADO		ROMPEDOR	0
PEDREIRO		BETONEIRA	1
AJUDANTE		COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO		SERRA CIRCULAR	1
		PISO ANDAIME	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADEIRA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0
TOTAL	0	TOTAL	53

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
 CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO
INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024
DATA: 28/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REATERRO DO CORREDOR EXTERNO
2	MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DA CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL
3	MONTAGEM DAS FORMAS E CONCRETAGEM DAS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
4	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV
5	EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA
6	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA NA PLATIBANDA DO TELHADO
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES:

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	5	BETONEIRA	1
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1
		PISO ANDAIME	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADEIRA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0
TOTAL	12	TOTAL	53

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO
INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024
DATA: 26/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

- 1 ESCAVAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA RAMPA DO CORREDOR EXTERNO
- 2 PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
- 3 EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV
- 4 EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA
- 5 MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV
- 6 EMBOÇO NO 2º PAV
- 7 REQUADRO EXTERNO DAS JANELAS DO 1º PAV
- 8 EMBOÇO NA ÁREA DOS DEPÓSITO DE RESÍDUOS BIOLÓGICO E QUIMÍCOS
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

PESSOAL

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES:

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	8	BETONEIRA	1
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1
		PISO ANDAIME	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADEIRA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0
TOTAL	15	TOTAL	53

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO
INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024
DATA: 25/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
MANHÃ Sem chuva Com chuva Improdutivo
TARDE Sem chuva Com chuva Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

- 1 ESCAVAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA RAMPA DO CORREDOR EXTERNO
- 2 PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
- 3 REGULARIZAÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL
- 4 EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV
- 5 CONTRAPISO NA ÁREA DA CAIXA D'ÁGUA
- 6 EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA
- 7 MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV
- 8 EMBOÇO NO 2º PAV
- 9 REQUADRO EXTERNO DAS JANELAS DO 1º PAV
- 10 EMBOÇO NA ÁREA DOS DEPÓSITO DE RESÍDUOS BIOLÓGICO E QUIMÍCOS
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

PESSOAL**EQUIPAMENTOS****OBSERVAÇÕES:**

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	8	BETONEIRA	1
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1
		PISO ANDAIME	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADEIRA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0
TOTAL	15	TOTAL	53

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	24/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA
2	IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA
3	COLOCAÇÃO DE LONA E REATERRO
4	PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
5	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV
6	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR
7	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA
8	REGULARIZAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DA ESCADA E PLATAFORMA ELEVATÓRIA
9	CONCRETAGEM NA ÁREA DA ESCADA E PLATAFORMA ELEVATÓRIA
10	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV
11	EMBOÇO NO 2º PAV
12	REQUADRO EXTERNO DAS JANELAS DO 1º PAV
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	13	TOTAL	53	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO
INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024
DATA: 22/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

- 1 DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
- 2 REMOÇÃO DE TERRA
- 3 REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA DA ÁREA
- 4 REATERRO DO CORREDOR EXTERNO
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	1	BETONEIRA	1
AJUDANTE	1	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	0	SERRA CIRCULAR	1
		PISO ANDAIME	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADEIRA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0
TOTAL	2	TOTAL	53

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	21/03/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV
3	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR
4	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA
5	REQUADRO EXTERNO DAS JANELAS DO 1ºPAV
6	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV
7	EMBOÇO NO 2º PAV
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	5	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	11	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO
INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024
DATA: 20/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR
3	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA
4	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA /
5	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ /MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)
6	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV
7	EMBOÇO NO 2º PAV
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES:

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1
		PISO ANDAIME	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADEIRA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0
TOTAL	11	TOTAL	53

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023

TERMINO

10/08/2024

DATA:

19/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

TARDE

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR
3	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA
4	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA /
5	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ /MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)
6	EMBOÇO NO 2º PAV
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES:

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1
		PISO ANDAIME	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADEIRA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0
TOTAL	11	TOTAL	53

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023

TERMINO: 18/03/2025

DATA: 10/08/2024

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR
3	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA
4	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO 2º PAV
5	EMBOÇO NO 2º PAV
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES:

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32
ENCARRREGADO	1	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1
		PISO ANDAIME	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADORA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0
TOTAL	13	TOTAL	53



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

ENDEREÇO: 10/11/2023
TERMINO 10/08/2024

DATA: 17/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
MANHÃ Sem chuva Com chuva Improdutivo
TARDE Sem chuva Com chuva Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR
3	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA
4	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/ INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ/ MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)
5	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO 2º PAV
6	CONTRAPISO NO 1ºPAV
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL

EQUIPAMENTOS

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32
ENCARRREGADO	1	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1
		PISO ANDAIME	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADEIRA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0
TOTAL		TOTAL	53

OBSERVAÇÕES:



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

ENDEREÇO: 10/11/2023

INÍCIO: 15/03/2025

DATA: 10/08/2024

MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	CONTRAPISO NO 1º PAV
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
--------	--------	--------	--------

ANDAIMÉ 0

ROMPEDOR 1

BETONEIRA 4

COMPACTADOR 3

SERRA CIRCULAR 1

PISO ANDAIMÉ 16

SERRA MÁRMORE 1

ESMERILHADEIRA 1

FURADEIRA 1

FURADEIRA DE IMPACTO 0

TOTAL	8	TOTAL	53
-------	---	-------	----



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	14/03/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DO CABO NÚ DE COBRE DO SPDA, INSTALAÇÃO DE HASTE E REATERRO
3	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA,
4	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/ INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ/ MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)
5	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO SEGUNDO PAVIMENTO
6	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA SEGUNDA LAJE
7	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA 80,55M ²
8	EMBOÇO DO 2º PAV
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL	EQUIPAMENTOS	OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO
QUANT.	QUANT.	QUANT.
ENGENHEIRO	0	ANDAIMÉ
ENCARRREGADO	1	ROMPEDOR
PEDREIRO	8	BETONEIRA
AJUDANTE	4	COMPACTADOR
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR
		PISO ANDAIMÉ
		SERRA MÁRMORE
		ESMERILHADORA
		FURADEIRA
		FURADEIRA DE IMPACTO
TOTAL	14	TOTAL
		53



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 TERMINO: 10/08/2024

DATA: 13/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
MANHÃ Sem chuva Com chuva Improdutivo
TARDE Sem chuva Com chuva Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DO CABO NÚ DE COBRE DO SPDA, INSTALAÇÃO DE HASTE E REATERRO
3	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA,
4	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/ INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ/ MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)
5	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO 2º PAV
6	FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE AÇO DA ESTRUTURA DA PLATIBANDA
7	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA 71,51M²
8	EMBOÇO DO 2º PAV
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES:

FUNÇÃO

QUANT.

MODELO

QUANT.

ENGENHEIRO

0

ANDAIME

32

ENCARRREGADO

0

ROMPEDOR

0

PEDREIRO

9

BETONEIRA

1

AJUDANTE

4

COMPACTADOR

0

CARPINTEIRO

1

SERRA CIRCULAR

1

PISO ANDAIME

16

SERRA MÁRMORE

1

ESMERILHADEIRA

1

FURADEIRA

1

FURADEIRA DE IMPACTO

0

TOTAL

14

TOTAL

53



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

ENDEREÇO: 10/11/2023

INÍCIO: 10/08/2024

DATA: 12/03/2025

CONDICÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ Sem chuva Com chuva Improdutivo

TARDE Sem chuva Com chuva Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	EMBOÇO 58,98M ²
2	CHAPISCO 31,04M ²
3	DESFORMA DAS VIGAS DO 2º PAV
4	PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
5	REATERRO DAS VALAS DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
6	ESCAVAÇÃO E PASSAGEM DE CABO NÚ DE COBRE DO SPDA
7	MONTAGEM DO ESGOTO DO 2º PAV
8	MUDANÇAS SOLICITADAS PELO CLIENTE (CAIXAS DE TOMADAS, PAREDE, HIDRÁULICA E ESGOTO)
9	ACABAMENTO INTERNO NAS JANELAS DO 1º PAV
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES:

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	9	BETONEIRA	1
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1
ELETRICISTA	1	PISO ANDAIME	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADEIRA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0
TOTAL	16	TOTAL	53



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 TERMINO: 10/08/2024

DATA: 11/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ Sem chuva Com chuva Improdutivo
TARDE Sem chuva Com chuva Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	EMBOÇO 36,35M ²
2	CHAPISCO 29,44M ²
3	DEFORMA DAS VIGAS DO 2º PAV
4	PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
5	REATERRO DAS VALAS DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
6	ESCAVAÇÃO E PASSAGEM DE CABO NÚ DE COBRE DO SPDA
7	MONTAGEM DO ESGOTO DO 2º PAV
8	MUDANÇAS SOLICITADAS PELO CLIENTE (CAIXAS DE TOMADAS, PAREDE, HIDRÁULICA E ESGOTO)
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES:

FUNÇÃO

QUANT.

MODELO

QUANT.

ENGENHEIRO

0

ANDAIME

32

ENCARRREGADO

1

ROMPEDOR

0

PEDREIRO

8

BETONEIRA

1

AJUDANTE

4

COMPACTADOR

0

CARPINTEIRO

1

SERRA CIRCULAR

1

ELETRICISTA

1

PISO ANDAIME

16

AJUDANTE DE ELÉTRICA

1

SERRA MÁRMORE

1

ESMERILHADERA

1

FURADEIRA

1

FURADEIRA DE IMPACTO

0

TOTAL

16

TOTAL

53



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 TERMINO: 10/08/2024

DATA:

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
MANHÃ Sem chuva Com chuva Improdutivo
TARDE Sem chuva Com chuva Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	DESMONTAGEM DAS ESCORAS DO 2º PAV
2	DESMONTAGEM DAS FORMAS DO 2º PAV
3	PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
4	ESCAVAÇÃO E PASSAGEM DE CABO NU DE COBRE DO SPDA
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1
ELETRICISTA	1	PISO ANDAIME	16
AJUDANTE DE ELÉTRICA	1	SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADERA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0
TOTAL	14	TOTAL	53

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

ENDEREÇO: 10/11/2023
TERMINO 07/03/2025
10/08/2024

DATA: 10/08/2024

CONDICÕES CLIMÁTICAS
MANHÃ Sem chuva Com chuva Improdutivo
TARDE Sem chuva Com chuva Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	CHAPISCO NO 2º PAV 137,52M²
2	ESCVAÇÃO PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
3	ACABAMENTO INTERNO NAS JANELAS DO 1º PAV
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARRREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	13	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 TERMINO: 06/03/2025 DATA: 10/08/2024

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
MANHÃ Sem chuva Com chuva Improdutivo
TARDE Sem chuva Com chuva Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	CHAPISCO NO 2º PAV 132,06M²
2	ESCVAÇÃO PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
3	REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 6,28M²
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL	EQUIPAMENTOS	OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO
QUANT.	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR
PEDREIRO	6	BETONEIRA
AJUDANTE	4	COMPACTADOR
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR
	16	PISO ANDAIME
	1	SERRA MÁRMORE
	1	ESMERILHADEIRA
	1	FURADEIRA
	0	FURADEIRA DE IMPACTO
TOTAL	32	
TOTAL	12	
TOTAL	53	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO	
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO	
INÍCIO:		10/11/2023	TERMINO
DATA:		05/03/2025	
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva
		TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva
Observações:			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES			
1	CHAPISCO NO 2º PAV 92,53M²		
2	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL		
3	REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 7,06M²		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
PESSOAL		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO		QUANT.	MODELO
ENGENHEIRO	0	0	ANDAIME
ENCARRREGADO	0	0	ROMPEDOR
PEDREIRO	4	1	BETONEIRA
AJUDANTE	1	1	COMPACTADOR
CARPINTEIRO	1	1	SERRA CIRCULAR
		16	PISO ANDAIME
		1	SERRA MÁRMORE
		1	ESMERILHADEIRA
		1	FURADEIRA
		0	FURADEIRA DE IMPACTO
TOTAL	6	TOTAL	53



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 TERMINO: 10/08/2024

DATA: 04/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ Sem chuva Com chuva Improdutivo

TARDE Sem chuva Com chuva Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	CHAPISCO NO 2º PAV 90,26 M²
2	ALVENARIA DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL
3	PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
4	REATERRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
5	REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 8,33M²
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES:

FUNÇÃO

QUANT.

MODELO

QUANT.

ENGENHEIRO

0

ANDAIME

32

ENCARRREGADO

0

ROMPEDOR

0

PEDREIRO

3

BETONEIRA

1

AJUDANTE

3

COMPACTADOR

0

CARPINTEIRO

1

SERRA CIRCULAR

1

PISO ANDAIME

16

SERRA MÁRMORE

1

ESMERILHADEIRA

1

FURADEIRA

1

FURADEIRA DE IMPACTO

0

TOTAL

7

TOTAL

53



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 TERMINO: 10/08/2024

DATA: 03/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
MANHÃ Sem chuva Com chuva Improdutivo
TARDE Sem chuva Com chuva Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	FECHAMENTO DE VÃO DE PORTA COM ALVENARIA NO 1º PAV 3,36M²
2	CHAPISCO NO 2ºPAV 87,58M²
3	DEMOLIÇÃO PARA ABERTURA DE PORTA NO 1º PAV
4	ALVENARIA DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL
5	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL
6	MONTAGEM DE HIDRÁULICA ÁGUA FRIA E ESGOTO INTERNO NO 1º PAV
7	REQUADRO NO VÃO DE PORTA NO 1º PAV
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PERSONAL EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÕES:

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRO	32	ANDAIMÉ	
ENCARRREGADO	0	ROMPEDOR	
PEDREIRO	1	BETONEIRA	
AUDANTE	0	COMPACTADOR	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	
	16	PISO ANDAIMÉ	
	1	SERRA MÁRMORE	
	1	ESMERILHADEIRA	
	1	FURADEIRA	
	0	FURADEIRA DE IMPACTO	
TOTAL	0	TOTAL	53



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

ORÇAMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

ENDEREÇO: 10/11/2023

INÍCIO: 01/03/2025

DATA: 10/08/2024

MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

Observações:	SÁBADO
--------------	--------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	EMBOÇO DO 1º PAV 17,85M²
2	ALVENARIA DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL
3	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL
4	REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 7,32M²
5	REQUADRO NO VÃO DE PORTA DO 1º PAV
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL	EQUIPAMENTOS	OBSERVAÇÕES:
---------	--------------	--------------

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32
ENCARRREGADO	0	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	3	BETONEIRA	1
AJUDANTE	1	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1
		PISO ANDAIME	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHadeira	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0
TOTAL	5	TOTAL	53


Documento assinado digitalmente
 LUIS GUSTAVO DE BARROS
 Data: 30/04/2025 13:09:56-0300
 Verifique em https://validar.ti.gov.br

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
 CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL

CONTRATO: 097/2023	
RELATÓRIO Nº: 15/2023	AUTOR: Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
DATA: 10/04/2025	CREA: SP-5062695430
CONFERIDO:	Fiscal do contrato
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO	

PREFEITURA DE
MONTEIRO
LOBATO



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
 Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP



DATA: 10/04/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO	FOLHA: 2 / 8
---------------------	---	--------------

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS

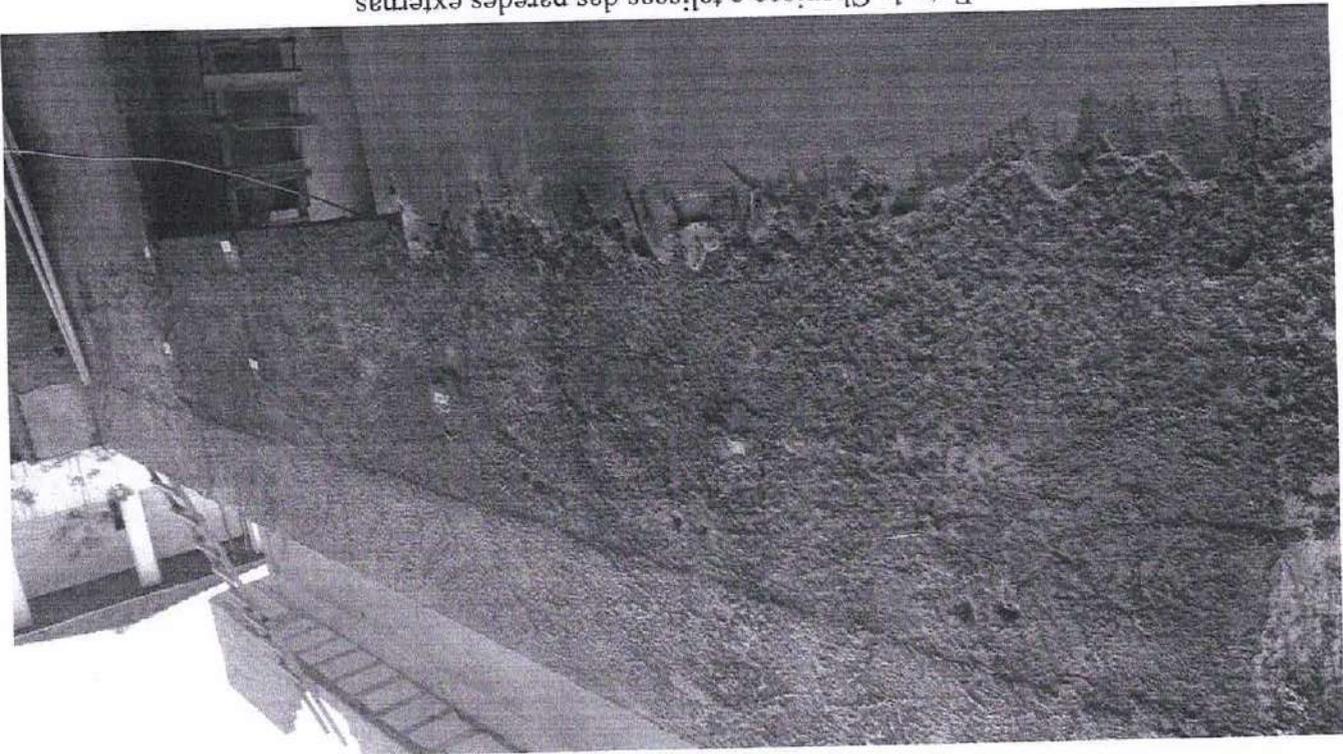


Foto 1: Chapisco e taliscas das paredes externas

Conferido: FISCAL DO CONTRATO	Autor: Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430
----------------------------------	---

Luis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Autor:

FISCAL DO CONTRATO

Conferido:

Foto 3: Assentamento de peitoril, reguadro das janelas do primeiro pavimento


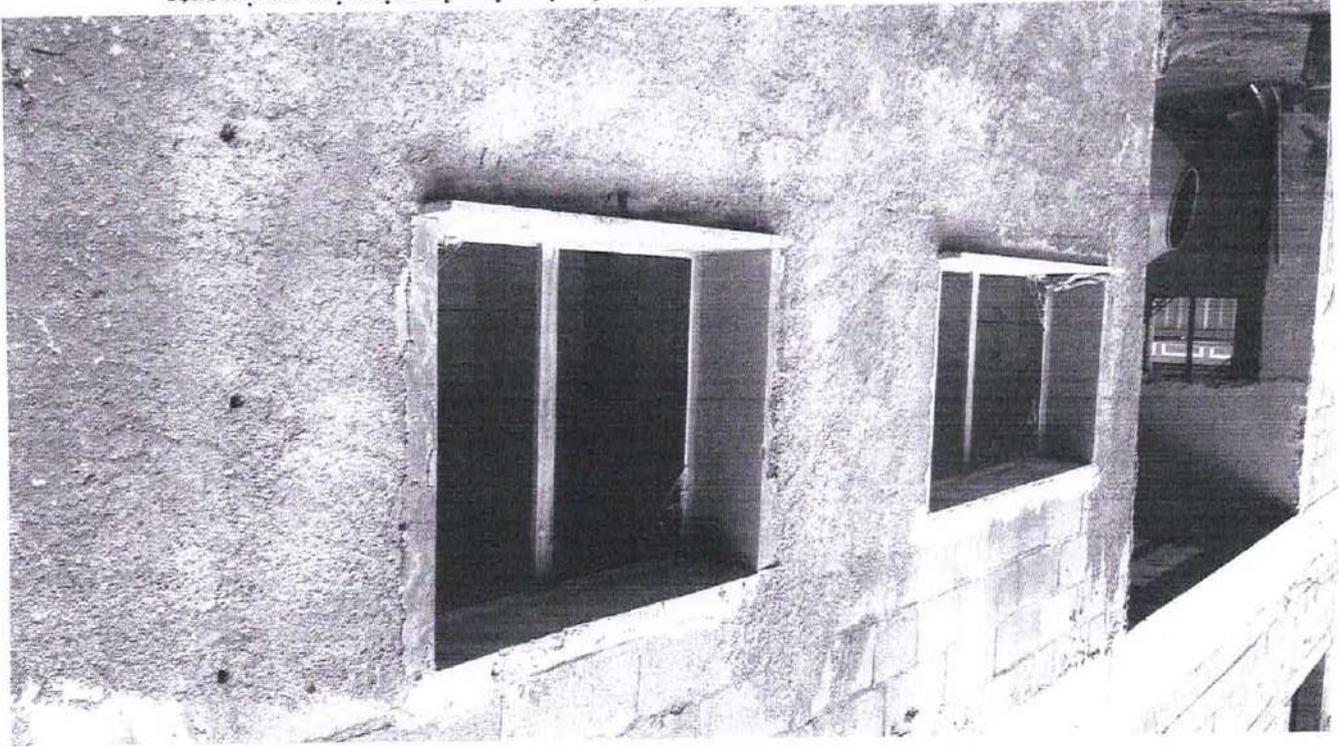


Foto 2: Reboco das paredes externas

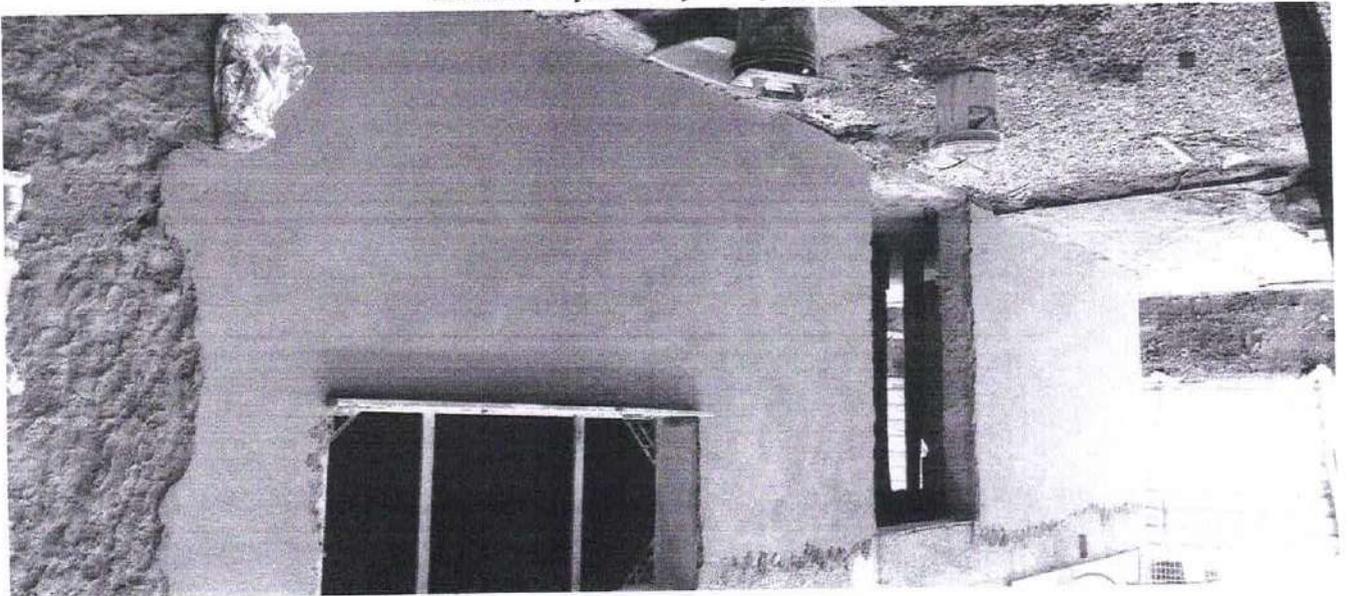

DATA:
10/04/2025

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 15ª MEDIÇÃO

FOLHA: 3 / 8

DATA:
10/04/2025

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO

FOLHA: 4 / 8



Foto 4: Contrapiso para a instalação dos pisos porcelanato



Foto 5: Assentamento de revestimento cerâmico

Autor:

Luis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conteúdo:

FISCAL DO CONTRATO

Autor:

Luis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

FISCAL DO CONTRATO

Conteúdo:

Foto 7: Bacias sanitárias, tanque e pias

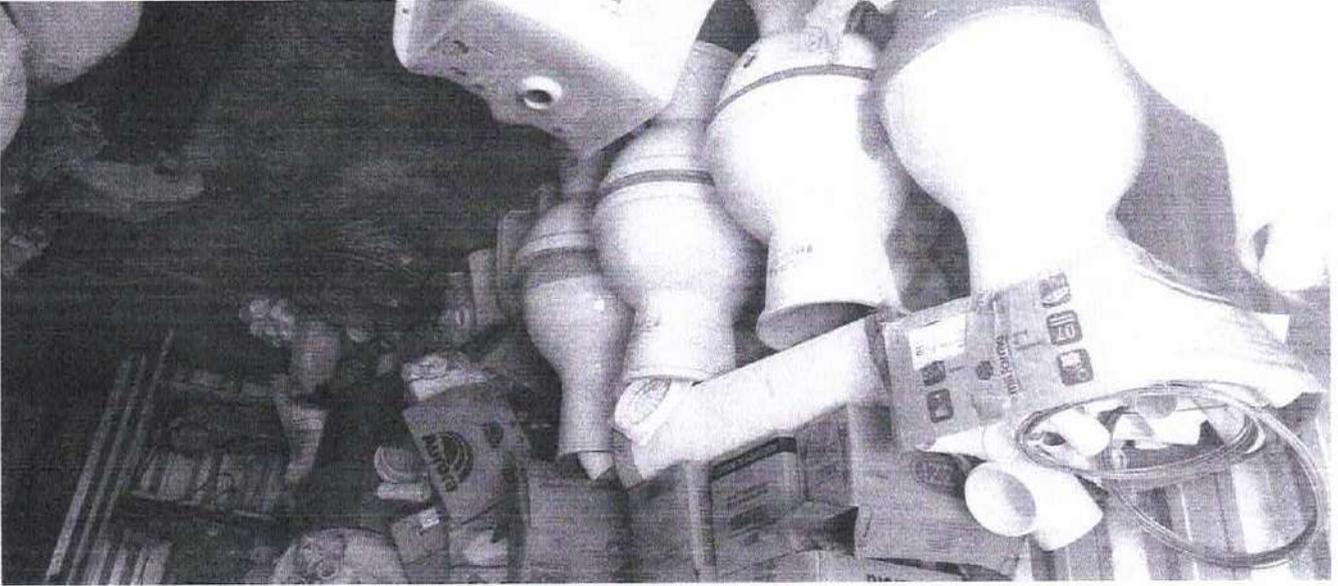


Foto 6: Pisos porcelanato



DATA:
10/04/2025

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 15ª MEDIÇÃO

FOLHA: 5 / 8

Autor:

Luis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

FISCAL DO CONTRATO

Conteúdo:

Foto 9: Instalação hidráulica e elétricas.

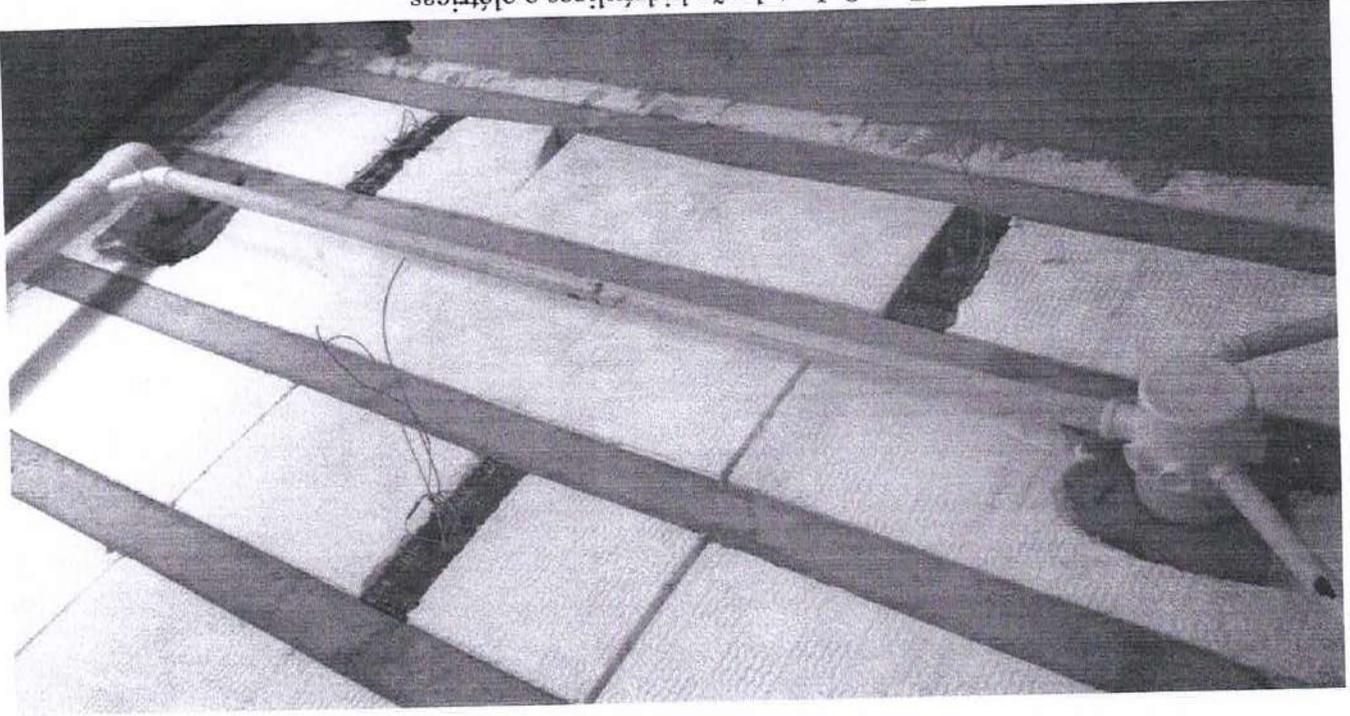


Foto 8: Instalação de quadro e disjuntores.



DATA:
10/04/2025

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 15ª MEDIÇÃO

FOLHA: 6 / 8

Autor:

Luis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

FISCAL DO CONTRATO

Conteúdo:

Foto 11: Instalação de infraestruturas hidráulicas.

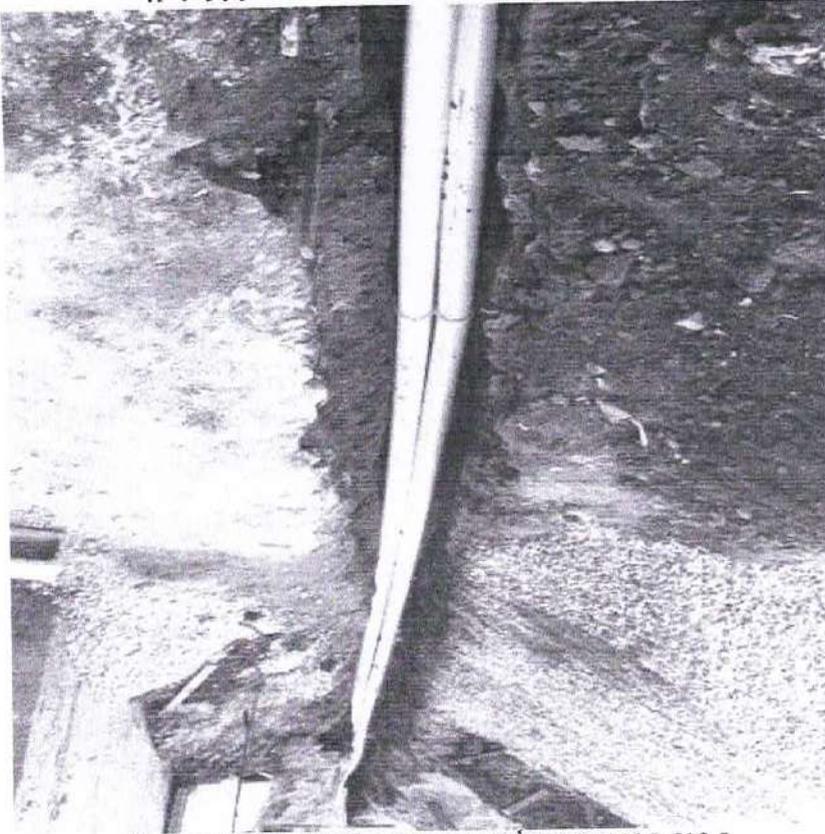


Foto 10: Instalação de infraestruturas elétricas.



DATA:
10/04/2025

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO FOTOGRAFICO - 15ª MEDIÇÃO

FOLHA: 7 / 8

DATA: 10/04/2025

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 15ª MEDIÇÃO

FOLHA: 8 / 8

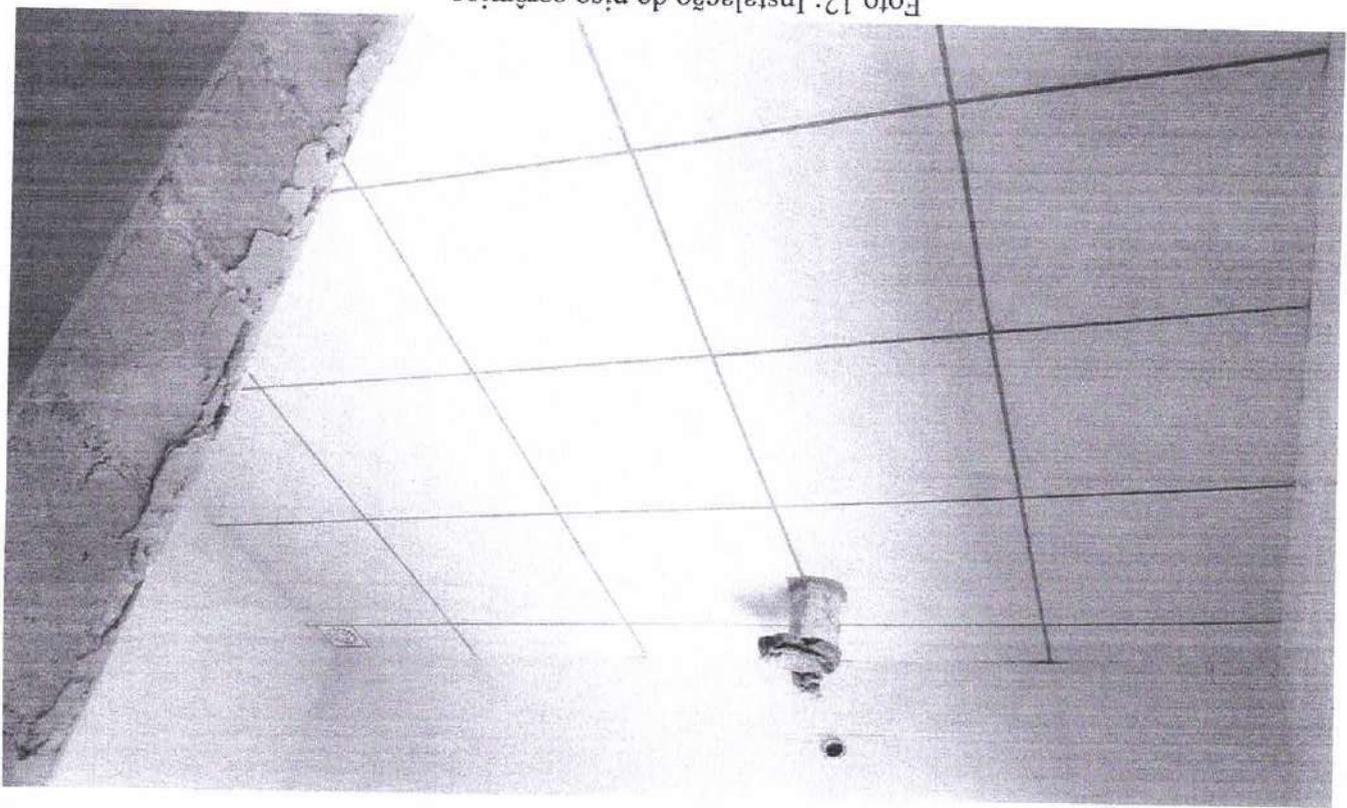


Foto 12: Instalação de piso cerâmico.

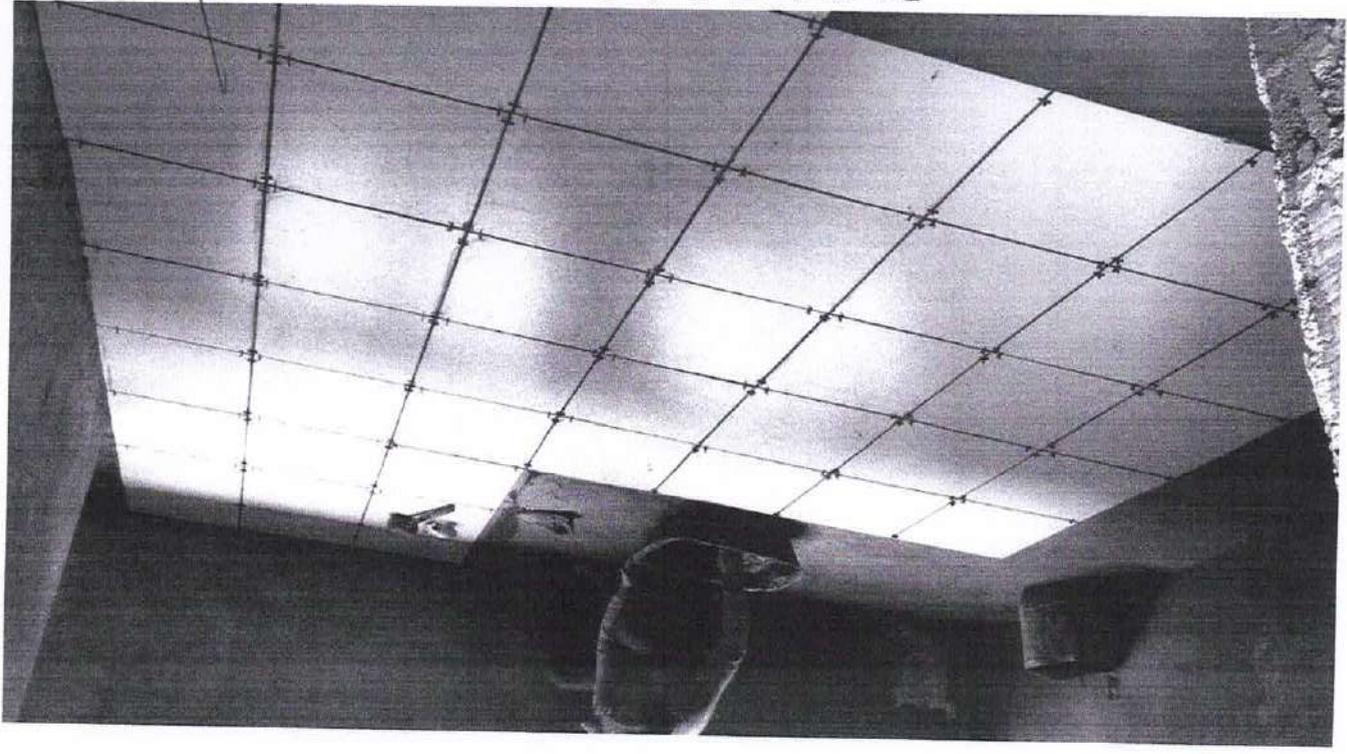


Foto 13: Instalação de piso cerâmico.

gov.br
Autor: Luis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430
Luis Gustavo de Barros
Data: 30/04/2025 13:09:56-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>
Documento assinado digitalmente

Contido:

RICARDO ALISSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Engenheiro Civil - Crea: 507022/0308
Secretaria de Obras
FISCAL DO CONTRATO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:08:48 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **C718.26BB.E418.4796**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinatura]
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2025/000004119313

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão emitida em: 10/04/2025, às 11:55:42 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **43273400F1F5161D**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.
- g) As execuções criminais constarão apenas na certidão do 1º grau.**

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão nº: 20250406/2025

Expedição: 09/04/2025, às 15:32:10

Validade: 06/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.563.488/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 339284

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 08/04/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de abril de 2025.

PEDIDO Nº:

0085572049





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 66819551

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/04/2025 15:21:49

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 66819551

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/04/2025 15:21:49

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25040949093-64
Data e hora da emissão 28/04/2025 09:32:35
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO


EMPREGADOR: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

CNPJ: 14.563.488/0001-70

CERTIDÃO EMITIDA em 10/04/2025, às 13:19:05

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 07/04/2025, **DESOBPIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **Q1NobiZAVLaOFmM**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 07/04/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 07/04/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70
Nome: ADM FABRICAÇÃO

Certidão nº 248248 / 2025

CERTIFICA-SE que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 09/04/2025, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2025/000004119221

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.**

Certidão **emitida em:** 10/04/2025, às 11:54:06 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **A13F1788B9829C1C**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Serviço de Dívida Ativa

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácara Selles – Guaratinguetá - SP - 12.505-470

Certidão Fiscal NEGATIVA de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 248/2025
Processo nº 3033//2025

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, “**C E R T I F I C A**” a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no **CNPJ 14.563.488/0001-70**, com inscrição municipal **13-5546/01/ISS**. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município no CNPJ da firma acima citada

CERTIFICA-SE ainda que “**NADA DEVE**”, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.563.488/0001-70
Razão Social: A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI
Endereço: ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2025 a 15/05/2025

Certificação Número: 2025041604121877731544

Informação obtida em 16/04/2025 08:23:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATOPÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

833 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 327 DATA: 05/05/2025 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA 230852/23 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/05/2025

NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 14.563.488/0001-70 CÓDIGO: 10786
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES GUARATINGUETA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios	PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido 31.613,87
802 TRANSF. UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND 001 PLANO AÇÃO 09032024-075342/24 SAULO PEDR.		Desconto 1.663,89

GL **SOMA** 33.277,76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1029.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES EXECUÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CENTRO SAUDE DR. JOAO AURICCHIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
774.381,35	214.916,68	33.277,76	559.464,67

VALOR A SER PAGO R\$ **33.277,76**
 trinta e três mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos *****

DESCONTOS	VALOR
8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	1.663,89
TOTAL DE DESCONTOS	1.663,89

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/05/2025 *Patricia Marcos*

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____ *Carolina de Sousa Silva - Secretária de Finanças*

EMITIDO EM _____ ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
 DATA *Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora* DATA *Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.*

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:05
673906739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.868-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	556.739.000.358.973
VALOR TOTAL	12.785,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN M LOBATO *FUNDO
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 358.973-0
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.868
=====

NR. AUTENTICACAO	3.EAF.54C.C3C.9E8.BF0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.38
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.868-2

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA,AV JOAO PESSOA
CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70
VALOR: R\$ 242.915,54
DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: A.E5B.591.B9A.307.CC2

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 604																	
			Data e Hora de Emissão 28/05/2025 13:35:59																	
			Código de Verificação * W14K-NBR1																	
			Série NE																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 -- CENTRO - CEP: 12250000 Município: MONTEIRO LOBATO UF: SP E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																				
711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																				
07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 28/05/2025, EM MONTEIRO LOBATO - SP																				
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 16ª Medição Período: 11/04/2025 a 27/05/2025 Valor: R\$ 255.700,57 Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022. 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 14.28%;"></td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Valor do Serviço R\$ 255.700,57</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Base de Cálculo R\$ 255.700,57</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Alíquota (%) 5,00</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Valor do ISS (R\$) 12.785,03</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>								Valor do Serviço R\$ 255.700,57	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 255.700,57	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 12.785,03	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
	Valor do Serviço R\$ 255.700,57	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 255.700,57	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 12.785,03														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 255.700,57																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 242.915,54																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO																				

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura de
Monteiro Lobato



MEMORANDO SEC.OBRAS 25093/2025

A/C: Secretaria de Finanças

De: Secretaria de Obras

Ref.: 16º Medição - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

A Secretária de Finanças

Prezada,

A Secretaria Obras do município de Monteiro Lobato -SP, vem através deste, solicitar o pagamento da 16º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido Processo N° 230852/2023, Tomada de Preço N°008/2023, no valor total de **R\$255.700,57** na seguinte nota fiscal, n°604-E.

Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 28 de maio de 2025.

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Eng. Civil - CREA SP 5070225050
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000

Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: gabinete@monteirolobato.sp.gov.br

www.monteirolobato.sp.gov.br



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	30/04/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	MONTAGEM DAS VIGAS DO TELHADO
2	EMBOÇO DA LAJE DA PLATIBANDA E PAREDE EXTERNA DO SEGUNDO PAVIMENTO
3	APLICAÇÃO DE MASSA BARITA NO RAI0-X
4	REMOÇÃO DE ENTULHO NA FRENTE DA OBRA
5	DESLOCAMENTO DAS VIGAS DE MADEIRA
6	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
7	APLICAÇÃO DE MASSA FAROFA NO PRIMEIRO PAVIMENTO
8	PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICO NO SEGUNDO PAVIMENTO
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA		ANDAIME	32	
ENCARREGADO	2	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	5	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	6	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	14	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	29/04/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	MONTAGEM DAS VIGAS DO TELHADO
2	EMBOÇO INTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
3	PLICAÇÃO DE MASSA BARITA NO RAI0-X
4	REMOÇÃO DE TERRA PRÓXIMO AO GERADOR
5	REMOÇÃO DE ENTULHO NA FRENTE DA OBRA
6	DESLOCAMENTO DAS VIGAS DE MADEIRA
7	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
8	CHAPISCO E ENCHIMENTO DE CONCRETO NA ALVENARIA DA PLATIBANDA
9	APLICAÇÃO DE MASSA FAROFA NO PRIMEIRO PAVIMENTO
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA		ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	6	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	14	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	28/04/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	MONTAGEM DAS VIGAS DO TELHADO
2	EMBOÇO NA LAJE DO BEIRAL NO SEGUNDO PAVIMENTO
3	LIMPEZA GERAL DO PRIMEIRO PAVIMENTO
4	REMOÇÃO DE TERRA PRÓXIMO AO GERADOR
5	ESCAVAÇÃO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NA LINHA FINAL
6	MONTAGEM DA PORTA PROVISÓRIA DO BANHEIRO
7	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE ESGOTO NA LINHA FINAL
8	FIXAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO
9	ASSENTAMENTO E CHAPISCO DE PAREDE NA DIVISÃO DOS TELHADOS
10	PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS NO PRIMEIRO PAVIMENTO
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA		ANDAIME	32	
ENCARREGADO	2	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	4	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	7	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
ELETRICISTA	1	PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	15	TOTAL	53	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	25/04/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	EMBOÇO NA LAJE DO BEIRAL NO SEGUNDO PAVIMENTO
2	LIMPEZA GERAL DO PRIMEIRO PAVIMENTO
3	REMOÇÃO DE TERRA PRÓXIMO AO GERADOR
4	ESCAVAÇÃO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NA LINHA FINAL
5	MONTAGEM DA PORTA PROVISÓRIA DO BANHEIRO
6	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE ESGOTO NA LINHA FINAL
7	FIXAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO
8	ASSENTAMENTO E CHAPISCO DE PAREDE NA DIVISÃO DOS TELHADOS
9	PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS NO PRIMEIRO PAVIMENTO
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA		ANDAIME	32	
ENCARREGADO	2	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	4	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	7	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
ELETRICISTA	1	PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	15	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	24/04/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA		ANDAIME	32	
ENCARREGADO		ROMPEDOR	0	
PEDREIRO		BETONEIRA	1	
AJUDANTE		COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO		SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	0	TOTAL	53	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	23/04/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA		ANDAIME	32	
ENCARREGADO		ROMPEDOR	0	
PEDREIRO		BETONEIRA	1	
AJUDANTE		COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO		SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	0	TOTAL	53	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	22/04/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA		ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
ELETRECISTA	1	PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	14	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	17/04/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PASSAGEM DE CORRUGADO
2	INSTALAÇÃO DAS CAUXAS DE PASSAGEM DE ELÉTRICA
3	REATERRO DA VALETA
4	ASSENTAMENTO DAS SAIAS PARA ACABAMENTO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
5	EMBOÇO DA LAJE DO BEIRAL EXTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
6	FECHAMENTO DE FORMA DOS DEGRAUS DA ESCADA
7	INÍCIO NO AVANÇO DO TAPUME
8	LIGAÇÃO DA ÁGUA FRIA PARA ALIMENTAÇÃO DE TODO PRÉDIO
9	FECHAMENTO DE AMBIENTE PARA GUARDAR MATERIAL
10	APLICAÇÃO DE REJUNTE NO BANHEIRO PARA USO DA EQUIPE
11	REMOÇÃO DE ENTULHO RERIRADO DO SEGUNDO PAVIMENTO
12	MASSA PARA O PEDREIRO DO SEGUNDO PAVIMENTO
13	PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS NO PRIMEIRO PAVIMENTO
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO		ANDAIME	32	
ENCARREGADO	2	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
ELETRICISTA	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	13	TOTAL	53	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	16/04/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
2	PASSAGEM DE CORRUGADO
3	REATERRO DA VALETA
4	ASSENTAMENTO DE PISO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
5	EMBOÇO EXTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
6	AMARRAÇÃO E DOBRA DA FERRAGEM DA ESCADA
7	PASSAGEM E FIXAÇÃO DE CONDUÍTES E CAIXA DE LUZ NO SEGUNDO PAVIMENTO
8	REMOÇÃO DE ENTULHO RERIRADO DO SEGUNDO PAVIMENTO
9	MASSA PARA O PEDREIRO DO SEGUNDO PAVIMENTO
10	PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS NO PRIMEIRO PAVIMENTO
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO		ANDAIME	32	
ENCARREGADO	2	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0	
ELETRICISTA	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	12	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	15/04/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REMOÇÃO DE MATERIAL
2	PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
3	ASSENTAMENTO DE PISO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
4	EMBOÇO INTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
5	AMARRAÇÃO E DOBRA DA FERRAGEM DA ESCADA
6	PASSAGEM E FIXAÇÃO DE CONDUÍTES E CAIXA DE LUZ NO SEGUNDO PAVIMENTO
7	REMOÇÃO DE ENTULHO RERIRADO DO SEGUNDO PAVIMENTO
8	MASSA PARA O PEDREIRO DO SEGUNDO PAVIMENTO
9	PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS NO PRIMEIRO PAVIMENTO
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0	
ELETRICISTA	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	11	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	14/04/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REMOÇÃO DE MATERIAL
2	ESCAVAÇÃO PARA INTERLIGAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL
3	ASSENTAMENTO DE PISO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
4	CARREGANDO PISO E ARGAMASSA PARA OS PEDREIROS
5	EMBOÇO INTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
6	AMARRAÇÃO E DOBRA DA FERRAGEM DA ESCADA
7	PASSAGEM E FIXAÇÃO DE CONDUÍTES E CAIXA DE LUZ NO SEGUNDO PAVIMENTO
8	REMOÇÃO DE ENTULHO RERIRADO DO SEGUNDO PAVIMENTO
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	5	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	2	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	9	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	11/04/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REMOÇÃO DE MATERIAL
2	ESCAVAÇÃO PARA INTERLIGAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL
3	EMBOÇO EXTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
4	EMBOÇO EXTERNO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
5	PASSAGEM E FIXAÇÃO DE CONDUÍTES E CAIXA DE LUZ NO SEGUNDO PAVIMENTO
6	MONTAGEM DA CAIXA D'ÁGUA
7	EMBOÇO NA ALVENARIA DA CAIXA D'ÁGUA
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	0	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	10	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	10/04/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REMOÇÃO DE MATERIAL
2	ESCAVAÇÃO PARA INTERLIGAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL
3	EMBOÇO INTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
4	EMBOÇO EXTERNO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
5	PASSAGEM E FIXAÇÃO DE CONDUTÍTES E CAIXA DE LUZ NO SEGUNDO PAVIMENTO
6	MONTAGEM DA CAIXA D'ÁGUA
7	EMBOÇO NA ALVENARIA DA CAIXA D'ÁGUA
8	CONCRETAGEM DO PILAR DO FECHAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	12	TOTAL	53	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	28/04/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	MONTAGEM DAS VIGAS DO TELHADO
2	EMBOÇO NA LAJE DO BEIRAL NO SEGUNDO PAVIMENTO
3	APOIO NO TELHADO E NA MASSA PARA EMBOÇO DA PAREDE DE DIVISÃO DOS TELHADOS
4	REMOÇÃO DE TERRA PRÓXIMO AO GERADOR
5	LIGAÇÃO DA LINHA DE ESGOTO DA OBRA PARA RUA
6	EMBOÇO DE PAREDE NA DIVISÃO DOS TELHADOS
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO		ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	5	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	7	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	14	TOTAL	53	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	25/04/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	EMBOÇO NA LAJE DO BEIRAL NO SEGUNDO PAVIMENTO
2	LIMPEZA GERAL DO PRIMEIRO PAVIMENTO
3	REMOÇÃO DE TERRA PRÓXIMO AO GERADOR
4	ESCAVAÇÃO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NA LINHA FINAL
5	MONTAGEM DA PORTA PROVISÓRIA DO BANHEIRO
6	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE ESGOTO NA LINHA FINAL
7	FIXAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO
8	ASSENTAMENTO E CHAPISCO DE PAREDE NA DIVISÃO DOS TELHADOS
9	PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS NO PRIMEIRO PAVIMENTO
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA		ANDAIME	32	
ENCARREGADO	2	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	4	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	7	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
ELETRICISTA	1	PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	15	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	23/05/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	EMBOÇO INTERNO NO SEGUNDO PAVIMENTO
2	INSTALAÇÃO DOS CONTRAMARCO DO SEGUNDO PAVIMENTO
3	ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL
4	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS NO PRIMEIRO PAVIMENTO
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA		ANDAIME	32	
ENCARREGADO	2	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	14	TOTAL	53	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	22/05/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO
2	INSTALAÇÃO DOS CONTRAMARCO DO SEGUNDO PAVIMENTO
3	EMBOÇO EXTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
4	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS NO PRIMEIRO PAVIMENTO
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA		ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	2	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	10	TOTAL	53	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	21/04/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO
2	INSTALAÇÃO DOS CONTRAMARCO DO SEGUNDO PAVIMENTO
3	EMBOÇO EXTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
4	CHAPISCO EXTERNO
5	EMBOÇO INTERNO NO SEGUNDO PAVIMENTO
6	DESCASCANDO EXCESSO DE CONCRETO NO BEIRAL DO TELHADO
7	RECORTES DO RODAPÉ DOS REVESTIMENTOS NO PRIMEIRO PAVIMENTO
8	ASSENTAMENTO DE PISO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA		ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	11	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	20/05/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO
2	DESLOCAMENTO DE TELHAS E CUMEEIRA PARA SEGUNDA LAJE
3	MONTAGEM DA CALHA DO SEGUNDO TELHADO
4	APLICAÇÃO DE REJUNTE NO PRIMEIRO PAVIMENTO
5	EMBOÇO EXTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
6	MONTAGEM DE MAIS UM LANCE DE ANDAIME
7	INÍCIO DA DESFORMA DO BEIRAL DA LAJE
8	RECORTES DO RODAPÉ DOS REVESTIMENTOS NO PRIMEIRO PAVIMENTO
9	ASSENTAMENTO DE PISO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
10	DESLOCAMENTO DOS BLOCOS DA CALÇADA PARA DENTRO DA OBRA
11	ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO		ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	12	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	19/05/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO
2	MONTAGEM DA CALHA DO SEGUNDO TELHADO
3	EMBOÇO EXTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
4	EMBOÇO INTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
5	RECORTES DO RODAPÉ DOS REVESTIMENTOS NO PRIMEIRO PAVIMENTO
6	ASSENTAMENTO DE PISO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
7	APLICAÇÃO DE REJUNTE NO PRIMEIRO PAVIMENTO
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO		ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	14	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	17/05/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	APLICAÇÃO DE MASSA FAROFA NO PRIMEIRO PAVIMENTO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0	
ELETRICISTA	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	11	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	16/05/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	COLOCAÇÃO DE TELHA
2	MONTAGEM DA CALHA DO SEGUNDO TELHADO
3	EMBOÇO EXTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
4	RECORTES DO RODAPÉ DOS REVESTIMENTOS NO PRIMEIRO PAVIMENTO
5	ASSENTAMENTO DE PISO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
6	APLICAÇÃO DE REJUNTE NO PRIMEIRO PAVIMENTO
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	8	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	15	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	15/05/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	APLICAÇÃO DE VEDACALHA
2	COLOCAÇÃO DE TELHA
3	EMBOÇO EXTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
4	RECORTES DO RODAPÉ DOS REVESTIMENTOS NO PRIMEIRO PAVIMENTO
5	ASSENTAMENTO DE PISO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	2	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	0	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	10	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	14/05/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REFORÇO DOS VIGAMENTO DO TELHADO
2	SUBSTITUIÇÃO DE PONTALETES
3	MONTAGEM DA CALHA
4	EMBOÇO INTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
5	RECORTES DO RODAPÉ DOS REVESTIMENTOS
6	APLICAÇÃO DE REJUNTE
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	12	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	13/05/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	DESLOCAMENTO DAS TELHAS E CUMEEIRA PARA LAJE SEGUNDO PAVIMENTO
2	MONTAGEM DA CALHA
3	EMBOÇO EXTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
4	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
5	AJUSTE NOS VÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO DOS CONTRAMARCO DO SEGUNDO PAVIMENTO
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	13	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	12/05/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	DESLOCAMENTO DAS TELHAS E CUMEEIRA PARA LAJE SEGUNDO PAVIMENTO
2	MONTAGEM DA CALHA
3	EMBOÇO EXTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
4	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
5	AJUSTE NOS VÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO DOS CONTRAMARCO DO SEGUNDO PAVIMENTO
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO		SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	12	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	09/05/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	DESLOCAMENTO DAS TELHAS E CUMEEIRA PARA O SEGUNDO PAVIMENTO
2	EMBOÇO EXTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
3	EMBOÇO INTERNO DO SEGUNDO PAGAMENTO
4	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
5	AJUSTE NOS VÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO DOS CONTRAMARCO DO SEGUNDO PAVIMENTO
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	13	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	08/05/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				
	SÁBADO			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	MONTAGEM DAS VIGAS DO TELHADO
2	FECHAMENTO DA PLATIBANDA
3	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
4	EMBOÇO EXTERNO NO SEGUNDO PAVIMENTO
5	EMBOÇO INTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
6	AJUSTE NOS VÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO DOS CONTRAMARCO DO SEGUNDO PAVIMENTO
7	APLICAÇÃO DE REJUNTE NO PRIMEIRO PAVIMENTO
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	6	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	14	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	07/05/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	MONTAGEM DAS VIGAS DO TELHADO
2	EMBOÇO EXTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
3	EMBOÇO INTERNO NO SEGUNDO PAVIMENTO
4	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
5	REMOÇÃO DE TERRA NA ÁREA DA CASA DE MÁQUINA
6	INSTALAÇÃO DE 3 JANELAS DE ALUMÍNIO DO PRIMEIRO PAVIMENTO
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	13	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	06/05/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	MONTAGEM DAS VIGAS DO TELHADO
2	EMBOÇO DA PAREDE EXTERNA DO SEGUNDO PAVIMENTO
3	EMBOÇO EXTERNO NO SEGUNDO PAVIMENTO
4	APLICAÇÃO DE REJUNTE NO PRIMEIRO PAVIMENTO
5	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
6	REQUADRO DAS CLARA BOIA
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	5	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	6	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	13	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	02/05/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	MONTAGEM DAS VIGAS DO TELHADO
2	EMBOÇO DA PAREDE EXTERNA DO SEGUNDO PAVIMENTO
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	2	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	2	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	6	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	01/04/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	MONTAGEM DAS VIGAS DO TELHADO
2	EMBOÇO DA PAREDE EXTERNA DO SEGUNDO PAVIMENTO
3	REMOÇÃO DE ENTULHO NA FRENTE DA OBRA
4	EMBOÇO INTERNO DO SEGUNDO PAVIMENTO
5	APLICAÇÃO DE REJUNTE NO PRIMEIRO PAVIMENTO
6	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO NO PRIMEIRO PAVIMENTO
7	REQUADRO EXTERNO DAS JANELAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	5	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	12	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ: nº 14.563.488/0001-70 - I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO									
DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP									
OBJETO	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
						SI/BDI	CI/BDI		
BDI = 25%									
16ª MEDIÇÃO - 27/05/2025									
	1	01	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO						
	1.1	01.02.071	PARCELO TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA FUNDAMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15	
	1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	un	1,00	5.366,58	6.710,72	6.710,72	
	1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	un	6,00	2.114,85	2.643,56	15.861,36	
	1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	un	10,00	1.951,02	1.958,77	19.387,70	
	1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	un	12,00	665,86	832,32	9.987,84	
	1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38	
	1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	tx	1,00	942,15	1.177,68	1.177,68	
	1.8	01.21.110		m	90,00	75,15	95,93	8.453,70	
	2	02	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					72.376,53	R\$
	2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	un.mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82	0,00
	2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10	
	2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65	
	2.4	02.03.120	TAPUPE FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80	
	2.5	02.05.202	ANDARME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	m.mês	40,50	19,29	24,11	976,46	
	2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6,00	678,00	847,80	5.085,00	
	2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20	
	2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,96	
	3	06	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL					46.869,99	R\$
	3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVATE 1,5 M	m³	10,00	39,47	49,33	493,30	0,00
	3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL, APLADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	10,00	12,27	15,33	153,30	
	4	08	ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM					646,60	R\$
	4.1	08.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m³.mês	1.566,00	5,86	7,32	11.463,12	0,00
	4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m³	783,00	10,01	12,51	9.795,33	
	4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	m³	16,20	102,53	126,16	2.076,19	0,00

4.4	08.05.180	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRACÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	100%	m²	81,00	12,93	16,16	1.308,96	-	0,00%	1.308,96	-
4.5	08.08.040	BARBACÁ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	100%	m	10,00	21,02	26,27	262,70	-	0,00%	262,70	-
8	08	FORMA						24.906,30			-R\$ 0,00	
5.1	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	100%	m²	480,74	141,41	176,76	84.975,60	-	0,00%	84.975,60	0,00
8	10	ARMADURA E CORDALHA ESTRUTURAL						84.975,60			RS 0,00	
6.1	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FVK = 500 MPA	100%	kg	13.824,00	9,34	11,67	161.328,08	-	0,00%	161.328,08	-
6.2	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-80 (A OU B) FVK = 600 MPA	100%	kg	2.073,60	11,02	13,77	28.553,47	-	0,00%	28.553,47	-
6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	100%	kg	5.016,00	12,07	15,08	75.641,28	-	0,00%	75.641,28	-
7	11	CONCRETO, MASSA E LASTRO						283.520,83			RS 0,00	
7.1	11.01.260	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBAMENTO	100%	m³	62,70	374,13	467,66	29.322,28	-	0,00%	29.322,28	-
7.2	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBAMENTO	100%	m³	138,24	388,49	465,61	67.130,73	-	0,00%	67.130,73	-
7.3	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB.	100%	m²	200,94	80,77	100,96	20.286,90	-	0,00%	20.286,90	-
7.4	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	100%	m²	39,15	125,27	156,58	6.136,37	-	0,00%	6.136,37	-
8	12	FUNDAÇÃO PROFUNDA						122.876,28			RS 0,00	
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	100%	bx	1,00	1.515,51	1.894,38	1.894,38	-	0,00%	1.894,38	-
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE; DIÂMETRO DE 30 CM RATE 30 T	100%	m	450,00	54,03	67,53	30.386,50	-	0,00%	30.386,50	-
9	13	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS						32.282,88			RS 0,00	
9.1	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADALAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	100%	m²	355,52	192,65	190,81	67.636,77	-	0,00%	67.636,77	-
9.2	13.01.190	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADALAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	100%	m²	478,21	167,30	209,12	99.685,04	-	0,00%	99.685,04	-
10	14	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR						167.421,81			RS 0,00	
10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B	100%	m³	800,50	96,27	82,83	68.305,41	-	0,00%	68.305,41	-
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B	100%	m³	812,00	80,93	101,16	82.141,92	-	0,00%	82.141,92	-
10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELÂMINICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	90%	m²	21,42	485,87	607,33	13.009,00	-	40,00%	11.708,11	1.300,89
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 1007MM - 1ST / 1ST	90%	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,63	-	40,00%	9.031,17	1.003,46
11	15	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO						171.490,98			RS 2.304,35	
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M	100%	m³	355,52	103,81	129,76	46.132,27	-	0,00%	46.132,27	-
12	16	TELHEMTO						46.132,27			RS 0,00	
12.1	16.03.010	TELHEMTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	100%	m²	460,00	48,88	58,57	26.942,20	-	0,00%	26.942,20	-
12.2	16.30.020	DOMO DE AGRÍCOLO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	80%	m²	17,50	667,08	733,85	12.842,37	-	80,00%	10.273,90	2.568,47
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	80%	m²	36,90	243,67	304,46	11.234,57	-	80,00%	8.987,66	2.246,91
12.4	16.33.052	CHAPA RUFO AFINS EM CHAPA GALVANIZADA, 1º 24 - CORTE 0,50 M	100%	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09	-	0,00%	15.392,10	-

17 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL				66.411,23				19.261,56		R\$ 4.815,38	
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	0%	m²	2,50	943,04	1.178,80	-	0,00%	-	2.947,00
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	100%	m²	18,40	508,35	635,43	11.691,91	0,00%	11.691,91	0,00
13.3	17.02.020	C-HPISCO	100%	m²	3.225,00	4,90	6,12	19.737,00	0,00%	19.700,95	36,05
13.4	17.02.120	EMBOCO COMUM	100%	m²	3.225,00	15,52	19,40	62.585,00	0,00%	62.565,00	0,00
13.5	17.02.220	REBOCO	100%	m²	2.288,82	8,76	10,95	23.080,38	0,00%	23.135,33	74,95
				122.001,29						R\$ 2.908,10	
14 REVESTIMENTO CERÂMICO											
14.1	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEIS PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B.L.A. RESISTÊNCIA QUÍMICA A. ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	95%	m²	537,86	117,77	147,21	79.178,37	7,99%	77.590,27	1.588,10
14.2	18.06.182	ROMPÊ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEIS PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B.L.B. RESISTÊNCIA QUÍMICA B. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	90%	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34	20,00%	1.560,84	173,50
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESURA DE 8MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	96%	m²	74,20	143,31	179,13	13.291,44	8,00%	13.025,62	265,82
14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	98%	m²	936,38	55,06	68,82	64.441,67	8,00%	63.193,72	1.247,95
				158.846,82						R\$ 3.275,37	
15 REVESTIMENTO EM PEDRA											
15.1	19.01.062	PEITORAL LÍQUO SOLERA EM GRANITO, ESPESURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	98%	m	148,10	118,12	147,65	21.571,66	8,00%	21.188,37	383,29
				21.571,66						R\$ 383,29	
16 REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO											
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESURA DE 3,2 MM, PARA TRAFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	85%	m²	153,03	178,82	223,27	34.167,00	35,00%	22.208,56	11.958,44
16.2	21.10.061	RODAPÊ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	65%	m	143,15	27,58	34,47	4.934,38	35,00%	3.207,35	1.727,03
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE, ALTO TRAFEGO, LARGURA DE 5 CM	50%	m	34,50	19,15	23,93	625,58	50,00%	412,79	412,79
				39.926,96						R\$ 14.090,26	
17 FORRO, BRISE E FACHADA											
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESURA DE 12,5MM, FIXO	82%	m²	716,00	68,94	86,17	61.870,06	71,73%	50.581,79	11.288,27
				61.870,06						R\$ 11.288,27	
18 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA											
18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 160 CM	100%	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38	16,67%	9.271,38	-
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	100%	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46	16,67%	10.400,46	-
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	88%	un	17,00	1.399,77	1.749,71	29.745,07	17,65%	26.245,65	3.499,42
18.4	23.08.030	FAIXABATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 3 CM COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	80%	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90	10,00%	4.013,52	1.003,38
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	82%	m²	0,90	133,78	167,23	150,80	22,22%	123,75	26,75
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	81%	m²	3,78	390,60	489,25	1.846,58	21,16%	1.497,95	347,63
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	88%	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00	12,50%	3.249,75	464,25


30.6	39.11.090	FIOTELFÔNICO TIPO FH-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	4000,00	3,07	3,83	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	240,00	14,07	17,58	4.218,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	160,00	20,20	25,25	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	120,00	29,68	37,10	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	180,00	40,43	50,53	9.095,40
31	40	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA			50.884,50	
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM	6,00	135,72	169,65	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRAS, COM PLACA	6,00	22,60	28,26	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	90,00	18,30	22,87	2.068,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	20,00	21,59	26,98	539,80
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	6,00	28,12	35,15	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	48,00	17,94	22,42	1.068,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	4,00	25,45	31,81	127,24
31.8	40.10.108	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A40 A - 2NA+2NF	2,00	640,33	807,91	1.615,52
32	41	LUMINAÇÃO			6.837,84	
32.1	41.10.080	GRUETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	3,00	405,79	507,23	1.521,69
32.2	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010T020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	3,00	1.269,33	1.611,66	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 115 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	8,00	1.092,71	1.365,88	10.927,04
32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSIL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3680 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	23,00	273,88	342,35	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSILÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	68,00	128,42	160,52	10.915,36
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOB. COM DIFUSOR RECIJADO TRANSIL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	60,00	214,05	267,56	16.053,60
33	43	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.			52.126,72	
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	5,00	382,50	453,12	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNIEIRA ELÉTRICA	2,00	182,07	227,58	455,16
33.3	43.05.030	EVALUATOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 180MPH	1,00	359,17	448,96	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIG. TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	3,00	6.159,05	7.698,61	23.096,43
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	1,00	10.482,48	13.078,10	13.078,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	12,00	2.716,73	3.398,41	40.780,92
34	44	APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS			80.126,17	
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	5,00	219,82	274,77	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	8,00	216,41	270,51	2.164,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	6,00	99,71	124,63	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	3,00	606,20	757,76	2.273,25
34.5	44.02.062	TAMPONANGADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	13,92	590,74	738,42	10.278,80
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M., COM VISOR	10,00	69,91	87,38	873,80
200,00	766,00	50,00%	766,00	50,00%	766,00	766,00
28,80	506,30	12,00%	3.724,67	12,00%	494,53	494,53
21,00	530,25	14,00%	3.264,32	14,00%	523,18	523,18
24,00	890,40	20,00%	3.557,52	20,00%	894,48	894,48
36,00	1.819,08	20,00%	7.276,32	20,00%	1.819,08	1.819,08
	8.436,11				8.346,11	
	-	0,00%	678,60	0,00%	339,30	339,30
	-	0,00%	113,00	0,00%	56,50	56,50
	-	0,00%	1.029,15	0,00%	1.029,15	1.029,15
	-	0,00%	269,80	0,00%	269,80	269,80
	-	0,00%	70,30	0,00%	140,60	140,60
	-	0,00%	560,50	0,00%	538,08	538,08
	-	0,00%	63,62	0,00%	63,62	63,62
	-	0,00%	807,91	0,00%	807,91	807,91
					3.244,96	
2,00	1.014,46	66,67%	1.014,46	66,67%	507,23	507,23
2,00	3.223,32	66,67%	3.223,32	66,67%	1.611,66	1.611,66
4,00	5.463,52	50,00%	5.463,52	50,00%	5.463,52	5.463,52
11,50	3.937,03	50,00%	3.937,03	50,00%	3.937,03	3.937,03
34,00	5.457,68	50,00%	5.457,68	50,00%	5.457,68	5.457,68
30,00	8.026,80	50,00%	8.026,80	50,00%	8.026,80	8.026,80
	27.122,81				25.003,92	
	-	0,00%	-	0,00%	2.265,60	2.265,60
	-	0,00%	-	0,00%	455,16	455,16
	-	0,00%	-	0,00%	448,96	448,96
	-	0,00%	23.096,43	0,00%	0,00	0,00
	-	0,00%	13.078,10	0,00%	-	-
	-	0,00%	40.780,92	0,00%	-	-
					3.169,72	
	-	0,00%	549,54	0,00%	824,31	824,31
	-	0,00%	541,02	0,00%	1.623,06	1.623,06
	-	0,00%	249,26	0,00%	498,52	498,52
	-	0,00%	757,75	0,00%	1.515,50	1.515,50
	-	0,00%	5.139,40	0,00%	5.139,40	5.139,40
	-	0,00%	-	0,00%	873,80	873,80

34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	0%	un	16,00	56,21	70,26	1.124,16	-	0,00%	-	1.124,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	0%	un	4,00	34,59	43,23	172,92	-	0,00%	-	172,92
34.9	44.03.690	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E ARELADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	100%	un	6,00	159,82	199,77	1.198,62	-	0,00%	-	1.198,62
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, AÇÃOAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2 OU 3/4"	69%	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21	-	0,00%	-	1.874,21
34.11	44.06.300	CAIXA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X10MM	50%	un	6,00	201,68	252,10	1.512,60	-	0,00%	-	1.512,60
35	46	TUBULAGEM E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.					23.594,07					R\$ 13.104,65
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON, DN= 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	160,00	22,26	27,82	5.007,60	-	0,00%	-	5.007,60
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON, DN= 50 MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50	-	0,00%	-	7.522,50
35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	12,00	26,52	33,15	397,80	-	0,00%	-	397,80
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO P/B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80	-	0,00%	-	2.551,80
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO P/B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20	-	0,00%	-	7.933,20
35.6	46.08.006	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	6,00	88,85	111,06	866,36	-	0,00%	-	866,36
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	36,00	96,27	124,08	4.466,88	-	0,00%	-	4.466,88
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO P/B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	120,00	56,56	70,70	8.484,00	-	0,00%	-	8.484,00
36	47	VALVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES					37.830,14					R\$ 7.405,03
36.1	47.01.060	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACASAMENTO, DN= 1 1/2"	0%	un	4,00	106,87	133,56	534,32	-	0,00%	-	534,32
36.2	47.01.210	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, AÇÃOAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	0%	un	4,00	190,80	238,50	954,00	-	0,00%	-	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	38%	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56	-	0,00%	-	1.602,56
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	0%	un	6,00	76,61	95,76	574,56	-	0,00%	-	574,56
37	48	RESERVATÓRIO E TANQUE PARA LÍQUIDOS E GASES					3.665,44					R\$ 3.064,48
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCADAMAR - CAPACIDADE DE 6.000 LITROS	33%	un	3,00	2.493,22	3.116,52	6.233,04	-	0,00%	-	6.233,04
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	0%	un	3,00	95,12	118,90	356,70	-	0,00%	-	356,70
38	49	CAIXA, BALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO					8.706,26					R\$ 6.589,74
38.1	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM COM GRELHA	65%	un	26,00	82,53	103,16	2.682,16	-	0,00%	-	2.682,16
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 800 MM	90%	un	20,00	229,17	286,46	5.729,20	-	0,00%	-	5.729,20
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	0%	un	2,00	354,29	442,86	885,72	-	0,00%	-	885,72
38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	0%	un	10,00	12,84	16,17	161,70	-	0,00%	-	161,70
39	54	PAVIMENTAÇÃO E PASSOIO					9.468,78					R\$ 2.548,78
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	22%	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35	-	0,00%	-	1.967,35
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	7%	m²	76,65	174,79	218,48	16.746,49	-	0,00%	-	16.746,49
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	0%	m²	511,00	19,35	24,18	12.365,88	-	0,00%	-	12.365,88

38.4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPa, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 18 FACES, COM REJ. E AREIA	0%	m ²	511,00	83,50	104,37	53.333,07
TOTAL								84.402,89
								2.326.081,38
								R\$ 82.719,69
								R\$ 53.333,07
TOTAL GERAL 1ª MEDIÇÃO								255.700,57
% MEDIDO								10,99%
ACUMULADO								2.020.075,85
SALDO REMANESCENTE								R\$ 306.005,51

Monteiro Lobato, 27 de maio de 2025

 Luis Gustavo de Barros
 Responsável Técnico
 CREA 50626954/30


RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
 Engenheiro Civil - Crec: 5702230/0
 Secretário de Obras



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 10/04/2025

RELATÓRIO Nº:
16/2025

CONFERIDO:

Fiscal do contrato

AUTOR:

CONTRATO: 097/2023

Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

DATA: 27/05/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	FOLHA: 2 / 7
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª MEDIÇÃO		

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS

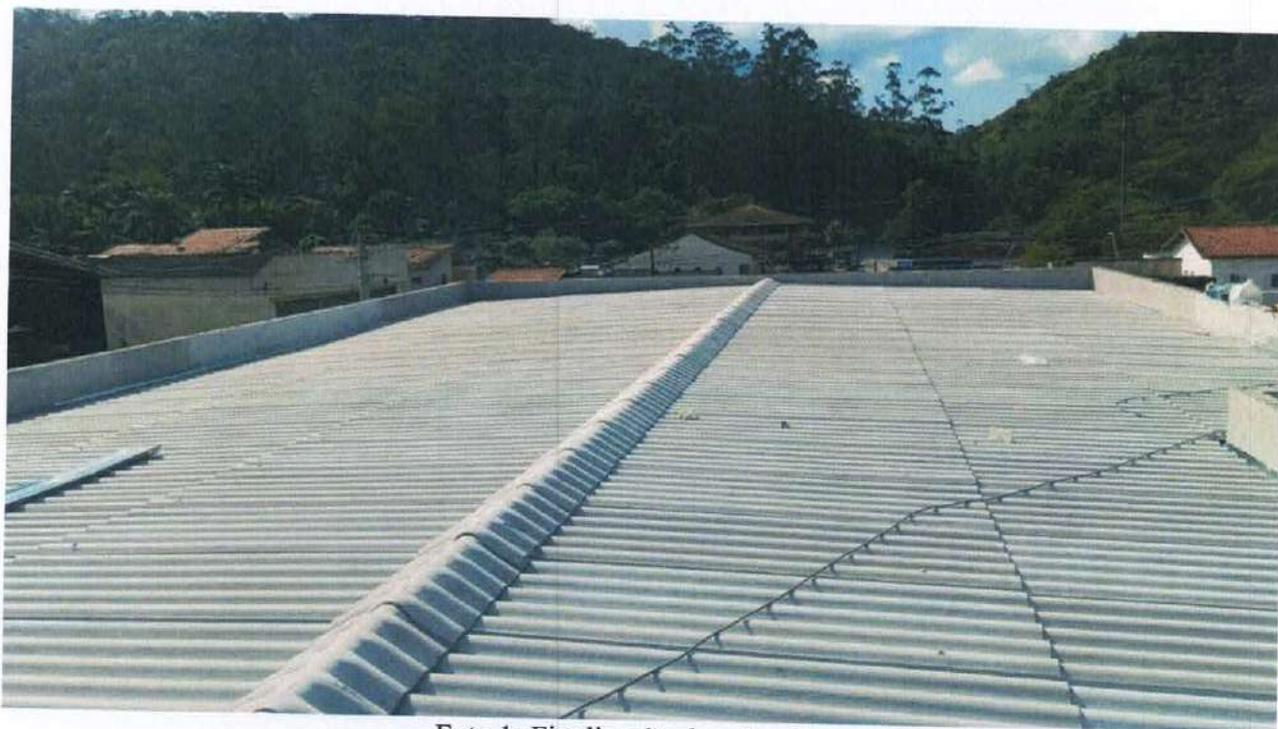


Foto 1: Finalização da cobertura.

Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
---	---

DATA:
27/05/2025

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 3 / 7

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª MEDIÇÃO

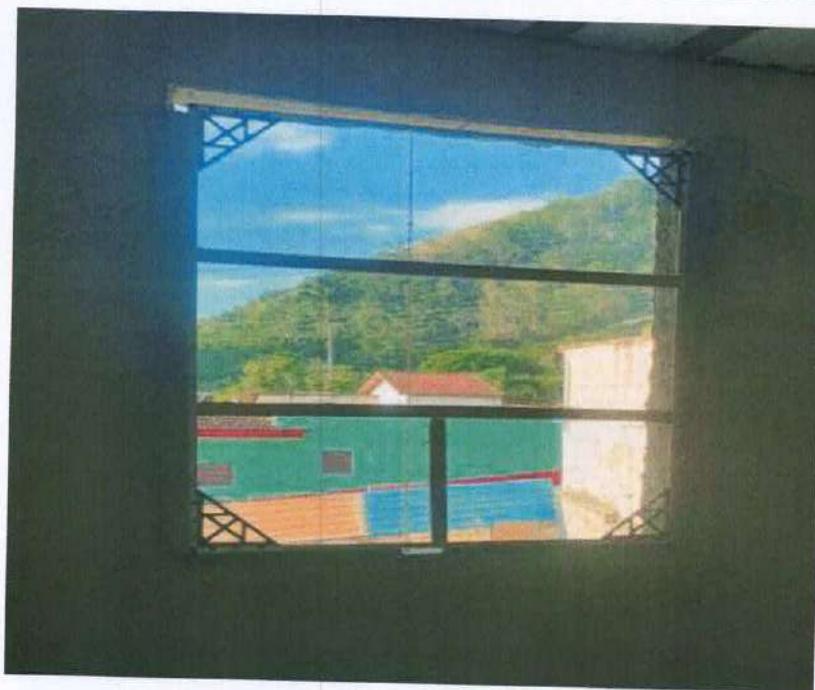


Foto 2: Instalação dos contra marcos no pavimento superior.

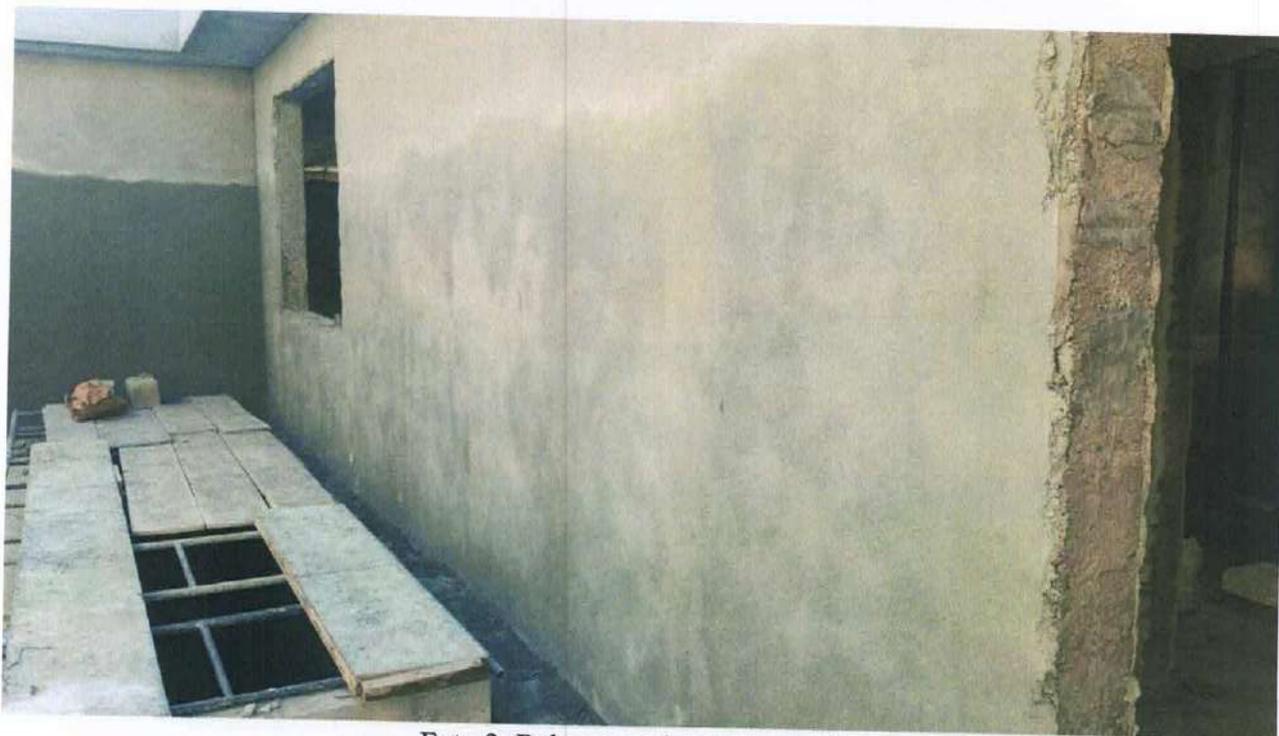


Foto 3: Reboco pavimento superior

Autor:

Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA:
27/05/2025

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 4 / 7

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª MEDIÇÃO



Foto 4: Revestimentos e pisos.

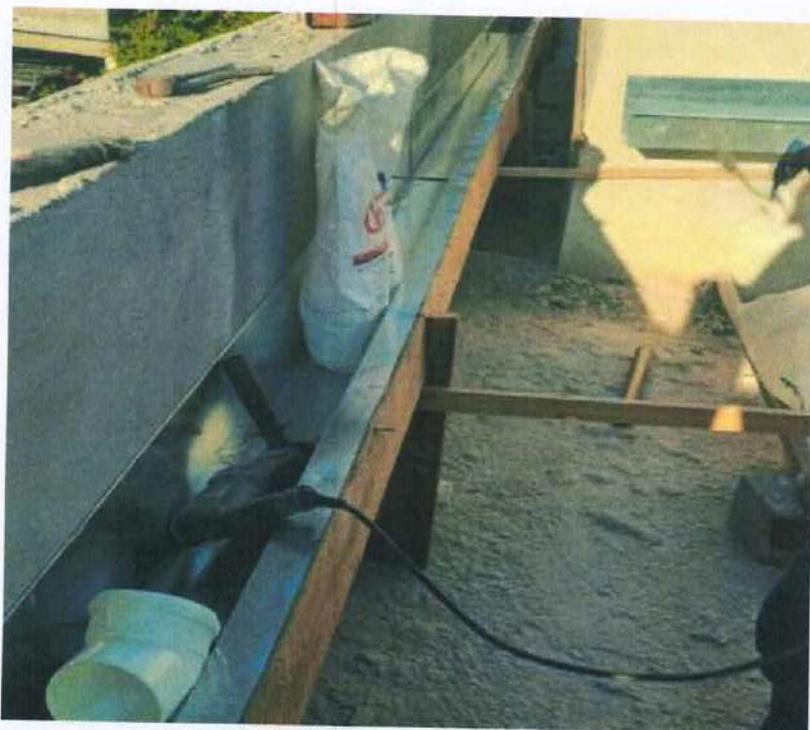


Foto 5: Instalação de calhas.

Autor:

Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA:
27/05/2025

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 5 / 7

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª MEDIÇÃO



Foto 6: Instalação de esquadrias de alumínio.

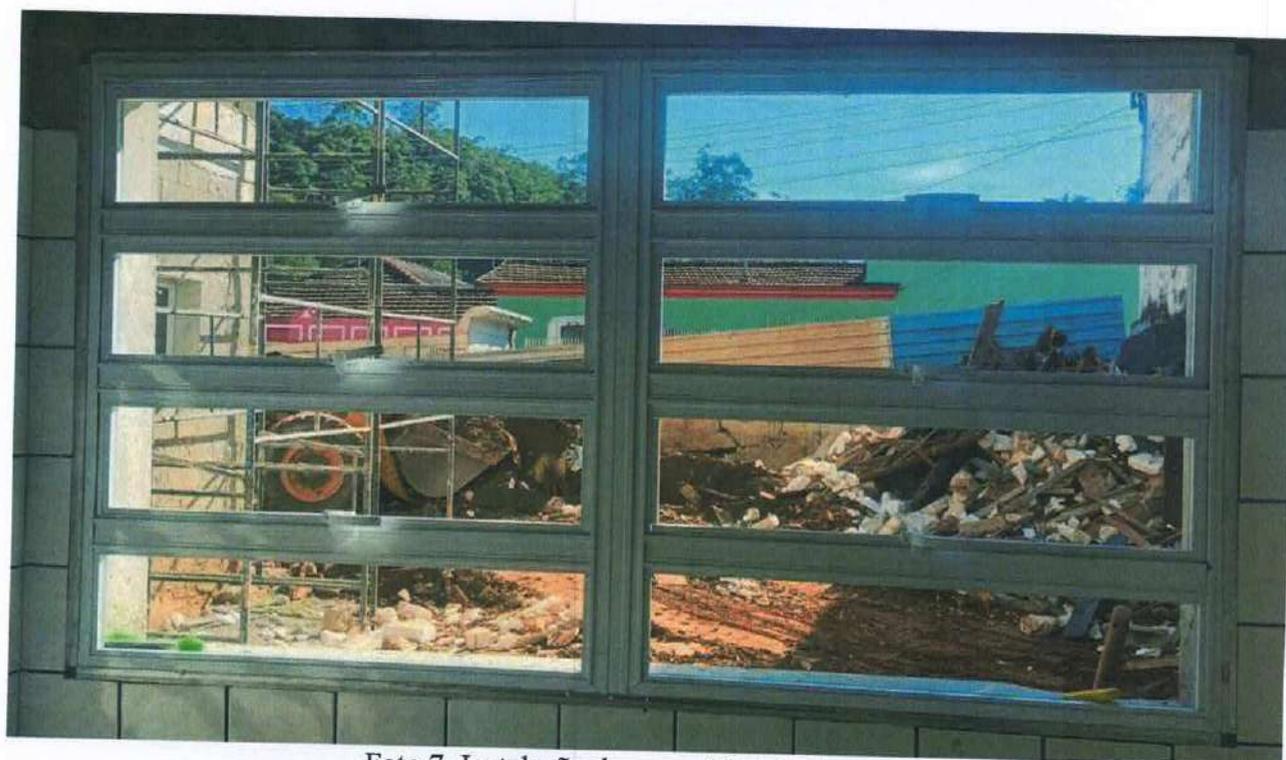


Foto 7: Instalação de esquadrias de alumínio.

Autor:

Lúis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA:
27/05/2025

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 6 / 7

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª MEDIÇÃO



Foto 8: Instalação de esquadrias de alumínio.

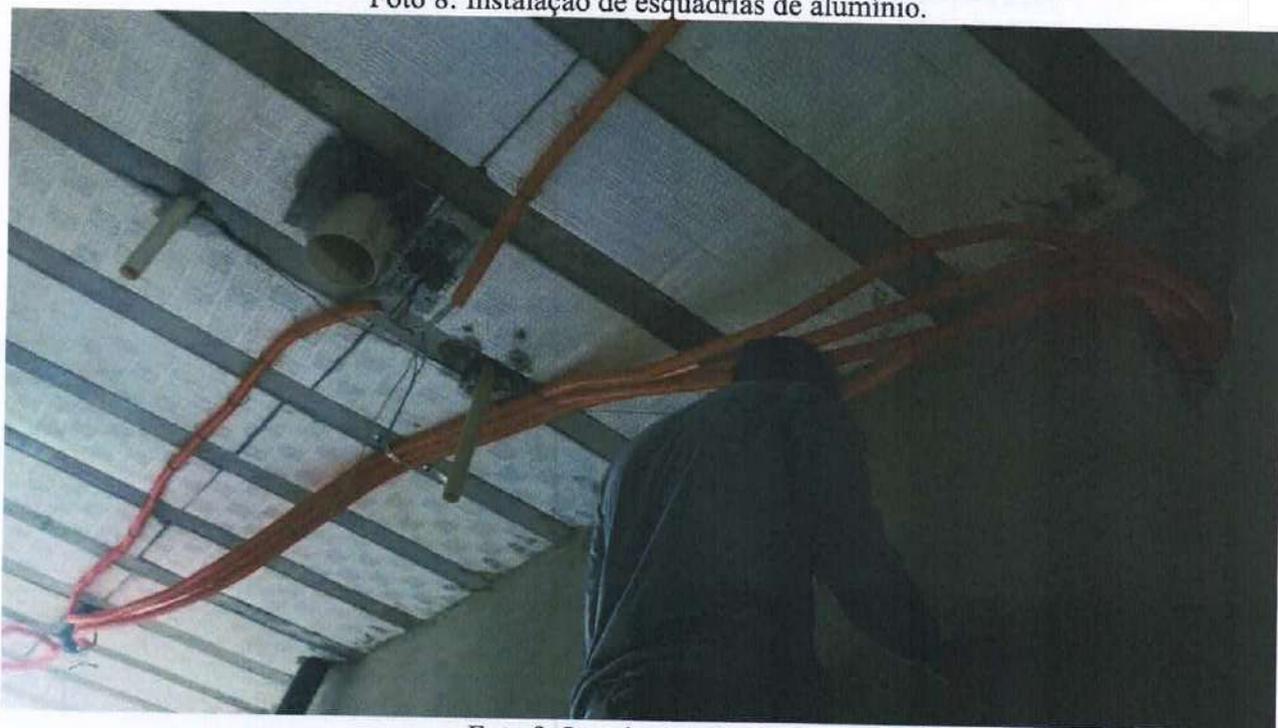


Foto 9: Instalação elétricas.

Autor:

Luis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA:
27/05/2025

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 7 / 7

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª MEDIÇÃO

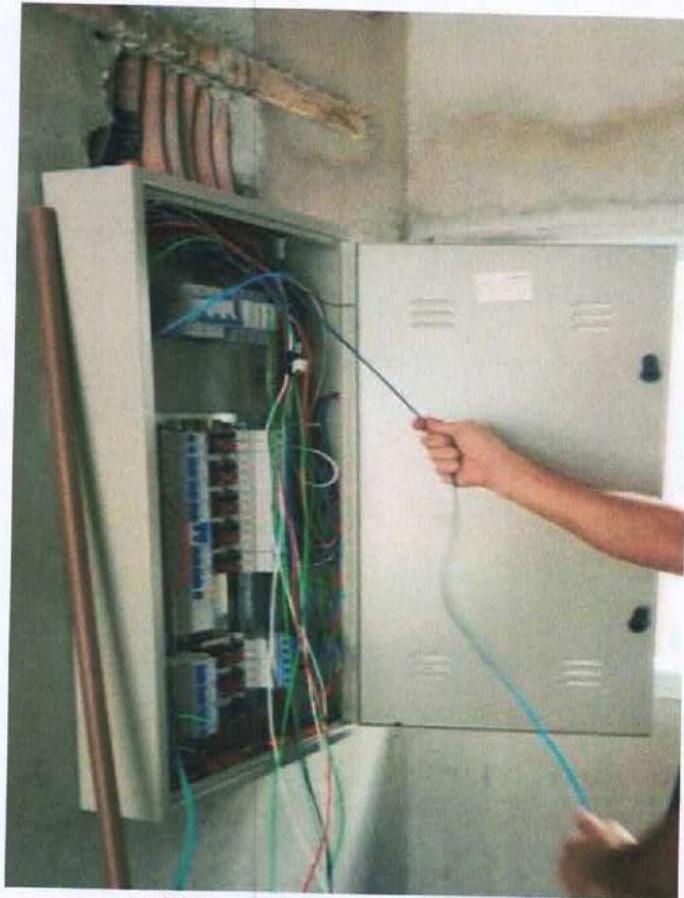


Foto 10: Instalação elétricas.


RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Engenheiro Civil - Crea: 507022960
Secretário de Obras

Autor:

Luis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:08:48 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **C718.26BB.E418.4796**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2025/000004944972

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Certidão emitida em: 13/05/2025, às 16:48:05 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **FF2A2967E93A70B8**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2025/000004945092

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão emitida em: 13/05/2025, às 16:49:55 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **F6DCC974CAAC3078**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.
- g) **As execuções criminais constarão apenas na certidão do 1º grau.**

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM

Certidão nº 329573 / 2025

CERTIFICA-SE que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 12/05/2025, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão n°: 26424614/2025

Expedição: 13/05/2025, às 16:44:17

Validade: 09/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.563.488/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 67820772

Data e hora da emissão 06/05/2025 16:50:50

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



08/05/2025

0086299952

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1045023

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 07/05/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 8 de maio de 2025.

PEDIDO Nº:

0086299952





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

CNPJ: 14.563.488/0001-70

CERTIDÃO EMITIDA em 14/05/2025, às 09:05:32

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 10/05/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **wsfcjcJfJ7eH1LW**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 10/05/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 10/05/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Serviço de Dívida Ativa

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácaras Selles – Guaratinguetá - SP - 12.505-470

Certidão Fiscal NEGATIVA de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 248/2025
Processo nº 3033//2025

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, “**CERTIFICA**” a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no **CNPJ 14.563.488/0001-70**, com inscrição municipal **13-5546/01/ISS**. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município no CNPJ da firma acima citada

CERTIFICA-SE ainda que “**NADA DEVE**”, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

Assinatura Digital

O presente documento recebe Assinatura Digital com Certificação Digital de acordo com as disposições normativas instituída pela Medida Provisória No 2200-2 de 24/08/2001.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.563.488/0001-70
Razão Social: A DE M MENDES MANUTENCAO EPP
Endereço: - RUA MILTON JOSE NUNES FERNANDES / CHACARAS SANTA MARI /
GUARATINGUETA / SP / 12522-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/05/2025 a 22/06/2025

Certificação Número: 2025052400481877731577

Informação obtida em 26/05/2025 08:04:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25050270087-26

Data e hora da emissão 08/05/2025 15:34:07

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.563.488 Nome Empregador: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
Vencimento da Guia: 20/05/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.500,50

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ADRIANO CESAR SALES TEIXEIRA	506	434.767.098-25	101	20/05/2025	Mensal	2.643,19	211,45	0,00	0,00	0,00	211,45
04/2025		ALEX DE ALMEIDA FERNANDES	535	427.523.948-29	101	20/05/2025	Mensal	2.528,89	202,31	0,00	0,00	0,00	202,31
04/2025		EDUARDO AUGUSTO SANT ANA DOS SANTO	000505	340.334.828-81	101	20/05/2025	Mensal	3.771,92	301,75	0,00	0,00	0,00	301,75
04/2025		ELISEU DE MORAES	515	050.507.028-60	101	20/05/2025	Mensal	2.528,89	202,31	0,00	0,00	0,00	202,31
04/2025		LUIZ FERNANDO DOS SANTOS PACHECO	536	404.237.058-65	101	20/05/2025	Mensal	2.183,16	174,65	0,00	0,00	0,00	174,65
Total do Tomador 90.017.2587773								13.656,07	1.092,47	0,00	0,00	0,00	1.092,47
Total do Estabelecimento 14.563.488/0001-70								81.859,98	6.500,50	0,00	0,00	0,00	6.500,50
Total FGTS								81.859,98	6.500,50	0,00	0,00	0,00	6.500,50

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02397

DATA: 30/05/2025 **VENCI 30/05/2025** PAGTO: 30/05/2025

Credor.: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST. CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 1078

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade.: GUARATINGUETA

CEP:

Discriminação..:

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **255.700,57**

(duzentos e cinquenta e cinco mil e setecentos reais e cinquenta e sete centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 255.700,57**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
833 / 3	GL 010401	10.301.0012.1029.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 255.700,57	RR\$ 0,00	RR\$ 12.785,03	RR\$ 242.915,54
TOTAL				RR\$ 255.700,57	RR\$ 0,00	RR\$ 12.785,03	RR\$ 242.915,54

Despesa Líquida: **RR\$ 242.915,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	48682		RR\$ 242.915,54
TOTAL . . .			RR\$ 242.915,54

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

CAROLINA DE SOUSA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome:

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATOPÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

833 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 327 DATA: 28/05/2025 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA 230852/23 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2025

NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 14.563.488/0001-70 CÓDIGO: 10786
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES GUARATINGUETA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios	PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido 242.915,54
802 TRANSF. UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND 001 PLANO AÇÃO 09032024-075342/24 SAULO PEDR		Desconto 12.785,03
GL	SOMA	255.700,57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1029.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES EXECUÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CENTRO SAUDE DR. JOAO AURICCHIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
774.381,35	470.617,25	255.700,57	303.764,10

VALOR A SER PAGO R\$ 255.700,57

duzentos e cinquenta e cinco mil e setecentos reais e cinquenta e sete centavos *****

DESCONTOS

8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	12.785,03	
TOTAL DE DESCONTOS		12.785,03

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/05/2025

Luara Ferreira

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Carolina de Sousa Silva - Secretária de Finanças

EMITIDO EM

DATA Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



Extrato de Conta Corrente

G3310813031006651
08/04/2025 13:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4868-2TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.852.538.000.000	3.000.000,00 C	
			003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813031006651
08/04/2025 13:15:27

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4868-2 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.000.000,00			2.278.905,307325	1,316421525	2.278.905,307325
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.009.931,65			2.278.905,307325		2.278.905,307325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.931,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.931,65
SALDO ATUAL =	3.009.931,65

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310813031006651
08/04/2025 13:14:34

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4868-2TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813031006651
08/04/2025 13:15:37

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4868-2 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.009.931,65			2.278.905,307325		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.032.163,05			2.278.905,307325		2.278.905,307325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.009.931,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.231,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.231,40
SALDO ATUAL =	3.032.163,05

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310813031006651
08/04/2025 13:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4868-2TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813031006651
08/04/2025 13:15:50

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4868-2 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.032.163,05			2.278.905,307325		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.054.590,97			2.278.905,307325		2.278.905,307325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.032.163,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.427,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.427,92
SALDO ATUAL =	3.054.590,97

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310813031006651
08/04/2025 13:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4868-2TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	172.556,97 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
14/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.556,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813031006651
08/04/2025 13:16:01

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4868-2 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.054.590,97				2.278.905,307325		
14/03/2025	RESGATE	172.556,97				128.359,668381	1,344323900	2.150.545,638944
	Aplicação 16/12/2024	172.556,97				128.359,668381		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.903.444,48				2.150.545,638944		2.150.545,638944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.054.590,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	172.556,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.410,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.410,48
SALDO ATUAL =	2.903.444,48

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310816348746721
08/05/2025 16:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4868-2TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.358.973	9.081,95 D	
				10/04 14:18 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.081,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310816348746721
08/05/2025 16:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4868-2TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.358.973	1.663,89 D	
				06/05 14:56 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	31.613,87 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.277,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom. 2.890.357,13C
Saldo 2.890.357,13C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/05/2025
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 02/06/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 2.890.357,13

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380916425160841
09/06/2025 16:46:08

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4868-2TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.358.973	1.663,89 D	
				06/05 14:56 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	31.613,87 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.277,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.358.973	12.785,03 D	
				30/05 15:22 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
30/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	242.915,54 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
30/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255.700,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380916425160841
09/06/2025 16:47:10

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4868-2 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.917.781,41				2.143.840,383356		
06/05/2025	RESGATE	33.277,76				24.421,331342	1,362651345	2.119.419,052014
	Aplicação 16/12/2024	33.277,76				24.421,331342		
30/05/2025	RESGATE	255.700,57				186.240,787924	1,372956874	1.933.178,264090
	Aplicação 16/12/2024	255.700,57				186.240,787924		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.654.170,39						1.933.178,264090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.917.781,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	288.978,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.367,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.367,31
SALDO ATUAL =	2.654.170,39

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088
