

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 583	
		Data e Hora de Emissão 11/02/2025 15:48:46	
		Código de Verificação * 64DK-X2A6	
		Série NE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.563.488/0001-70** Inscrição Municipal: **13554601**

Nome/Razão Social: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI**

Endereço: **RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450**

Município: **GUARATINGUETA** UF: **SP** E-mail: **fiscal@admequipamentos.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO**

CPF/CNPJ: **46.643.482/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000**

Município: **MONTEIRO LOBATO** UF: **SP** E-mail: **turismo@monteirolobato.sp.gov.br**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 11/02/2025, EM MONTEIRO LOBATO - SP

Nº LICITAÇÃO: 059/2023
CONTRATO Nº 230852/2023
Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023
OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO
13ª Medição Período: 10/01/2025 a 11/02/2025
Valor: R\$ 247.019,36

Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022.

341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1

	Valor do Serviço R\$ 247.019,36	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 247.019,36	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 12.350,97
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 247.019,36

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 234.668,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIA
CUARATUNGUETA
PREFECTURA MUNICIPAL DE

NOTA FISCAL DE RENDICION DE BIENES Y SERVICIOS

001

PERIODO DE RENDICION

Del 01 de Enero al 31 de Enero

Identificación de la persona o entidad que presta los bienes y servicios

Nombre y dirección de la persona o entidad que presta los bienes y servicios

Identificación de la persona o entidad que recibe los bienes y servicios

DESCRIPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Identificación de los bienes y servicios

Cantidad

Valor unitario y valor total de los bienes y servicios

Identificación de la persona o entidad que presta los bienes y servicios

VALOR TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Identificación de los bienes y servicios

Identificación de la persona o entidad que presta los bienes y servicios

Identificación de la persona o entidad que presta los bienes y servicios

Identificación de la persona o entidad que presta los bienes y servicios

Francisco Alvarado
179244838-19
Henrique 10/1/19

VALOR TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Identificación de los bienes y servicios

Identificación de la persona o entidad que presta los bienes y servicios

Identificación de la persona o entidad que presta los bienes y servicios



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE OBRAS

MEMORANDO 25027/2025

A/C: Secretaria de Finanças
De: Secretaria de Obras

Ref.: 13º Medição - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 13º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido Processo N° 230852/2023, Tomada de Preço N°008/2023, no valor total de R\$247.019,36 referente a seguinte nota fiscal, nº583. Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 13 de fevereiro de 2025.

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ: nº 14.563.488/0001-70 - I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 25%

DATA BASE: COHU 167 AGOSTO/2022 - DESONERADA

OBJETO										13ª MEDIÇÃO - 07/02/2025					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP															
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNIDADE DE MEDIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		QUANT.	MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	ACUMULADO MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
						S/DI	C/DI								
01 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO															
1.1	01.02.071	PARCEIRO TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAR, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	100%	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15		-	-	0,00%	5.254,15	-	
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 VA	100%	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72		-	-	0,00%	6.710,72	-	
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	100%	un	8,00	2.114,95	2.943,56	15.891,38		-	-	0,00%	15.891,38	-	
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	100%	un	10,00	1.551,02	1.336,77	18.397,70		-	-	0,00%	19.387,70	-	
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	100%	un	12,00	655,90	632,32	8.887,84		-	-	0,00%	9.987,84	-	
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	100%	un	6,00	738,38	224,23	5.545,38		-	-	0,00%	5.545,38	-	
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDADEM	100%	tx	1,00	942,13	1.177,68	1.177,68		-	-	0,00%	1.177,68	-	
1.8	01.21.110	SONDADEI DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	100%	m	80,00	75,13	93,83	8.453,78		-	-	0,00%	8.453,78	-	
								72.376,83							
02 - INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA															
2.1	02.01.190	BANHEIRO GUMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETERB	100%	un/mês	9,00	627,19	783,98	7.855,82		-	-	0,00%	7.855,82	R\$	0,00
2.2	02.02.130	LOCALIZ. DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO, COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	100%	un/mês	9,00	623,12	1.123,00	10.395,10		-	-	0,00%	10.385,10	R\$	-
2.3	02.02.150	LOCALIZ. DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 19,30 M²	33%	un/mês	6,00	575,98	710,35	6.479,65	1,00	719,85	11,11%	3.599,25	R\$	2.879,40	
2.4	02.03.120	1 NÚMERO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	100%	m²	90,00	77,05	39,31	7.704,80		-	-	0,00%	7.704,80	R\$	-
2.5	02.05.200	ANDARIM TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	100%	m/mês	40,00	19,29	24,11	37,46		-	-	0,00%	976,46	R\$	-
2.6	02.06.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	100%	m²	8,00	678,00	847,50	5.095,00		-	-	0,00%	5.085,00	R\$	-
2.7	02.08.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 DIA	100%	m²	280,00	5,14	5,67	1.734,20		-	-	0,00%	1.734,20	R\$	-
2.8	02.10.020	LOCALIZ. DE OBRA E DIFUSÃO	100%	m²	420,00	12,05	15,07	6.442,85		-	-	0,00%	6.449,96	R\$	-
								46.869,89	719,85						
03 - SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL															
3.1	03.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1ªª CATEGORIA EM 1ª LATA CAVALA ATÉ 15,30	100%	m³	10,00	38,47	49,33	493,30		-	-	0,00%	493,30		0,00
3.2	03.11.040	REATERRO MANUAL APLICADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	100%	m³	18,00	12,27	10,35	153,30		-	-	0,00%	153,30		-
								646,60							
04 - RECOMENDADO, CONTENÇÃO E DRENAGEM															
4.1	04.02.050	CMR AUMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m³/mês	1.568,00	5,85	7,22	11.463,12		-	-	0,00%	11.463,12		0,00
4.2	04.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CMR AUMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m³	763,00	10,01	12,01	9.245,32		-	-	0,00%	9.295,33		-
4.3	04.05.100	DREN. COM PEDRA BRITADA	100%	m³	18,20	102,53	128,16	2.078,16		-	-	0,00%	2.076,18		0,00
4.4	04.05.160	MANUT. GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 190 N/M E TRANSVERSAL DE 200 N/M	100%	m²	81,00	13,43	19,15	1.308,96		-	-	0,00%	1.308,96		-
4.5	04.08.040	BARBACEM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 (M)	100%	m	10,00	21,52	23,27	262,70		-	-	0,00%	262,70		-
								24.809,30							
05 - FORMA															
5.1	05.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	100%	m²	480,74	141,41	176,79	84.375,60		-	-	0,00%	84.975,60		0,00
								84.375,60							
06 - ARMADURA E CORDALHA ESTRUTURAL															
6.1	10.01.040	ARMADUR. EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) F.V. = 520 MPa	100%	kg	13.624,00	9,34	11,67	161.326,08		-	-	0,00%	161.326,08	-	0,00
6.2	10.01.090	ARMADUR. EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) F.V. = 520 MPa	100%	kg	2.073,30	11,02	13,77	28.553,47		-	-	0,00%	28.553,47	-	0,00
6.3	10.02.020	ARMADUR. EM TELA SOLDADA DE AÇO	100%	kg	5.016,00	17,07	15,08	75.541,28	4.151,27	62.601,15	82,76%	75.641,28	-	-	0,00
								206.520,83	62.601,15						
07 - CONCRETO, MASSA E LASTRO															
7.1	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPa - PARA BOMBAMENTO	100%	m³	62,70	374,18	497,85	26.322,26		-	-	0,00%	29.322,28		0,00
7.2	11.01.240	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPa - PARA BOMBAMENTO	100%	m³	135,24	389,44	485,01	97.130,73		-	-	0,00%	67.130,73	-	0,00
7.3	11.15.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBA	100%	m³	208,34	80,77	100,86	20.283,80		-	-	0,00%	20.286,90		0,00
7.4	11.16.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	100%	m²	39,19	125,27	138,59	6.139,27		-	-	0,00%	6.136,37	-	0,00
								122.876,28							
08 - FUNDAÇÃO PROFUNDA															
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	100%	tx	1,00	1.515,31	1.894,38	1.894,38		-	-	0,00%	1.894,38	-	
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 9,0 T	100%	m	450,00	54,03	37,50	30.398,50	408,00	27.552,24	90,67%	30.388,50	-	-	
								32.292,88	27.552,24						
09 - LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS															
9.1	13.01.170	L.A.E. PRÉ-FABRICADO AJUST. A BOTA TRELÇADA, LATA CERA/ALCA - LT 20 (15+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	100%	m²	355,52	152,93	180,81	67.838,77		-	-	0,00%	67.836,77	-	
9.2	13.01.180	L.A.E. PRÉ-FABRICADO AJUST. A BOTA TRELÇADA, LATA CERA/ALCA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	100%	m²	478,21	187,10	208,12	89.585,84		-	-	0,00%	99.585,04	-	
								167.424,61							
10 - ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR															
10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 10 X 30 CM - CL B	100%	m³	866,50	58,27	82,93	66.305,41		-	-	0,00%	66.305,42	-	0,00
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 30 CM - CL B	100%	m³	812,00	80,93	101,19	82.141,82		-	-	0,00%	82.141,92	-	7.101,43
10.3	14.30.070	ONISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINADO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	0%	m²	21,42	485,87	907,33	13.009,00		-	-	0,00%	-	-	13.009,00
10.4	14.30.310	ONISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESURA 150/60MM - 15T / 15T	0%	m²	87,70	91,24	114,42	10.034,63		-	-	0,00%	-	-	10.034,63
								171.490,89							
11 - ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO															
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TEGOURADA PARA TELHA PERF. ONDULADO - VÃOS 15,81 A 16,88 M	0%	m²	355,52	103,81	128,78	46.132,27		-	-	0,00%	-	-	46.132,27
								46.132,27							
12 - TELHAMENTO															
12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFURÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERF. ONDULADO DE 4 MM	0%	m²	480,00	46,69	36,57	26.842,20		-	-	0,00%	-	-	26.842,20
12.2	16.30.020	UMGO DE ACRILICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	0%	m²	17,50	567,08	735,05	12.842,37		-	-	0,00%	-	-	12.842,37
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 16 MM	0%	m²	30,40	243,57	304,40	11.234,57		-	-	0,00%	-	-	11.234,57
12.4	16.33.052	CAIXA RUFO, AFIS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 6,30 M	0%	m	112,22	106,73	137,18	15.342,09		-	-	0,00%	-	-	15.392,09
								66.411,23							
13 - REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL															
13.1	17.01.010	REVESTIMENTO EM MASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA ESPALHADA	0%	m²	2,50	843,04	1.179,88	2.847,80		-	-	0,00%	-	-	2.947,00
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	0%	m²	18,40	508,35	933,43	11.891,81		-	-	0,00%	9.938,13	-	1.753,78

		CHAPISCO	40%	m²	3,225.09	4.90	5.12	18,737.20	-	-	0,00%	9.488,82	10.248,18	
13.3		17.02.020	CHAPISCO	40%	m²	3,225.09	4.90	5.12	18,737.20	-	-	0,00%	9.488,82	10.248,18
13.4		17.02.120	EMBOÇO COMUM	74%	m²	3,225.09	15,02	19.40	62,595.00	-	-	0,00%	46.345,82	16.219,18
13.5		17.02.220	REBOCO	73%	m²	2,289.92	6,73	19.95	25,850.38	-	-	0,00%	18.368,08	6.691,30
								122.081,29		-		R\$	37.959,45	
14 18 REVESTIMENTO CERÂMICO														
14.1		18.08.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA INTERNA COM BADA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BAIXA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	50%	m²	537,83	117,77	147,21	78.178,37	53,79	7.917,84	10,00%	39.589,19	39.589,18
14.2		18.08.162	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RUSTICA PARA ÁREA INTERNA COM BADA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BAIXA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	20%	m	300,59	4,93	5,79	1.734,34	30,01	178,43	10,00%	867,17	867,17
14.3		18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESURA DE 6MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	50%	m²	74,29	143,31	172,13	13.231,44	7,42	1.329,14	10,00%	6.645,72	6.645,72
14.4		18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X23 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	30%	m²	838,39	55,93	98,82	84.441,87	83,64	6.444,17	10,00%	32.220,84	32.220,83
								168.646,82		15.864,58		R\$	79.322,90	
15 19 REVESTIMENTO EM PEDRA														
15.1		19.01.032	PEFITEI, ECU SOLERA EM GRANITO, ESPESURA DE 2 CM E LARGURA DE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	64%	m	148,19	118,12	147,95	21.571,88	50,00	7.382,50	34,22%	18.168,33	3.403,33
								21.671,66		7.382,50		R\$	3.403,33	
16 21 REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO														
16.1		21.02.090	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESURA DE 3,2 MM, PARA TRAFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	30%	m²	153,03	179,32	223,27	34.197,00	-	-	0,00%	10.250,10	23.916,90
16.2		21.10.091	RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CUPVOPILADO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	30%	m	143,15	27,09	34,47	4.354,38	-	-	0,00%	1.480,31	3.454,07
16.3		21.20.302	PFA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE, ALTO TRAFEGO, LARGURA DE 5CM	0%	m	34,50	18,15	23,83	925,59	-	-	0,00%	-	825,58
								39.325,96		-		R\$	28.196,54	
17 22 FORRO, BRISE E FACHADA														
17.1		22.02.030	FORRO EM PAPIRO DE GESSO ALARTUNADO, ESPESURA DE 12,9 MM, FKG	0%	m²	710,00	90,34	95,17	61.570,89	-	-	0,00%	-	61.870,06
								61.870,86		-		R\$	61.870,06	
18 23 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA														
18.1		23.04.393	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 180 CM	67%	un	6,99	1.236,18	1.343,23	9.271,38	2,00	3.090,46	33,33%	6.180,92	3.090,46
18.2		23.04.405	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	67%	un	5,99	1.395,73	1.731,41	10.400,45	2,00	3.466,82	33,33%	6.933,64	3.466,82
18.3		23.04.419	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	52%	un	17,00	1.369,77	1.749,71	28.745,07	5,00	8.748,55	29,41%	17.497,10	12.247,97
18.4		23.08.030	FAIXA BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 15 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	60%	m	30,00	133,79	197,23	5.919,90	6,00	1.337,84	26,67%	3.010,14	2.006,76
18.5		23.09.040	ARMÁRIO GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PATELEIRAS	80%	m²	8,30	133,78	197,23	159,50	0,24	40,14	26,67%	90,30	60,20
18.6		23.09.242	PORTALBA DE CUPPER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	90%	m²	3,78	390,50	498,25	1.045,50	1,27	619,10	33,55%	1.107,35	738,23
18.7		23.02.700	PORTALBA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	75%	un	4,00	742,80	926,50	3.714,00	2,00	1.857,00	50,00%	2.785,50	928,50
18.8		23.06.500	PORTALBA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	67%	un	6,99	773,84	957,00	5.801,80	2,00	1.984,60	33,33%	3.869,20	1.934,60
18.9		23.09.590	PORTALBA COM BATENTE METÁLICO - 150 X 210 CM	53%	un	12,00	1.019,46	1.274,05	15.299,40	3,00	3.824,85	25,00%	8.924,65	6.374,75
18.10		23.10.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	50%	un	18,95	44,23	35,36	833,58	5,00	276,80	29,59%	553,60	381,98
18.11		23.10.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	10%	m	18,95	8,82	8,82	143,88	5,14	43,79	30,42%	86,39	57,59
								82.326,66		25.239,95		R\$	31.287,85	
19 24 ESQUADRIA, BERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO														
19.1		24.03.040	GUARACORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,10	100%	m	28,75	707,32	884,52	26.314,47	-	-	0,00%	26.314,47	-
19.2		24.03.100	ALCAPÃO EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	0%	m²	1,90	1.875,18	1.343,95	1.343,95	-	-	0,00%	-	1.343,95
								27.658,42		-		R\$	1.343,95	
20 25 ESQUADRIA, BERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO														
20.1		25.01.090	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MARFIM COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	50%	m²	41,10	689,45	831,04	34.238,76	11,55	9.621,84	28,10%	17.119,38	17.119,38
20.2		25.01.095	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MARFIM, SOB MEDIDA	50%	m²	28,55	706,32	862,80	20.099,68	8,23	7.261,85	-27,83%	13.044,85	13.044,84
20.3		25.01.092	CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO GENEXINA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	50%	m²	41,10	548,15	581,43	2.814,38	1,05	720,75	25,61%	1.407,18	1.407,18
20.4		25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRI EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	50%	m²	18,11	870,40	1.068,06	20.731,68	5,56	6.043,84	29,07%	10.395,84	10.395,84
20.5		25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	50%	m²	19,90	506,98	745,26	12.539,19	4,40	3.283,28	26,19%	6.268,08	6.268,08
								98.470,65		12.407,86		R\$	48.235,32	
21 26 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO														
21.1		26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLOREDO DE 8 MM	0%	m²	1,00	420,84	521,05	782,07	-	-	0,00%	-	782,07
21.2		26.04.030	ESPelho LONGO DE 3 MM COM MOLDE EM ALUMÍNIO	0%	m²	3,00	528,47	931,63	1.985,46	-	-	0,00%	-	1.985,49
								2.774,58		-		R\$	2.774,56	
22 27 ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL														
22.1		27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMPLIAMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	0%	m	128,00	124,82	135,02	18.939,52	-	-	0,00%	-	19.658,52
								19.658,62		-		R\$	19.658,52	
23 28 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS														
23.1		28.01.171	MOILA AEREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACRIA DE 90 KG ATÉ 95 KG	0%	un	4,90	248,27	307,83	1.231,32	-	-	0,00%	-	1.231,32
								1.231,32		-		R\$	1.231,32	
24 30 ACESSIBILIDADE														
24.1		30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	0%	m	7,00	149,33	163,66	1.209,62	-	-	0,00%	-	1.306,62
24.2		30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	0%	un	7,00	85,99	119,87	839,09	-	-	0,00%	-	839,09
24.3		30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	0%	un	14,00	125,30	157,37	2.203,18	-	-	0,00%	-	2.203,18
24.4		30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	0%	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91	-	-	0,00%	-	2.471,91
24.5		30.04.020	REVESTIMENTO EM BARRALHA SINTÉTICA COLORDADA DE 5 MM, PARA BARRILHAÇÃO TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL - COLADO	0%	m²	11,50	150,98	199,70	2.170,05	-	-	0,00%	-	2.170,05
24.6		30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 43 CM	0%	m	14,00	389,47	489,93	6.815,62	-	-	0,00%	-	6.815,62
24.7		30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGADE ESTACIONAMENTO	0%	un	2,00	170,78	215,47	425,94	-	-	0,00%	-	425,94
24.8		30.08.030	ASBESTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI DE 700 X 405 MM	0%	un	3,00	799,63	937,81	4.789,55	-	-	0,00%	-	4.789,55
24.9		30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	0%	un	5,00	1.192,06	1.499,08	7.453,40	-	-	0,00%	-	7.453,40
24.10		30.08.090	BACIA BIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 8 LITROS	0%	un	5,00	948,78	1.099,97	5.304,85	-	-	0,00%	-	5.304,85
								33.781,21		-		R\$	33.781,21	
25 32 IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA														
25.1		32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANA ASFALTICA COM ARMADURA A TPO 808, ESPESURA DE 4 MM	100%	m²	113,35	93,94	79,55	8.013,81	113,30	9.013,02	100,00%	9.013,02	-
25.2		32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	100%	m²	118,90	13,79	17,32	2.012,46	-	-	0,00%	2.012,46	-
								11.026,27		9.013,02		-R\$	0,01	0,01
26 33 PINTURA														
26.1		33.02.090	MASSA CURADA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	0%	m³	1.682,87	11,35	14,57	21.315,47	-	-	0,00%	-	21.315,47
26.2		33.16.010	TINTA ACRÍLICA ANTI FOGO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m³	1.689,72	21,80	27,37	54.458,63	-	-	0,00%	-	54.458,63
26.3		33.16.090	EPOXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m³	278,20	80,21	109,28	27.992,08	-	-	0,00%	-	27.992,08

26.4	35.12.011	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	84,52	37,49	45,91	2.024,21	-	0,00%	-	2.624,21
											R\$	106.390,40
37	34	PAISAGISMO E FENCIMENTOS										
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORÇÂNICA COMUM	0%	m³	4,55	149,33	167,03	850,88	-	0,00%	-	850,88
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA PLANTIO	0%	m²	42,23	1,31	1,53	56,89	-	0,00%	-	68,88
27.3	34.01.100	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA EM PLACAS (LAPIDE E CANTOS)	0%	m²	66,70	10,68	13,60	934,22	-	0,00%	-	934,22
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALEA-H=0,95 A 0,90 M	0%	un	27,00	40,13	50,19	1.354,32	-	0,00%	-	1.354,32
27.5	34.03.120	ARBUSTO MURETA-H=0,55 M	0%	un	15,00	28,33	33,81	553,65	-	0,00%	-	553,65
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA-H=0,95 A 0,90 M	0%	un	2,00	20,93	27,43	74,86	-	0,00%	-	74,86
27.7	34.04.100	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO-H=2,50 M	0%	un	2,00	66,11	111,38	222,76	-	0,00%	-	222,76
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCULIGO-H=0,80 A 0,80 M	0%	un	13,00	41,88	52,35	985,55	-	0,00%	-	985,55
27.9	34.03.150	PORTA-ÚDE ABRI EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, FALHA 05 X 132 UN, E PRATUBA ELETROSTÁTICA	0%	m³	12,00	1.774,34	2.217,40	26.813,60	-	0,00%	-	26.813,60
											R\$	31.353,92
28	37	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA										
28.1	37.01.100	QUADRO TELEBARRA DE EMBUTIR DE 900 X 900 X 120 MM	100%	un	1,00	566,24	923,30	923,30	-	0,00%	-	625,30
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR PARA DERIVADORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 2,5 A - SEM COMPONENTES	100%	un	4,00	1.011,14	1.253,92	5.055,68	-	0,00%	-	5.055,68
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	100%	kg	16,00	83,80	117,25	1.172,50	10,00	1.172,50	100,00%	1.172,50
28.4	37.15.030	DEJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/230 V, CORRENTE DE 10 A ATE 30 A	100%	un	24,00	95,87	118,83	2.875,92	24,00	2.875,92	100,00%	2.875,92
28.5	37.15.040	DEJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/230 V, CORRENTE DE 30 A ATE 100 A	100%	un	8,00	126,47	191,63	1.294,64	8,00	1.294,64	100,00%	1.294,64
28.6	37.15.050	DEJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/230 V, CORRENTE DE 10 A ATE 30 A	0%	un	24,00	129,53	191,00	3.955,80	-	0,00%	-	3.955,80
28.7	37.15.060	DEJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/230 V, CORRENTE DE 30 A ATE 100 A	0%	un	8,00	148,28	185,35	1.112,10	-	0,00%	-	1.112,10
28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ALIMENTADO ROTATIVO, COM PROTECTOR E PORTAFUSIVEL, ATEN-2400 A - SEM FUSIVEL	100%	un	2,00	3.467,94	4.359,92	8.719,84	2,00	8.719,84	100,00%	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	100%	un	20,00	181,57	227,09	4.541,60	20,00	4.541,60	100,00%	4.541,60
28.10	37.14.040	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 kV, UNITE 240V/12V, BIP = 60 VA, CURVA DE ENSAIO 100/350/5 - CLASSE 1	100%	un	4,00	566,04	700,85	2.800,20	4,00	2.800,20	100,00%	2.800,20
											R\$	4.997,70
29	39	TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA										
29.1	39.10.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	100%	m	980,00	12,34	13,27	15.355,80	490,00	7.578,30	50,00%	15.356,60
29.2	39.10.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	100%	m	180,00	14,27	17,83	3.200,40	84,00	1.497,72	46,67%	3.209,40
											R\$	-
30	38	CONDUTOR E ENFIADAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA										
30.1	38.02.010	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLADO EM PVC 70%	34%	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00	1.442,21	5.927,47	34,34%	5.927,47
30.2	38.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLADO EM PVC 70%	3%	m	860,00	5,93	3,21	4.164,60	34,89	220,16	5,29%	220,16
30.3	38.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLADO EM PVC 70%	33%	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00	324,25	2.889,59	92,64%	2.889,59
30.4	38.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLADO EM PVC 70%	0%	m	200,00	11,19	13,85	2.790,00	-	0,00%	-	2.790,00
30.5	38.04.070	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	0%	m	10,00	29,39	35,40	354,80	-	0,00%	-	354,80
30.6	38.11.030	FIO TELEFÔNICO TIPO FH-46 PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	0%	m	400,00	3,07	3,83	1.532,80	-	0,00%	-	1.532,80
30.7	38.21.030	CABO DE COBRE FLEX DE 15 MM², ISOL. 0,5/11V - ISOLADO EM PVC 90%	11%	m	240,00	14,07	17,53	4.214,20	27,07	475,89	11,28%	475,89
30.8	38.21.070	CABO DE COBRE FLEX DE 25 MM², ISOL. 0,5/11V - ISOLADO EM PVC 90%	72%	m	150,00	39,25	25,25	3.787,50	108,28	2.794,07	72,19%	2.794,07
30.9	38.21.090	CABO DE COBRE FLEX DE 35 MM², ISOL. 0,5/11V - ISOLADO EM PVC 90%	15%	m	120,00	28,98	37,10	4.452,00	17,89	663,72	14,91%	663,72
30.10	38.21.090	CABO DE COBRE FLEX DE 50 MM², ISOL. 0,5/11V - ISOLADO EM PVC 90%	0%	m	180,00	49,43	39,53	9.035,40	-	0,00%	-	9.035,40
											R\$	37.873,60
31	40	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA										
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA COM TAPAS PARA 40X40X150 MM	0%	un	8,00	135,72	199,85	1.017,80	2,00	339,30	33,33%	678,60
31.2	40.04.060	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRAS, COM PLACA	0%	q	8,00	22,90	26,25	199,50	2,00	56,50	33,33%	113,00
31.3	40.04.090	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	50%	q	80,00	18,30	22,87	2.054,30	-	0,00%	1.029,15	1.029,15
31.4	40.04.090	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	50%	q	20,00	21,39	25,89	519,60	-	0,00%	269,80	269,80
31.5	40.04.070	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	33%	q	6,00	28,12	35,15	210,90	-	0,00%	70,30	140,60
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	33%	q	49,00	17,24	22,42	1.098,58	8,00	201,78	18,37%	560,50
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	50%	q	4,00	25,43	31,81	127,24	-	0,00%	63,62	63,62
31.8	40.10.100	CONTATOR DE POTÊNCIA 3φ 40 A - 2NA-2NF	50%	un	2,00	649,33	907,91	1.815,82	-	0,00%	907,91	907,91
											R\$	3.244,96
32	41	ILUMINAÇÃO										
32.1	41.10.040	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LÂMPADAS	0%	un	3,00	405,70	507,23	1.521,69	-	0,00%	-	1.521,69
32.2	41.16.030	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO BAE 10101020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 9,00 M	0%	un	3,00	1.288,33	1.611,66	4.834,88	-	0,00%	-	4.834,88
32.3	41.11.700	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14190 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÉDIA DE 115 LM/W - POTÊNCIA DE 90 W/120 W	0%	un	8,00	1.092,71	1.355,89	10.927,84	-	0,00%	-	10.927,84
32.4	41.21.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE 60 REPROR COM DISSIPADOR TRANSF. 4595 W, FLUXO LUMINOSO DE 1880 A 1880 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	0%	un	10,00	275,08	342,35	3.423,50	-	0,00%	-	3.423,50
32.5	41.21.040	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DISSIPADOR TRANSFUSIVO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 900 A 1020 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	0%	un	68,00	128,42	199,52	10.315,36	-	0,00%	-	10.315,36
32.6	41.21.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SUBR. COM DISSIPADOR RECUADO TRANSFUSIVO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1400 A 2500 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	0%	un	60,00	214,05	287,56	16.053,60	-	0,00%	-	16.053,60
											R\$	52.126,72
33	43	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS										
33.1	43.02.040	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V COM RESISTÊNCIA INCLUIDA	0%	un	5,00	362,50	453,12	2.265,60	-	0,00%	-	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	0%	un	2,00	182,07	227,53	455,16	-	0,00%	-	455,16
33.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 160 M³/H	0%	un	1,00	358,17	446,96	446,96	-	0,00%	-	446,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT, CASSETE COM CAPACIDADE DE 15.000 BTU/H	67%	q	3,00	5.159,05	7.098,81	23.092,43	-	0,00%	15.397,62	7.698,81
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT, CASSETE COM CAPACIDADE DE 35.000 BTU/H	100%	q	1,00	15.463,46	13.076,10	13.076,10	1,00	13.076,10	100,00%	13.076,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT, PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	32%	q	12,00	2.718,73	3.368,41	40.795,02	5,00	16.992,05	41,67%	37.387,51
											R\$	14.266,94
34	44	APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS										
34.1	44.01.050	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA SEM TAPAS - 6 LITROS	0%	un	5,00	219,62	274,77	1.373,85	-	0,00%	-	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	0%	un	8,00	215,41	275,51	2.164,08	-	0,00%	-	2.164,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	0%	un	8,00	89,71	124,83	747,78	-	0,00%	-	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 36 LITROS	0%	un	3,00	606,20	737,75	2.213,25	-	0,00%	-	2.213,25
34.5	44.02.060	TAMPONADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	0%	m²	13,82	580,74	736,42	10.278,80	-	0,00%	-	10.278,80
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 350/1600 MM, COM VÁVULO	0%	un	10,00	69,21	87,39	873,90	-	0,00%	-	873,90
34.7	44.03.100	DISPENSER TOALHEIRA EM ABS, PARA FOLHAS	0%	un	16,00	55,21	79,25	1.268,16	-	0,00%	-	1.268,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROÇAP PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CRUADO, DN=3/4"	0%	un	4,00	34,39	43,23	172,92	-	0,00%	-	172,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICO DE LÁTEX E AQUECIMENTO EM LATÃO FUNDIDO CRUADO	0%	un	8,00	158,62	199,77	1.598,62	-	0,00%	-	1.598,62
34.10	44.03.845	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO MECÂNICO, EM LATÃO CRUADO, DN=1/2" OU 3/8"	0%	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21	-	0,00%	-	1.874,21
34.11	44.04.300	CUBA EM AÇO INOXÍVEL SIMPLES DE 450X340X400 MM	0%	un	8,00	301,98	352,10	1.512,60	-	0,00%	-	1.512,60
											R\$	23.594,07
35	46	TUBULACAO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES										
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=25 MM, 1/2" - INCLUSIVE CONEXÕES	98%	m	100,00	22,29	27,99	5.007,60	54,00	1.502,28	30,00%	4.005,08
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=50 MM, 1 1/2" - INCLUSIVE CONEXÕES	100%	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50	45,00	2.256,75	30,00%	6.018,00

35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	12,99	26,52	33,15	327,80	3,60	110,34	30,00%	318,24	79,56
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO P/B COM VÍRGULA E ANEL DE BORRACHA LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80	18,00	765,54	30,00%	2.041,44	510,36
35.5	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO P/B COM VÍRGULA E ANEL DE BORRACHA LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	120,00	52,89	63,11	7.331,70	36,00	2.379,96	30,00%	6.345,56	1.586,64
35.6	49.05.008	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	8,00	68,65	111,69	699,26	4,80	533,09	80,00%	533,09	133,27
35.7	49.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	36,00	90,27	124,08	4.455,88	28,80	3.573,50	80,00%	3.573,50	893,38
35.8	49.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO P/B COM VÍRGULA E ANEL DE BORRACHA LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	130,00	59,35	70,76	8.494,00	12,00	848,40	10,00%	6.787,20	1.696,80
						37.030,14				11.978,86			R\$ 7.406,03
36	47	VALVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES											
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	0%	un	4,00	165,87	133,50	534,30	-	0,00%	-	-	534,32
36.2	47.01.210	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ALICATAMENTO COM 1/2" VÁNCIA, DN= 2"	0%	un	4,00	190,84	238,50	954,00	-	0,00%	-	-	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDO CROMADO COM C/NOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	35%	un	16,00	60,11	100,19	1.652,58	-	0,00%	600,96	-	1.001,60
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDO CROMADO COM C/NOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	0%	un	6,00	76,31	95,76	574,56	-	0,00%	-	-	574,56
						3.869,44				-			R\$ 3.064,48
37	48	RESERVATÓRIOS E TANQUES PARA LÍQUIDOS E GASES											
37.1	48.02.205	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXA - CAPACIDADE DE 5.020 LITROS	0%	un	3,00	2.483,22	3.155,52	9.249,58	-	0,00%	-	-	9.249,58
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOLA, DN= 1"	0%	un	3,00	95,12	118,90	359,70	-	0,00%	-	-	359,70
								8.708,28		-			R\$ 8.708,28
38	49	CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO											
38.1	49.01.030	CAIXA AFUNDADA DE P/C RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	65%	un	28,00	82,33	153,19	2.682,18	-	0,00%	1.753,72	-	928,44
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 150 MM	90%	un	20,00	229,17	265,46	5.729,20	-	0,00%	5.156,28	-	572,92
38.3	49.03.030	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA, REFORÇADA - CAPACIDADE 18 L	0%	un	2,00	354,20	442,88	885,72	-	0,00%	-	-	885,72
38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDO DE 4"	0%	un	10,00	12,04	19,17	181,70	-	0,00%	-	-	161,70
								9.458,78		-			R\$ 2.548,78
39	54	PAVIMENTAÇÃO E PASSOIO											
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	32%	m²	511,00	3,08	3,95	1.817,35	-	0,00%	438,63	-	1.528,72
39.2	54.01.210	BASE DE BOTA-OPEDUNDA	7%	m²	76,35	174,79	218,45	16.744,48	-	0,00%	1.244,57	-	15.501,92
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA DE 25 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUBLEITO	0%	m²	511,00	19,33	24,18	12.355,88	-	0,00%	-	-	12.355,88
39.4	54.04.300	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 15 MPa, ESPESURA 8 CM, TIPO 8 RAQUETE, RETANGULAR, BASTANTADO E 11 FACES, COM REJÓ EM GRES	0%	m²	511,00	63,30	104,37	53.333,97	-	0,00%	-	-	53.333,97
						84.402,89				-			R\$ 82.719,69
TOTAL						2.326.081,38							
									TOTAL GERAL 13ª MEDIÇÃO				247.019,36
									% MEDIDO				10,62%
									ACUMULADO				1.459.356,30
									SALDO REMANESCENTE				R\$ 866.725,07

Monteiro Lobato, 09 de janeiro de 2025


Luis Gustavo de Barros
Responsável Técnico
CREA 5062695430



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 11/02/2025

RELATÓRIO Nº:
13/2023

CONTRATO: 097/2023

CONFERIDO:

Fiscal do contrato

AUTOR:

Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

5070225050

CREA: SP-5062695430

DATA: 11/02/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª MEDIÇÃO	FOLHA: 2 / 6
----------------------------	---	---------------------

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS



Foto 1: Requadro das janelas para instalação de peitoril e contramarco

Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
---	---

DATA:
11/02/2025

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 3 / 6

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª MEDIÇÃO



Foto 2: Requadro das janelas para instalação de peitoril e contramarco

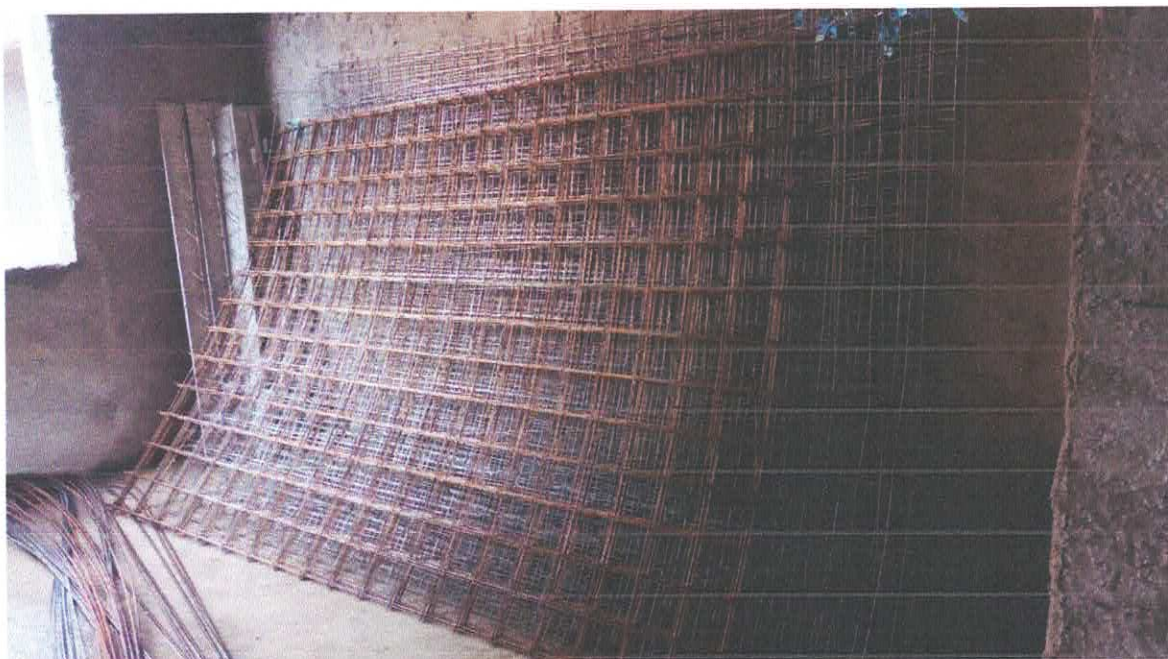


Foto 3: Malha pop para a laje do 2º Pavimento

Autor:

Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA:
11/02/2025

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª MEDIÇÃO



Foto 4 e 5: Assentamento do revestimento cerâmico no 1º Pavimento

Autor:

Conferido:

SIGASSAL DO CONTRATO

DATA: 11/02/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª MEDIÇÃO	FOLHA: 5 / 6
----------------------------	---	---------------------



Foto 6: Assentamento de revestimento cerâmico e preparação das tomadas e interruptores

Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido:  FISCAL DO CONTRATO
---	---

DATA: 11/02/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª MEDIÇÃO	FOLHA: 6 / 6
-----------------------------	---	---------------------



Foto 7: Ar condicionado de 12000BTU/H, 18000BTU/H e de 36000BTU/H

Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
---	---



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.16
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA

CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70

VALOR: R\$ 234.668,39

DEBITO EM: 14/02/2025

DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB: F.D01.FFC.3BA.3FE.328

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:01
673906739 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2025
NR. DOCUMENTO	556.739.000.358.973
VALOR TOTAL	12.350,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN M LOBATO *FUNDO
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 358.973-0
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068
=====

NR. AUTENTICACAO	6.724.12D.D91.1DC.590
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.
